
ДОРОГА 2026

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ФГИС СКДФ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

2 Реестр объектов капитального строительства (ОКС)

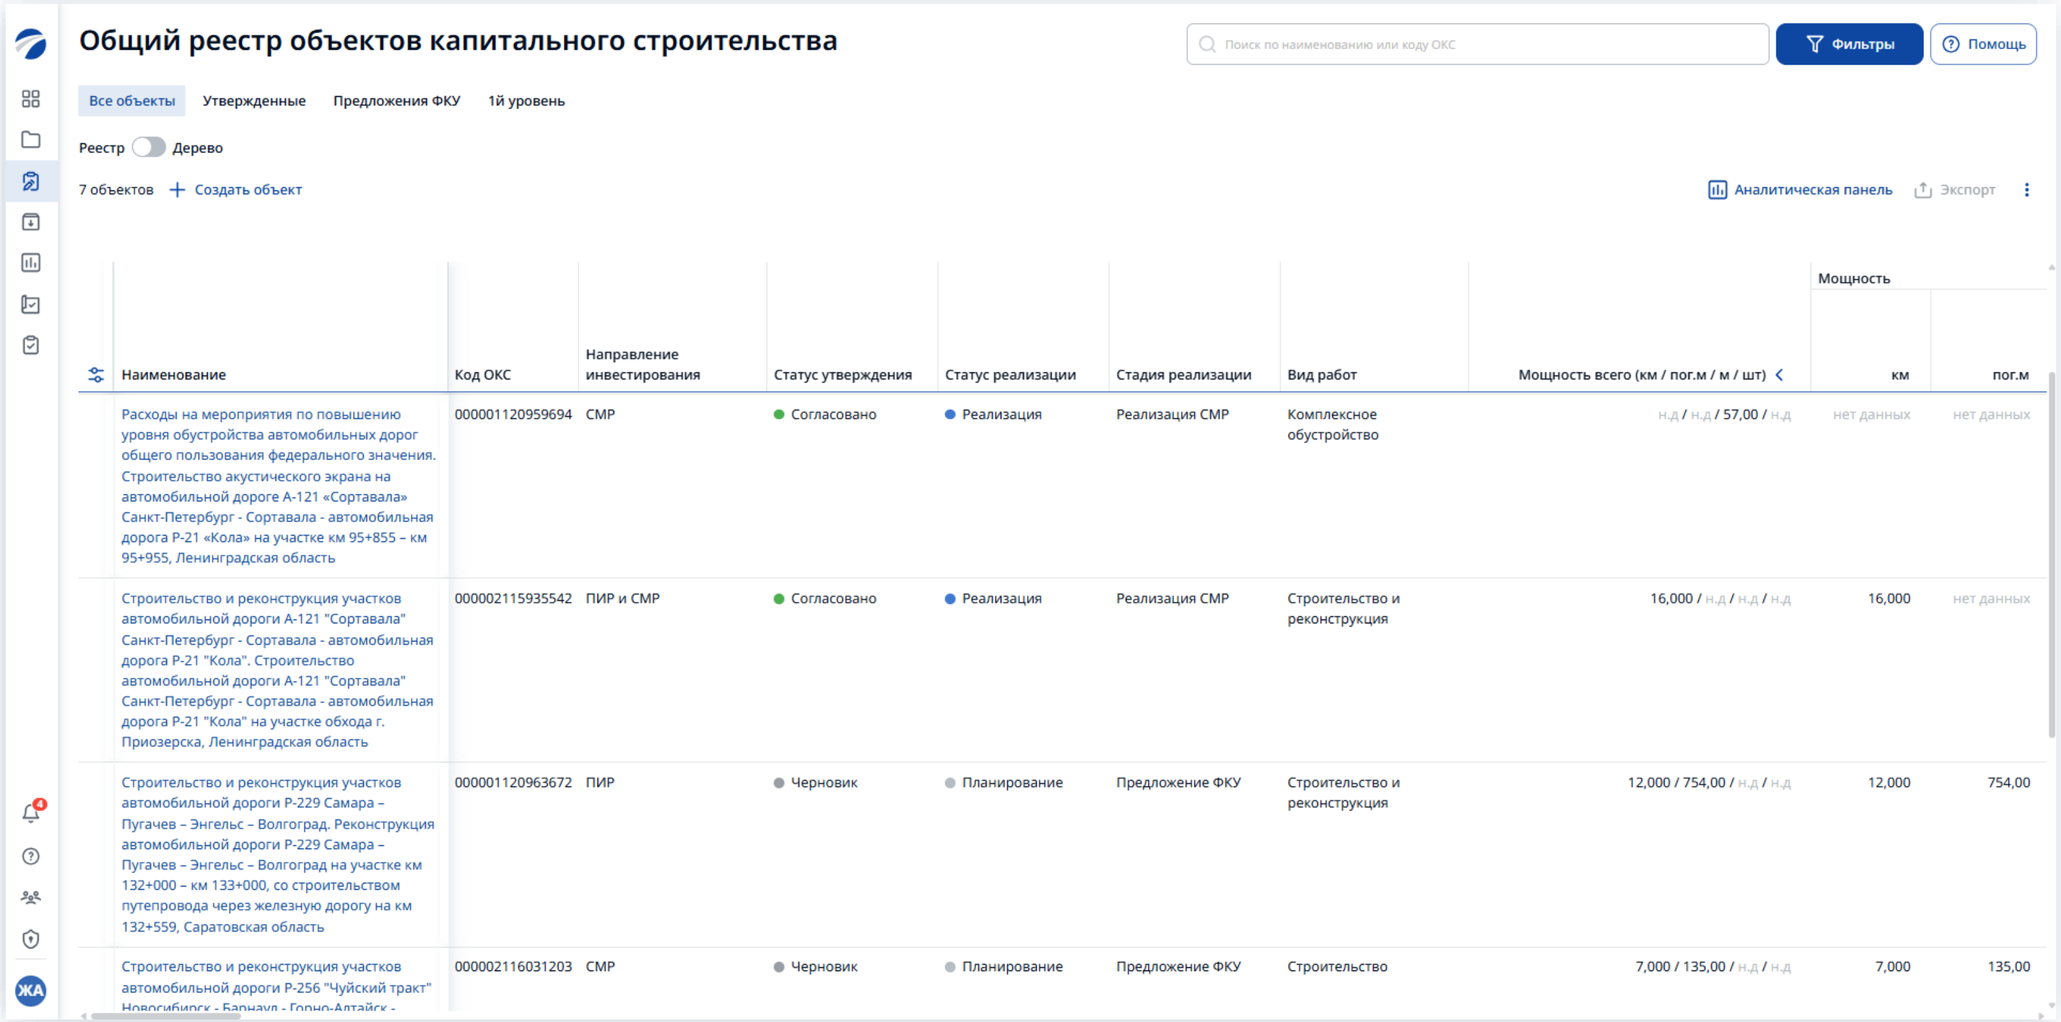

Общий реестр объектов капитального строительства

Поиск по наименованию или коду ОКС

Фильтры | Помощь

Все объекты | Утвержденные | Предложения ФКУ | 1й уровень


Реестр | Дерево

7 объектов | Создать объект

Аналитическая панель | Экспорт

Наименование	Код ОКС	Направление инвестирования	Статус утверждения	Статус реализации	Стадия реализации	Вид работ	Мощность всего (км / пог.м / м / шт)	Мощность	
								км	пог.м
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 95+855 – км 95+955, Ленинградская область	000001120959694	СМР	Согласовано	Реализация	Реализация СМР	Комплексное обустройство	н.д / н.д / 57,00 / н.д	нет данных	нет данных
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола". Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке обхода г. Приозерска, Ленинградская область	000002115935542	ПИР и СМР	Согласовано	Реализация	Реализация СМР	Строительство и реконструкция	16,000 / н.д / н.д / н.д	16,000	нет данных
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 132+000 – км 133+000, со строительством путепровода через железную дорогу на км 132+559, Саратовская область	000001120963672	ПИР	Черновик	Планирование	Предложение ФКУ	Строительство и реконструкция	12,000 / 754,00 / н.д / н.д	12,000	754,00
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -	000002116031203	СМР	Черновик	Планирование	Предложение ФКУ	Строительство	7,000 / 135,00 / н.д / н.д	7,000	135,00

3 Реестр ОКС (дерево)

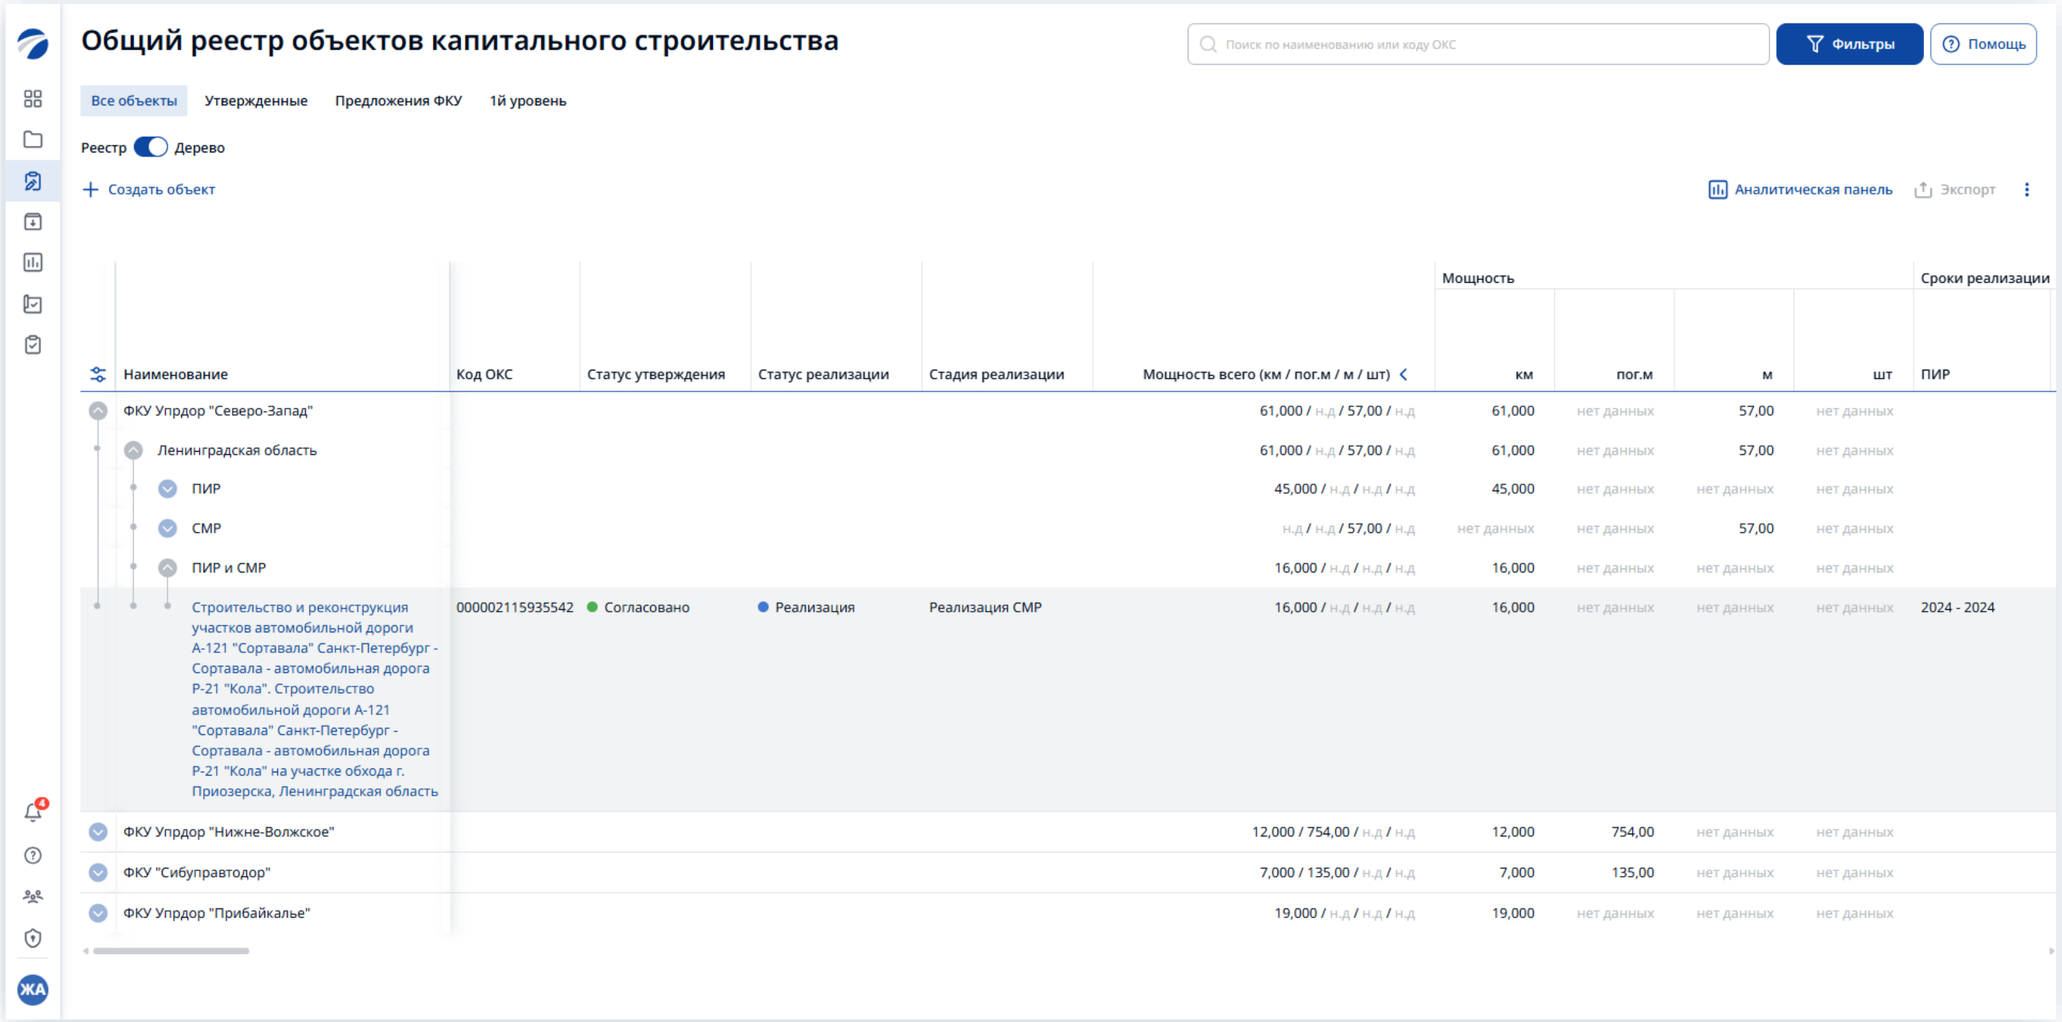

4 Утвержденные ОКС

Общий реестр объектов капитального строительства

Поиск по наименованию или коду ОКС

Фильтры | Помощь

Все объекты | Утвержденные | Предложения ФКУ | 1й уровень

Разрешить корректировку

Экспорт

Наименование	Включено в шестилетний план	Мощность (км / пог.м / м / шт)	Срок	Стоимость, тыс. ₽	Средства федерального бюджета, тыс. ₽					
					Всего	2024	2025	2026	2027	
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"		16,000 / н.д / 114,00 / н.д		18 467 850,000	18 467 850,000	245 000,000	4 531 400,000	5 200 000,000	4 800 000,000	3 71
Ленинградская область		16,000 / н.д / 114,00 / н.д		18 467 850,000	18 467 850,000	245 000,000	4 531 400,000	5 200 000,000	4 800 000,000	3 71
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 95+855 – км 95+955, Ленинградская область	✓	н.д / н.д / 57,00 / н.д	2026	7 850,000	7 850,000	нет данных	31 400,000	нет данных	нет данных	
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола". Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке обхода г. Приозерска, Ленинградская область	✓	16,000 / н.д / н.д / н.д	2028	18 460 000,000	18 460 000,000	245 000,000	4 500 000,000	5 200 000,000	4 800 000,000	3 71

Предложения ФКУ ОКС

Общий реестр объектов капитального строительства

Поиск по наименованию или коду ОКС | Фильтры | Помощь

Все объекты | Утвержденные | Предложения ФКУ | 1й уровень

Реестр / Дерево


4 объекта

Экспорт


Выбрать объекты

Наименование	Код ОКС	Направление инвестирования	Статус реализации	Стадия реализации	Статус утверждения	Вид работ	Мощность всего (км / пог.м / м / шт)	Мощность, км	Мощность, пог.м
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 132+000 – км 133+000, со строительством путепровода через железную дорогу на км 132+559, Саратовская область	000001120963672	ПИР	Планирование	Предложение ФКУ	Черновик	Строительство и реконструкция	12,000 / 754,00 / н.д / н.д	12,000	754,00
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке Новосибирск-Линево (3 этап км 34+000 – км 49+000), Новосибирская область	000002116031203	СМР	Планирование	Предложение ФКУ	Черновик	Строительство	7,000 / 135,00 / н.д / н.д	7,000	135,00
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство площадки отдыха на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, подъезд к г. Беломорск на км 30, Республика Карелия	нет данных	СМР	Планирование	Предложение ФКУ	Черновик	Строительство	7,000 / н.д / н.д / н.д	7,000	нет данных
Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-114 Волгоград – Тихорец	нет данных	ПИР и СМР	Планирование	Предложение ФКУ	Черновик	Строительство и	12,000 / н.д / н.д / н.д	12,000	нет данных


6 Создание ОКС

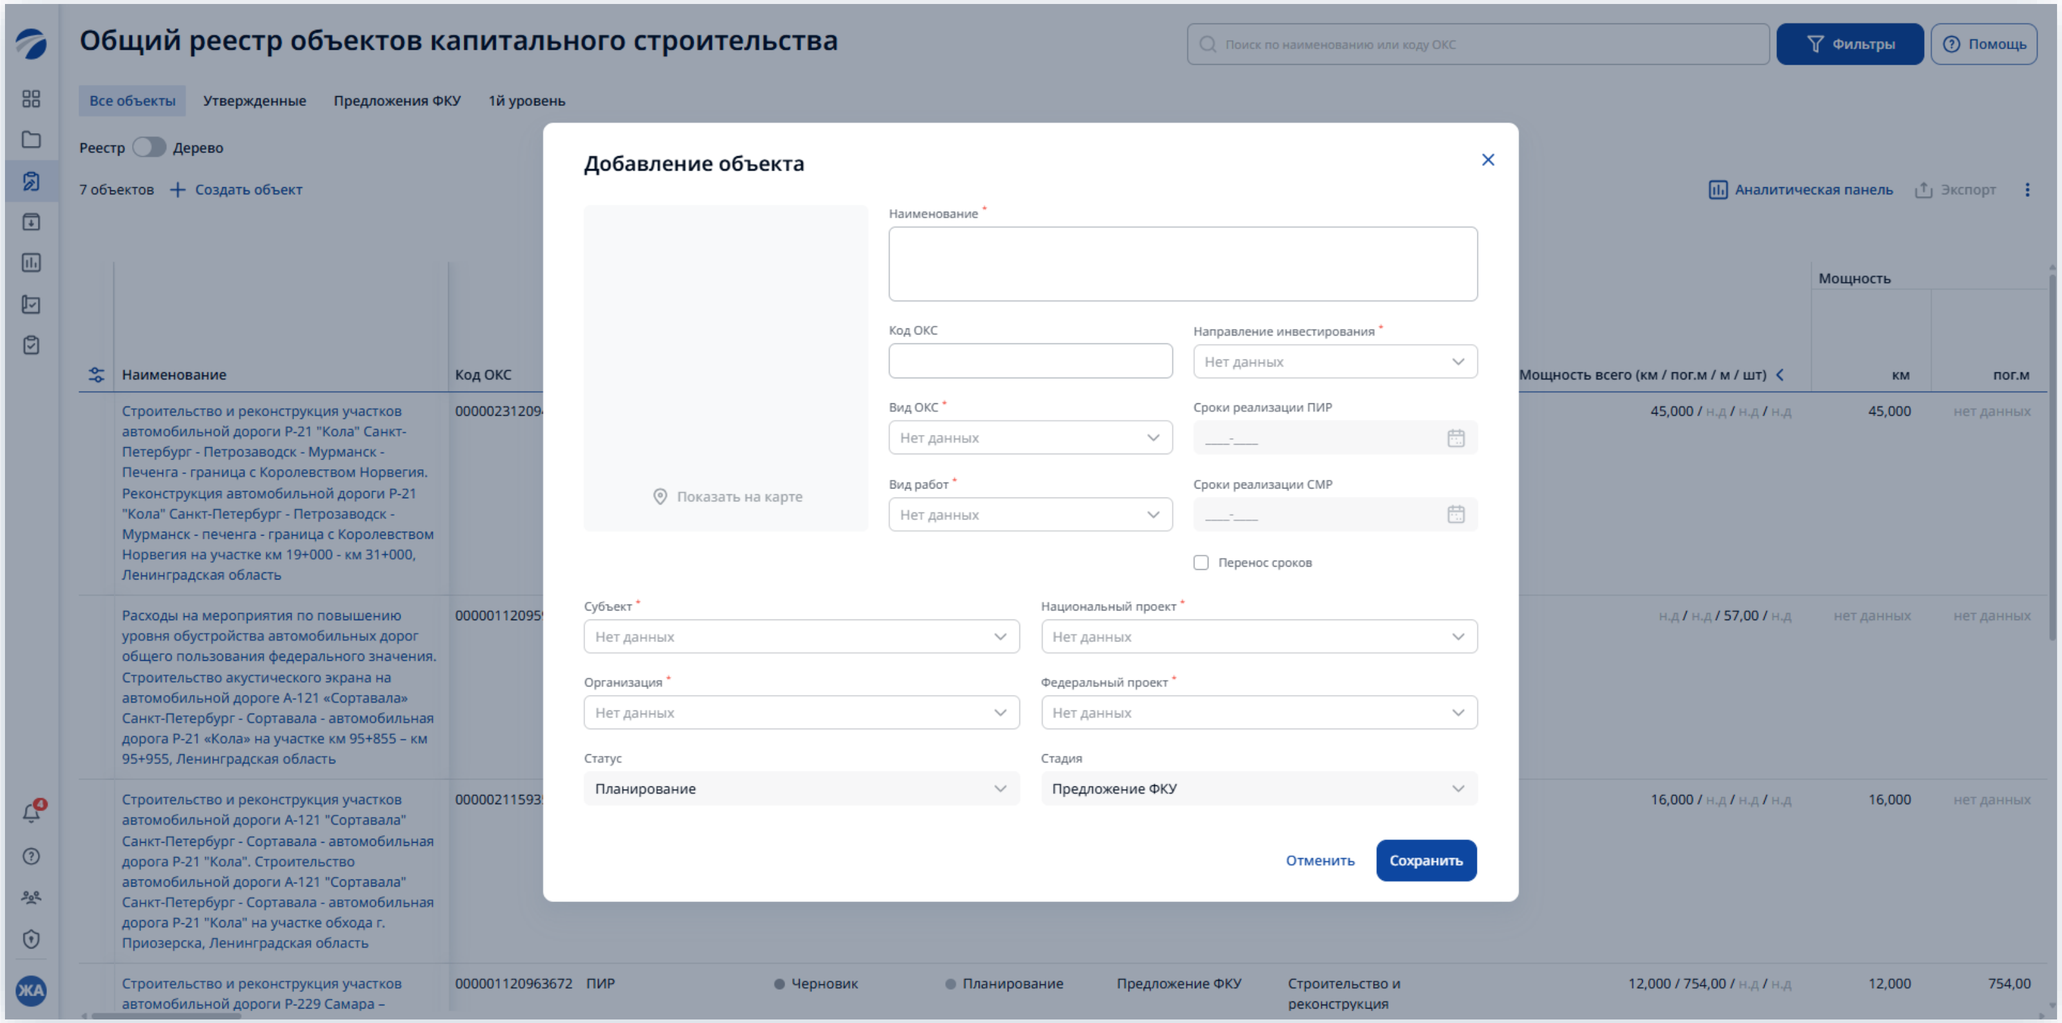


7 Карточка ОКС (общая информация и участки работ)

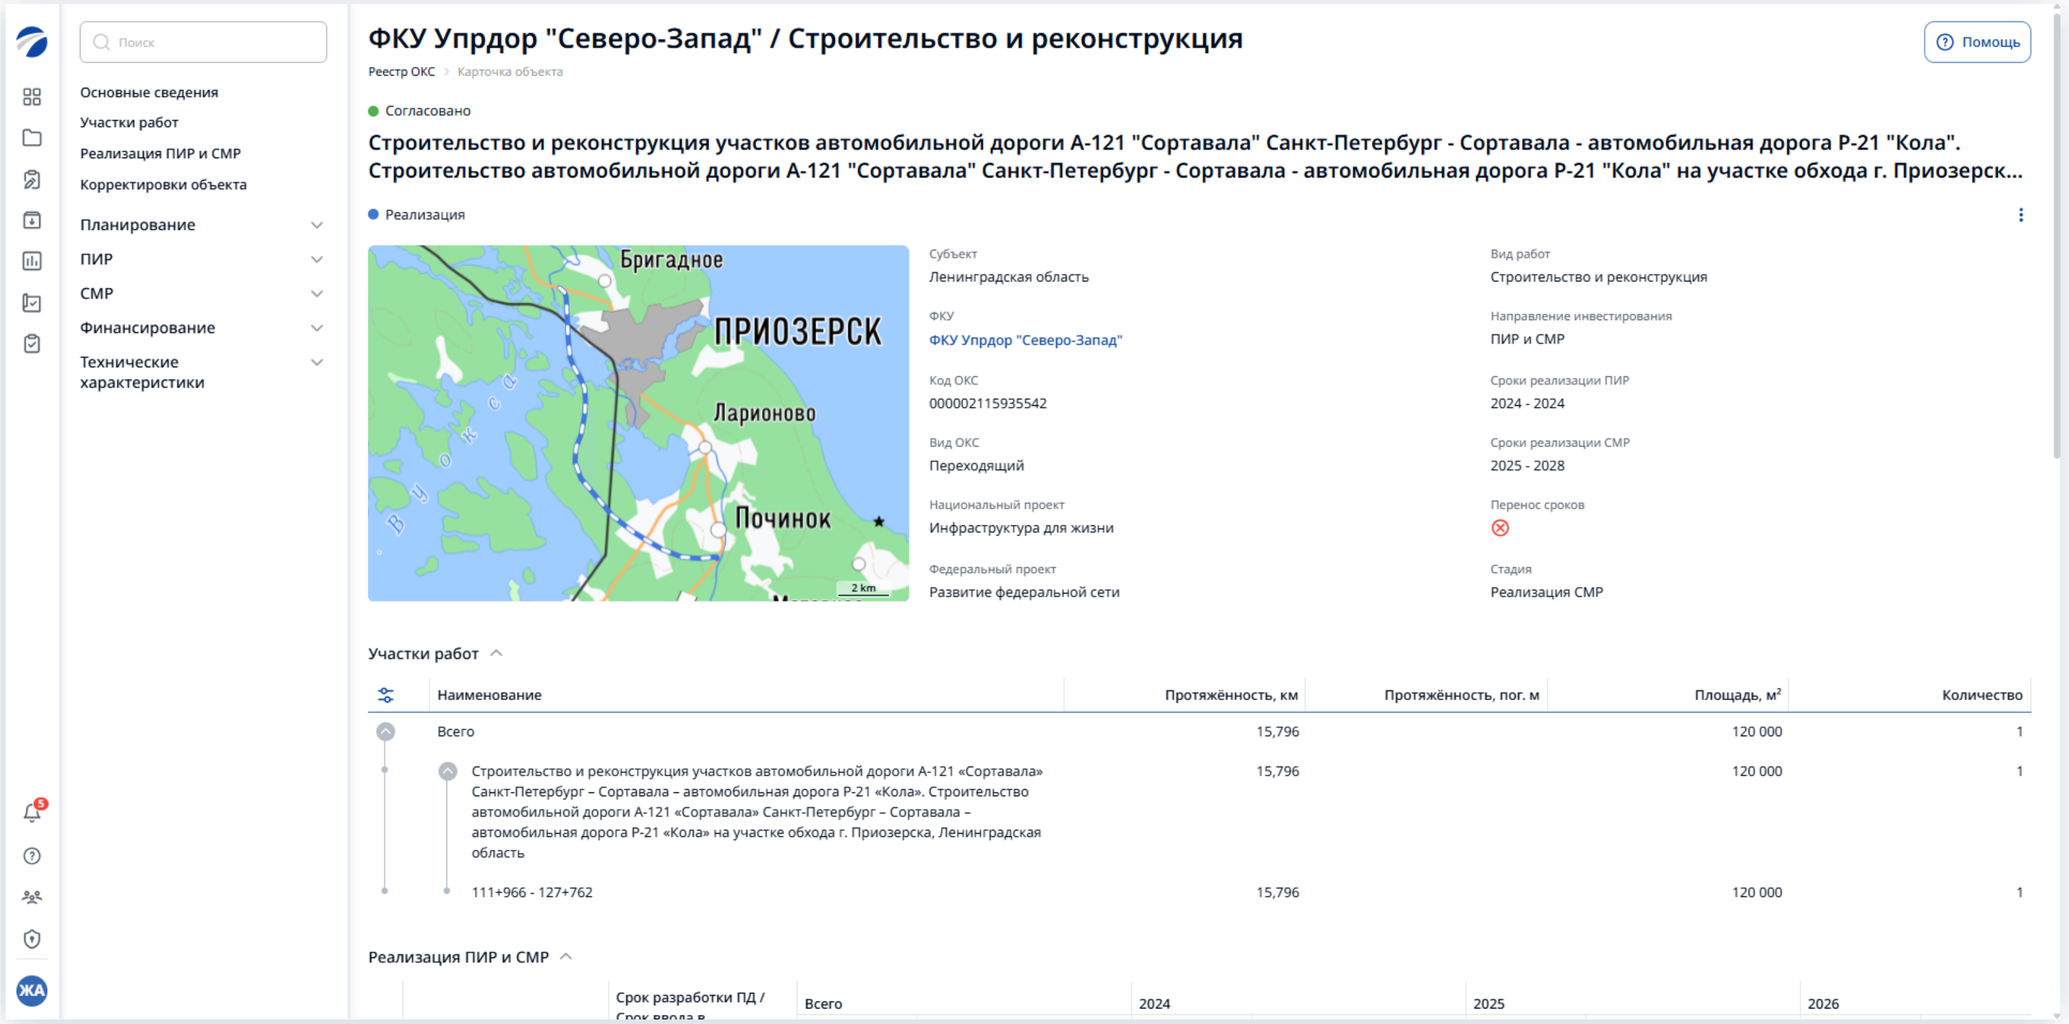


Ключевые индикаторы

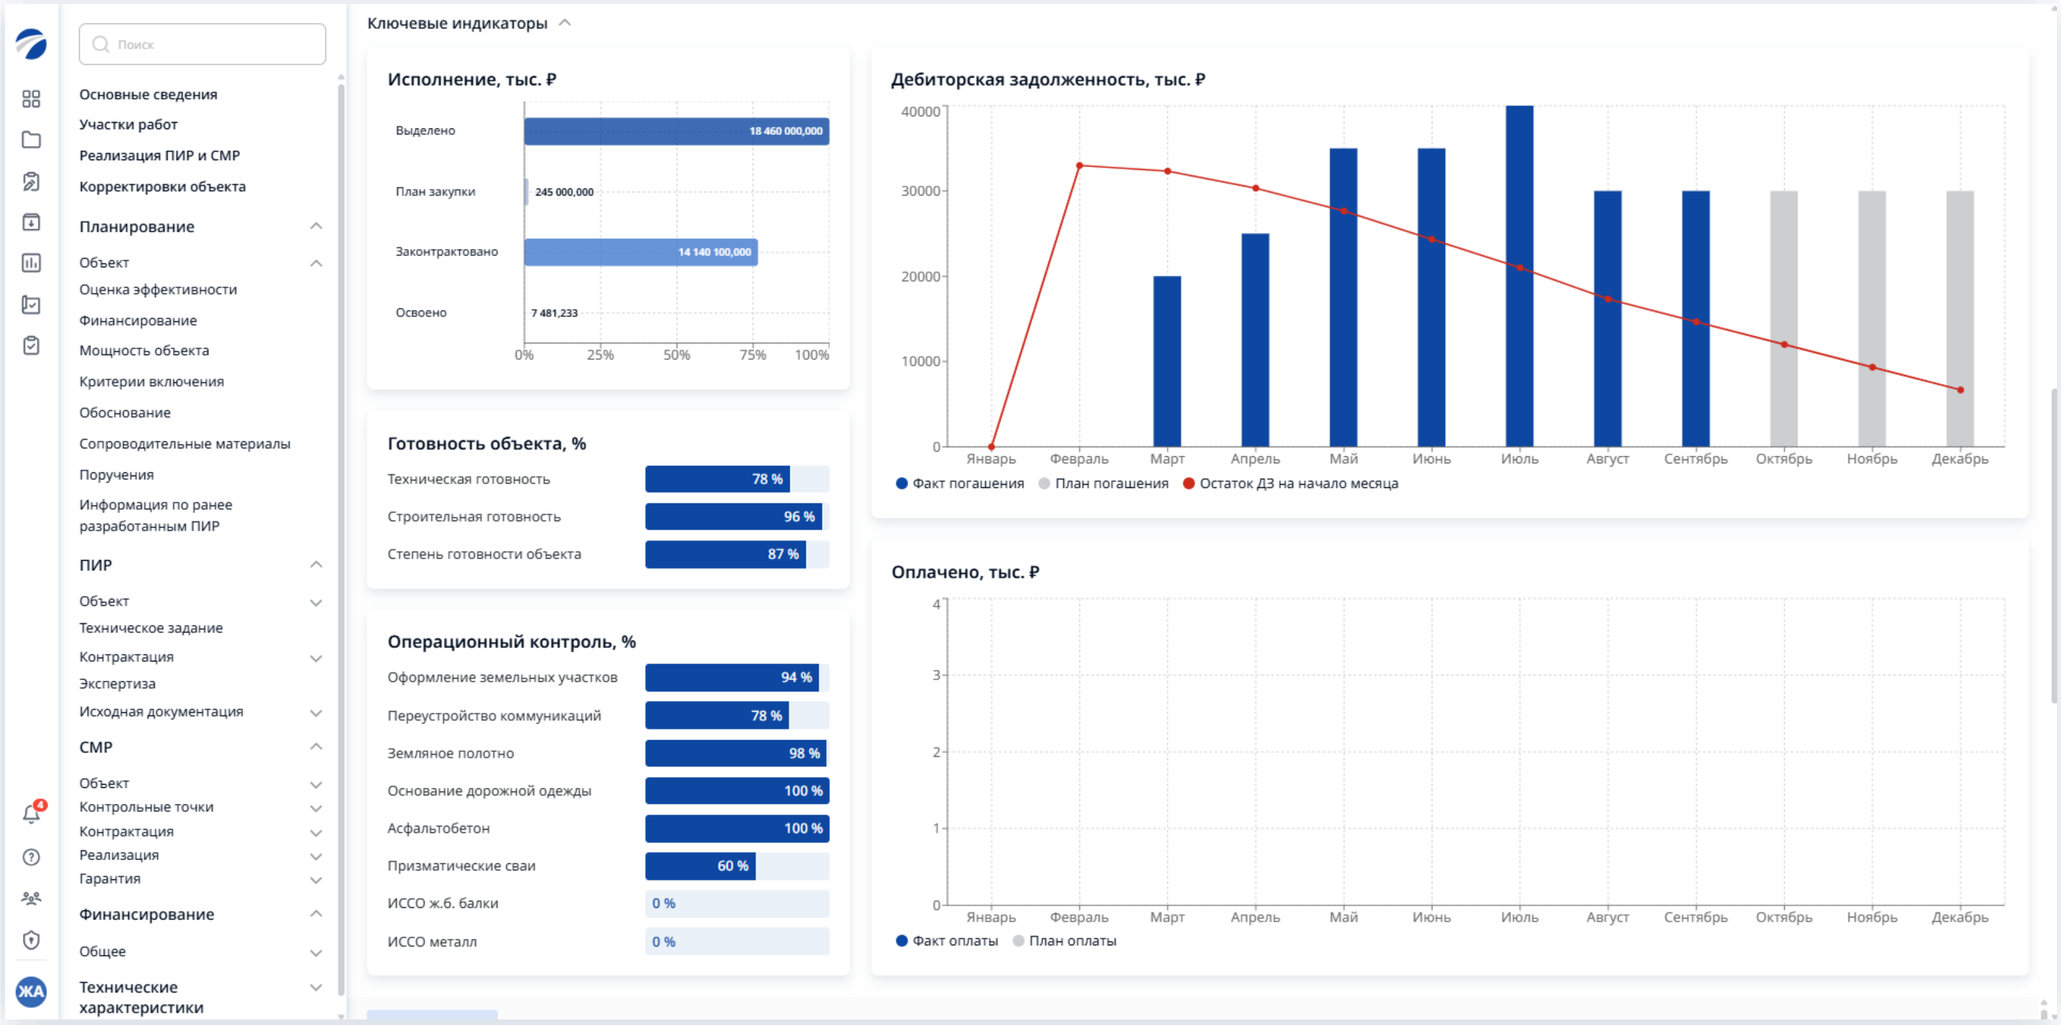


9 Раздел «Планирование»

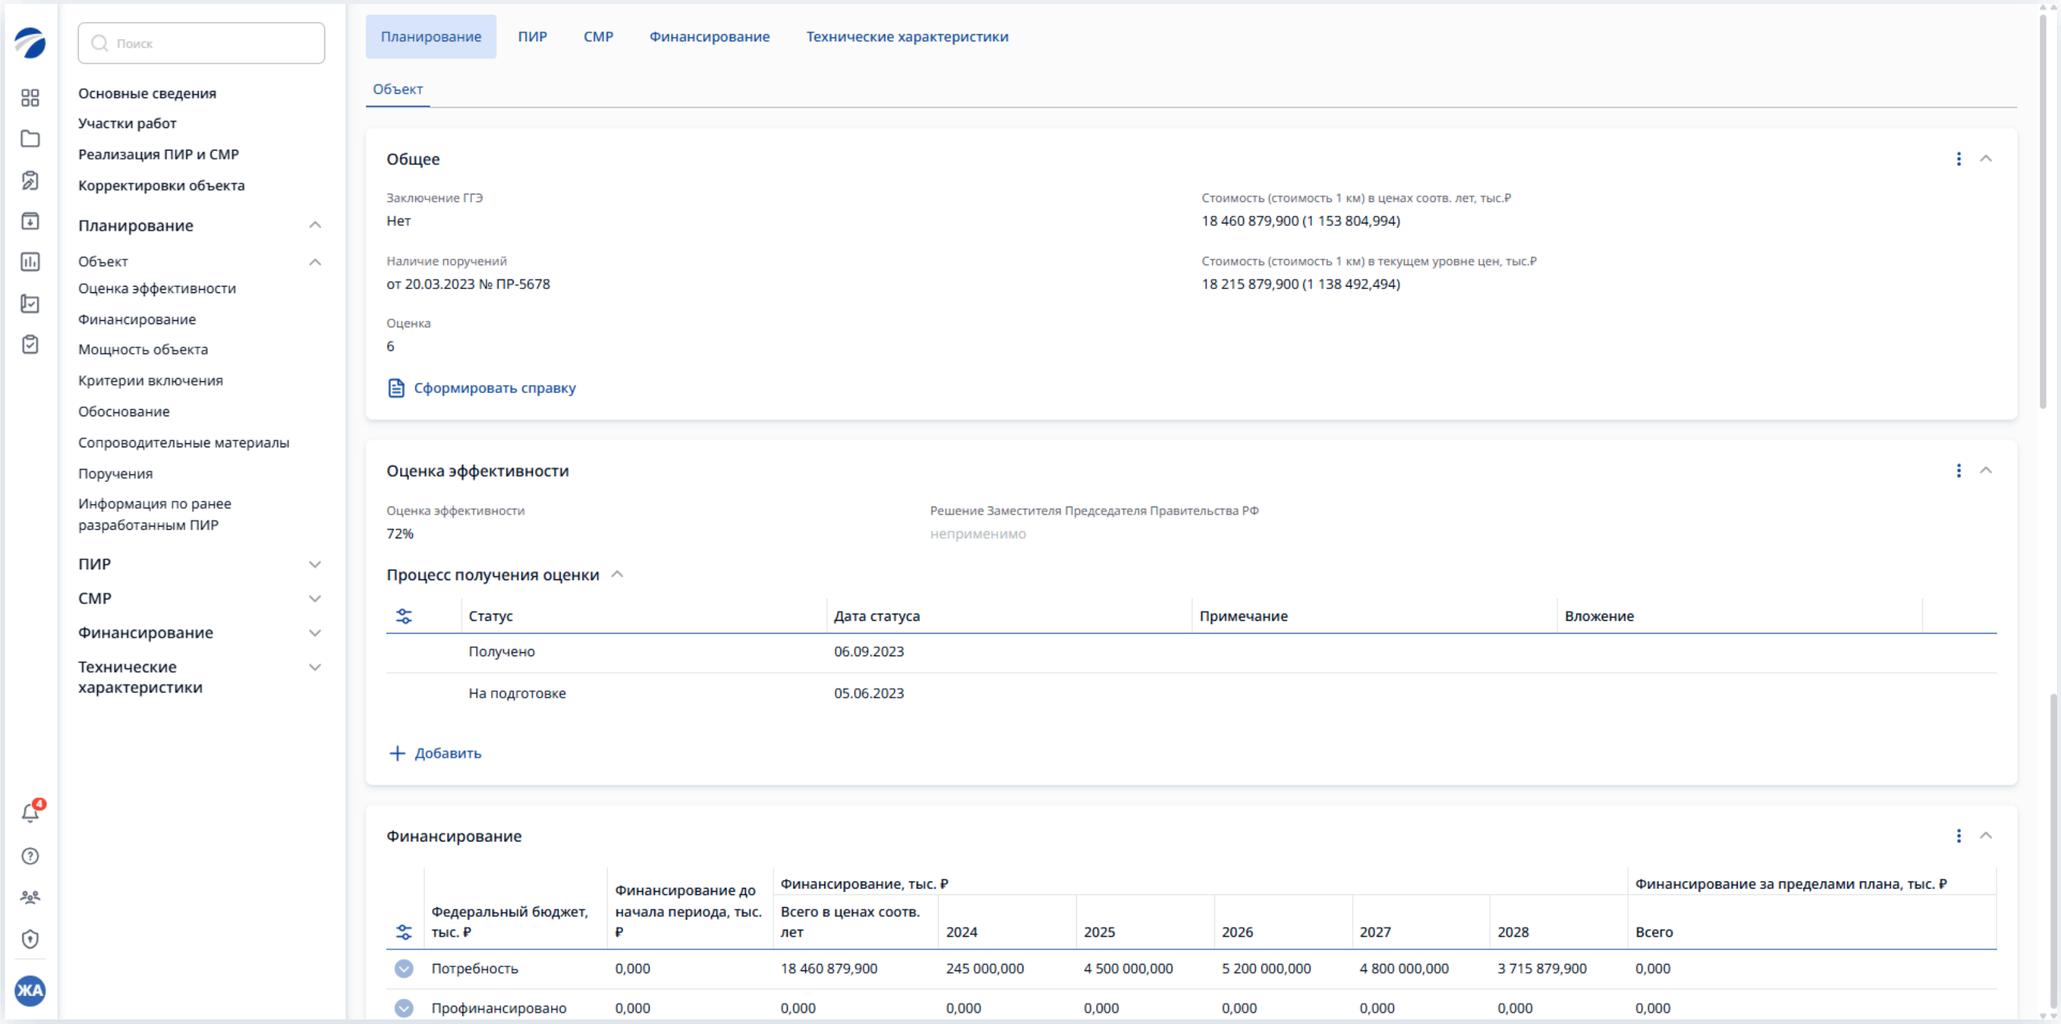


Раздел «Планирование»

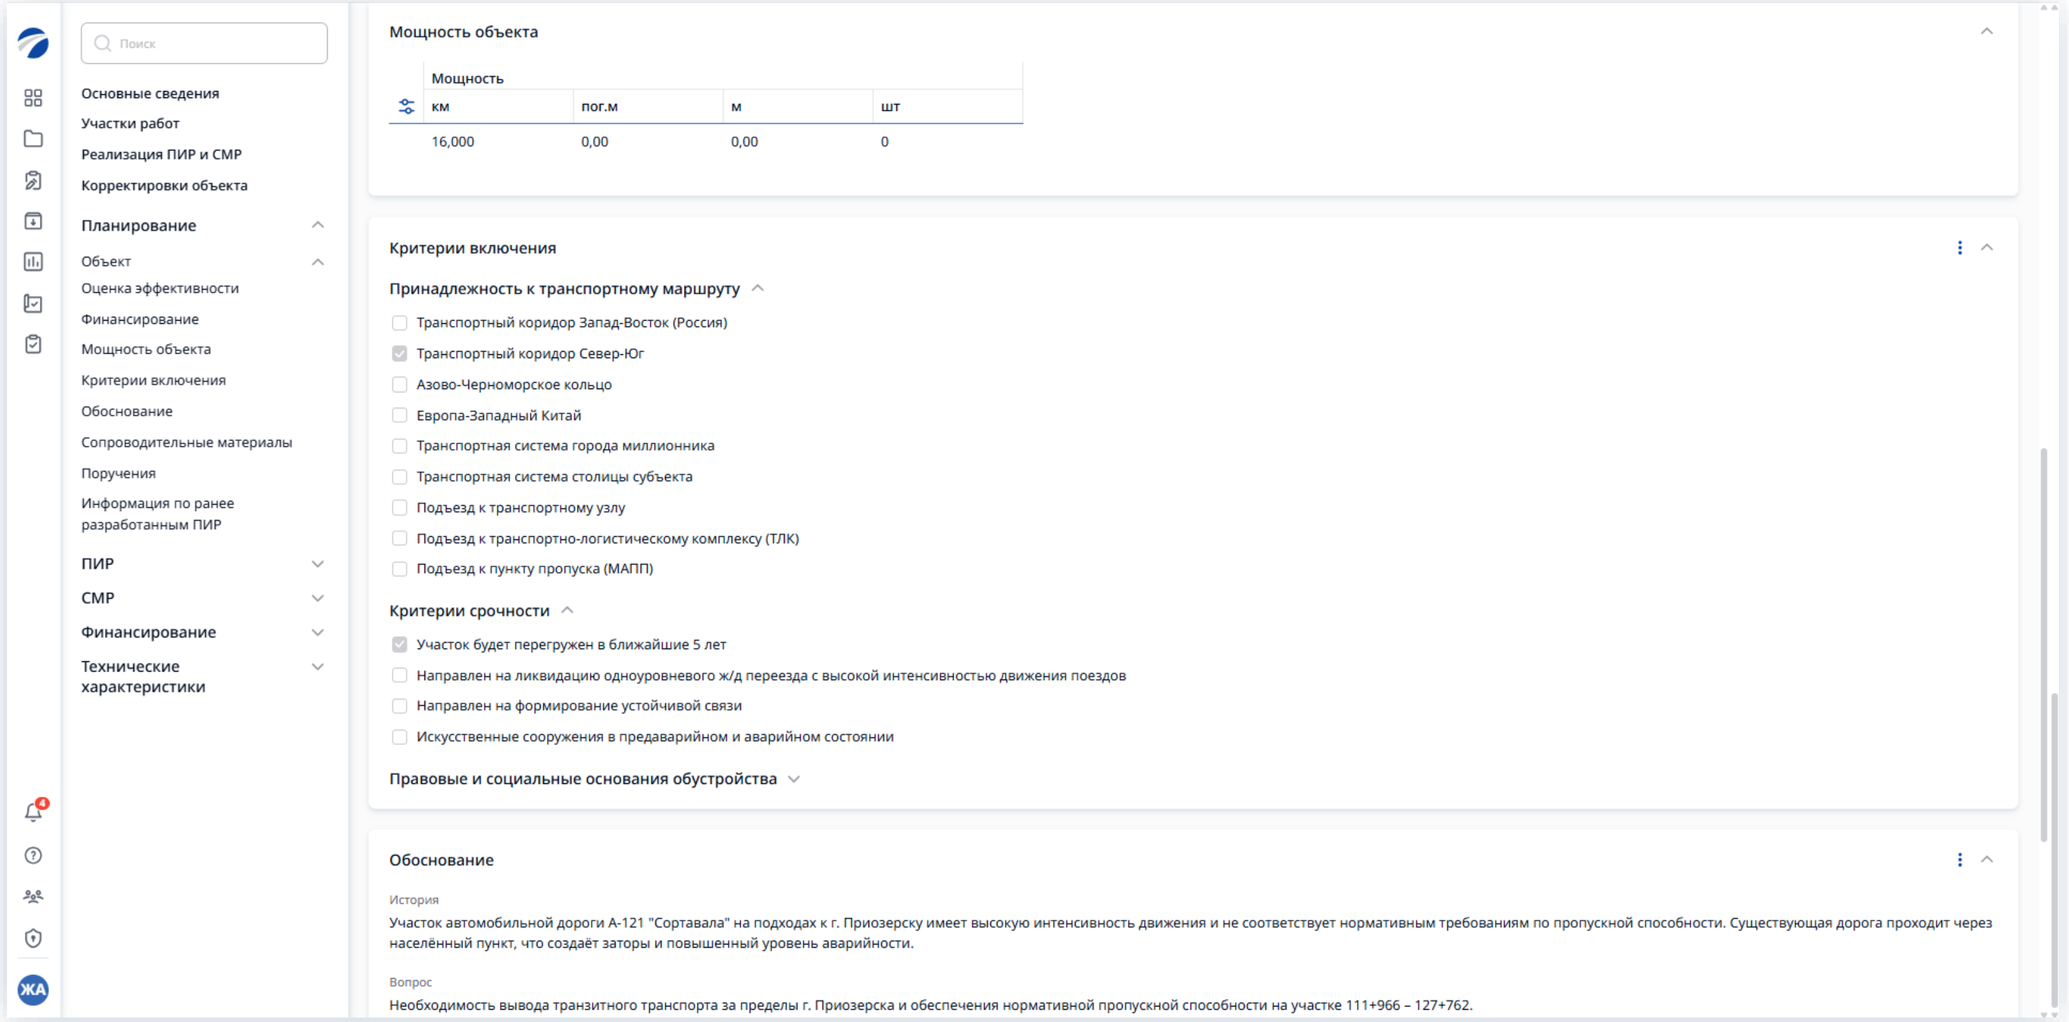


11 Раздел «Планирование»

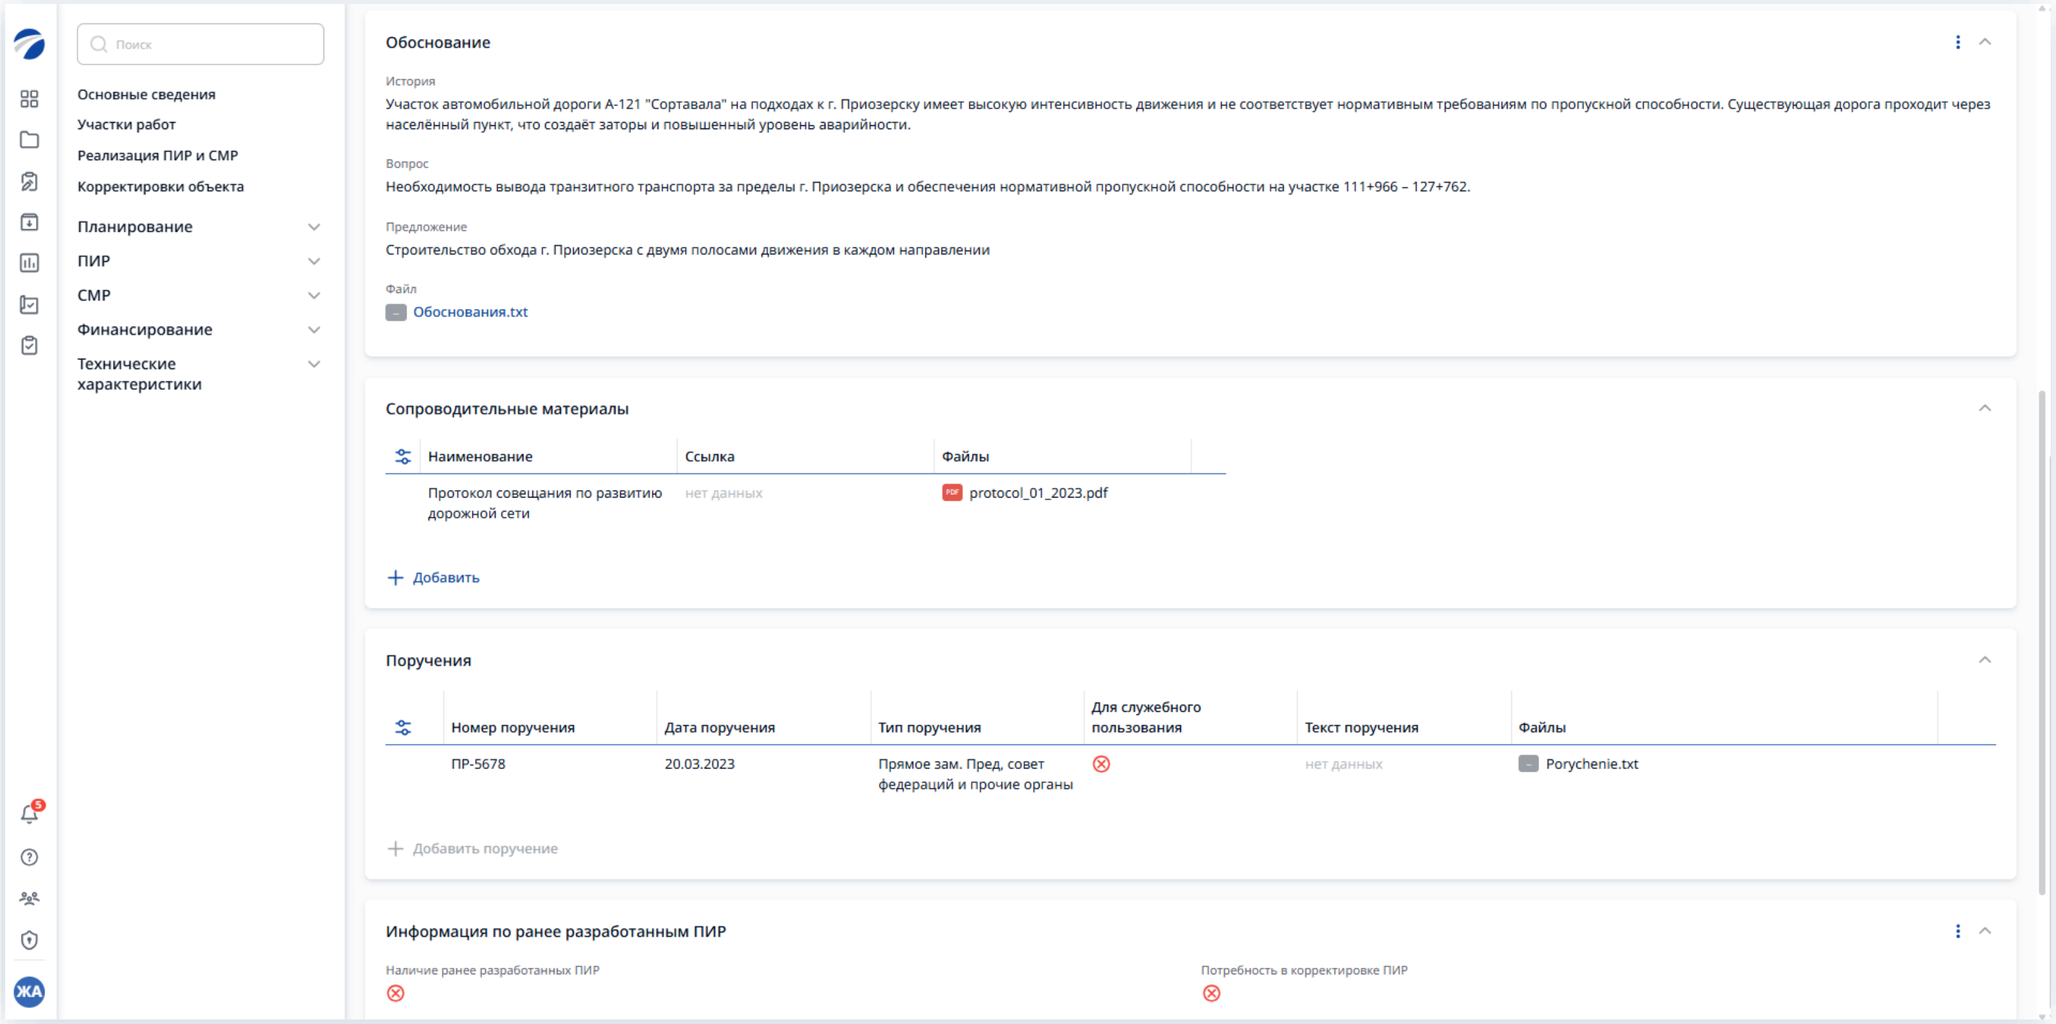


Раздел «ПИР» - «Объект»

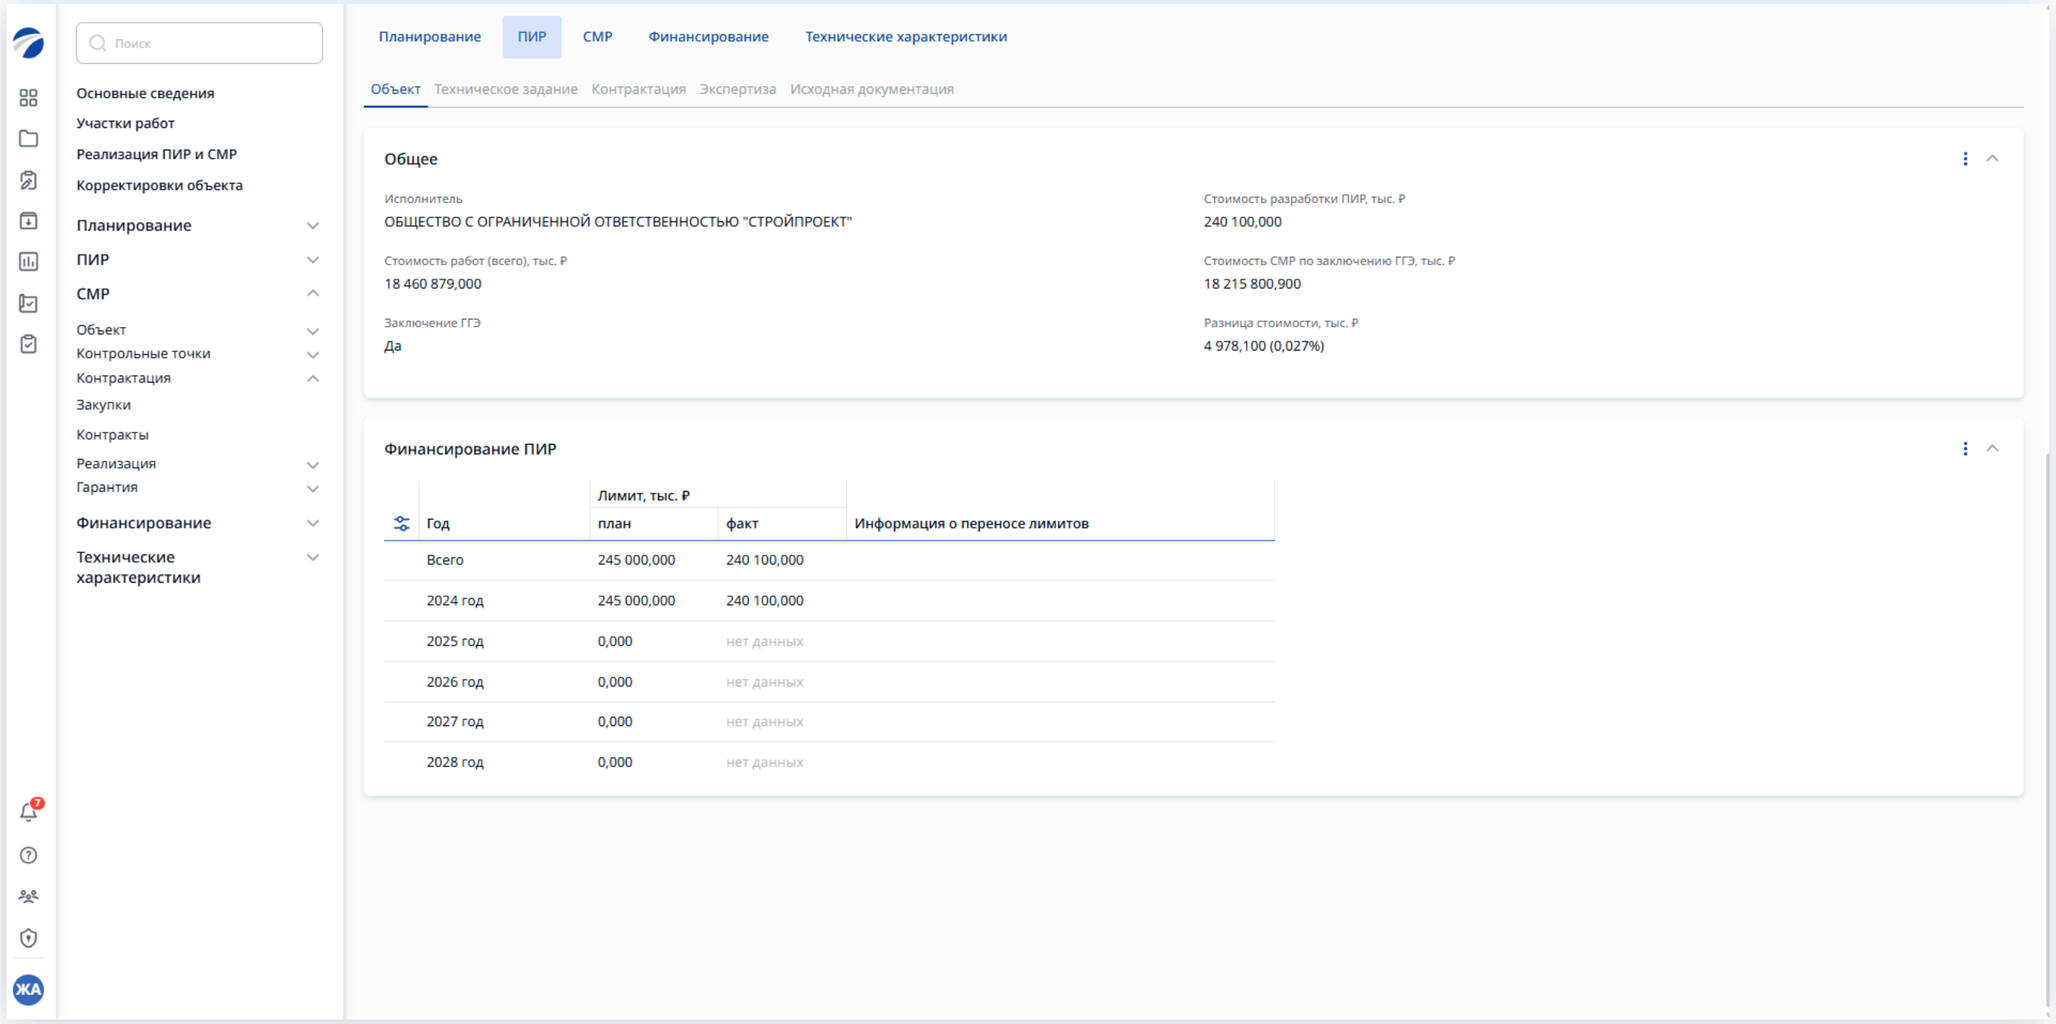


Раздел «ПИР» - «Техническое задание»

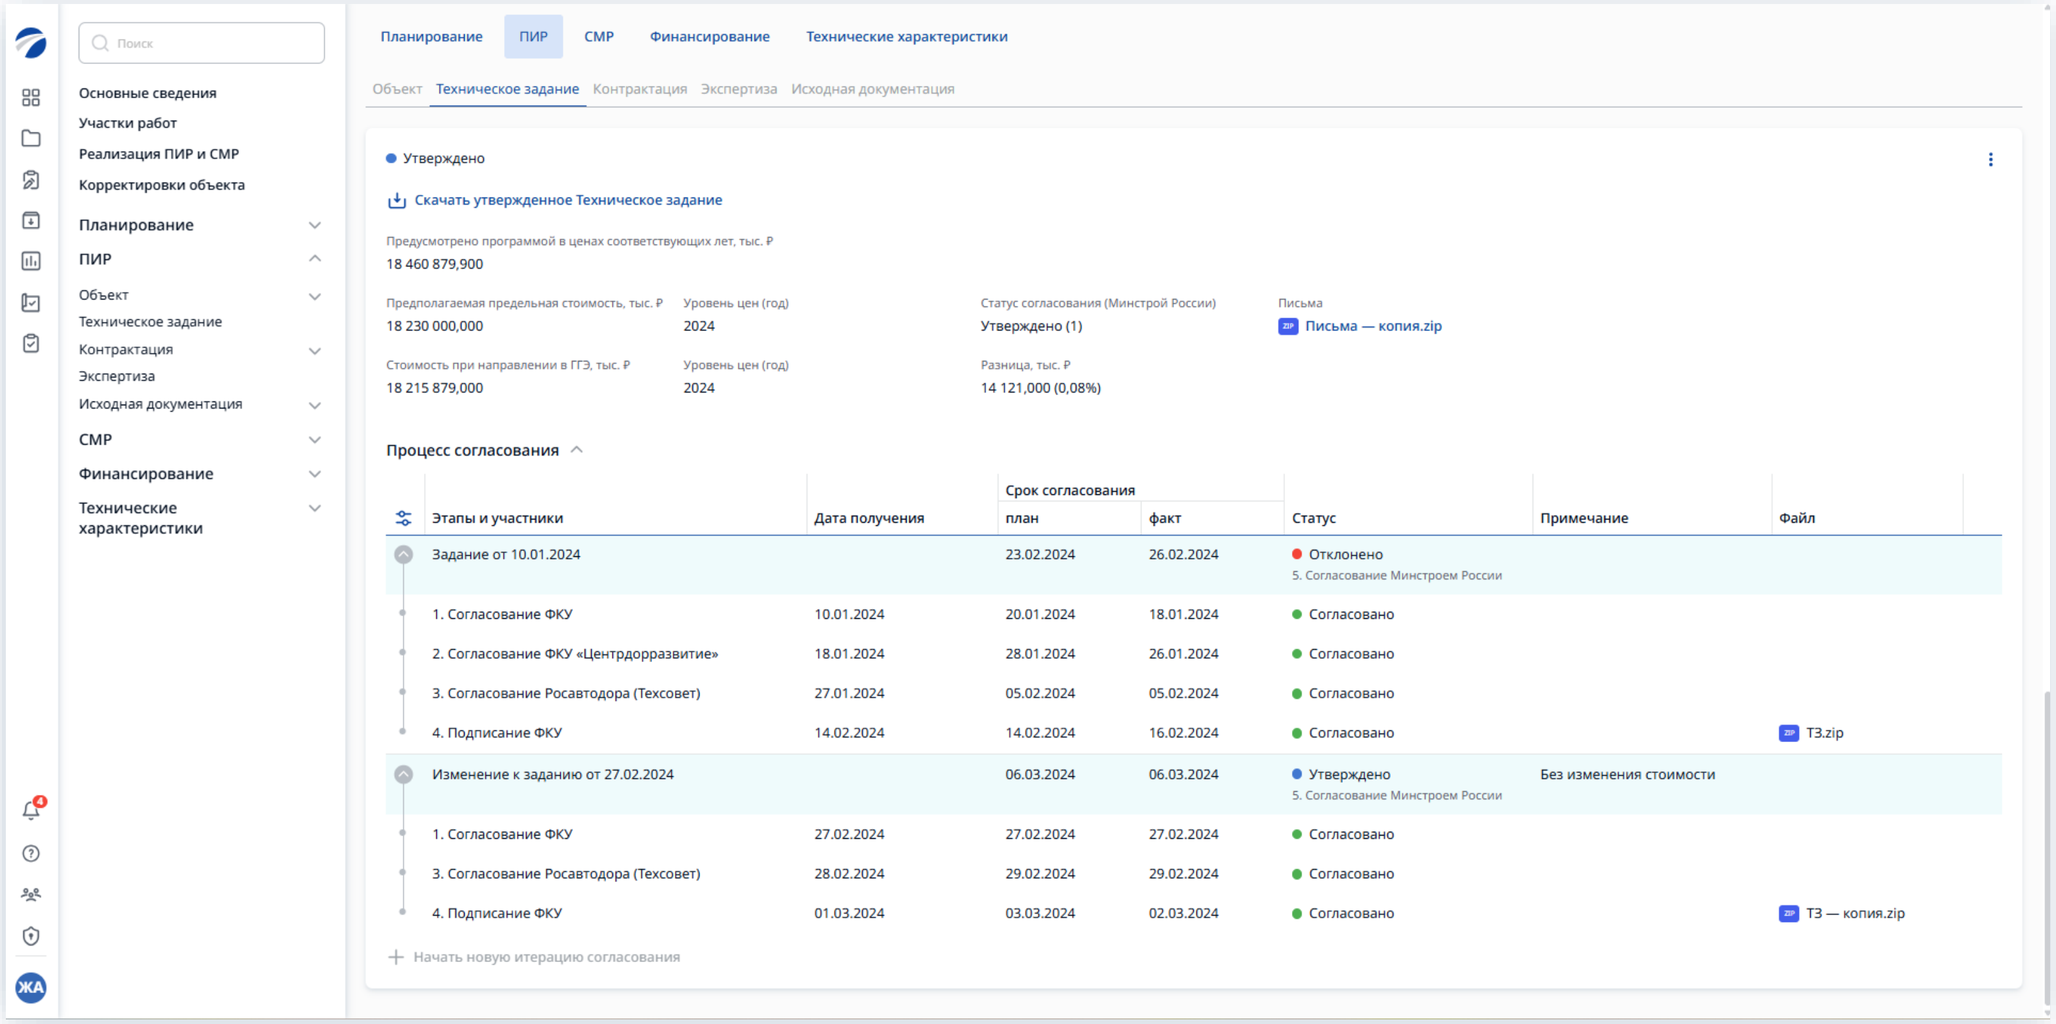


Раздел «ПИР» - «Контрактация»

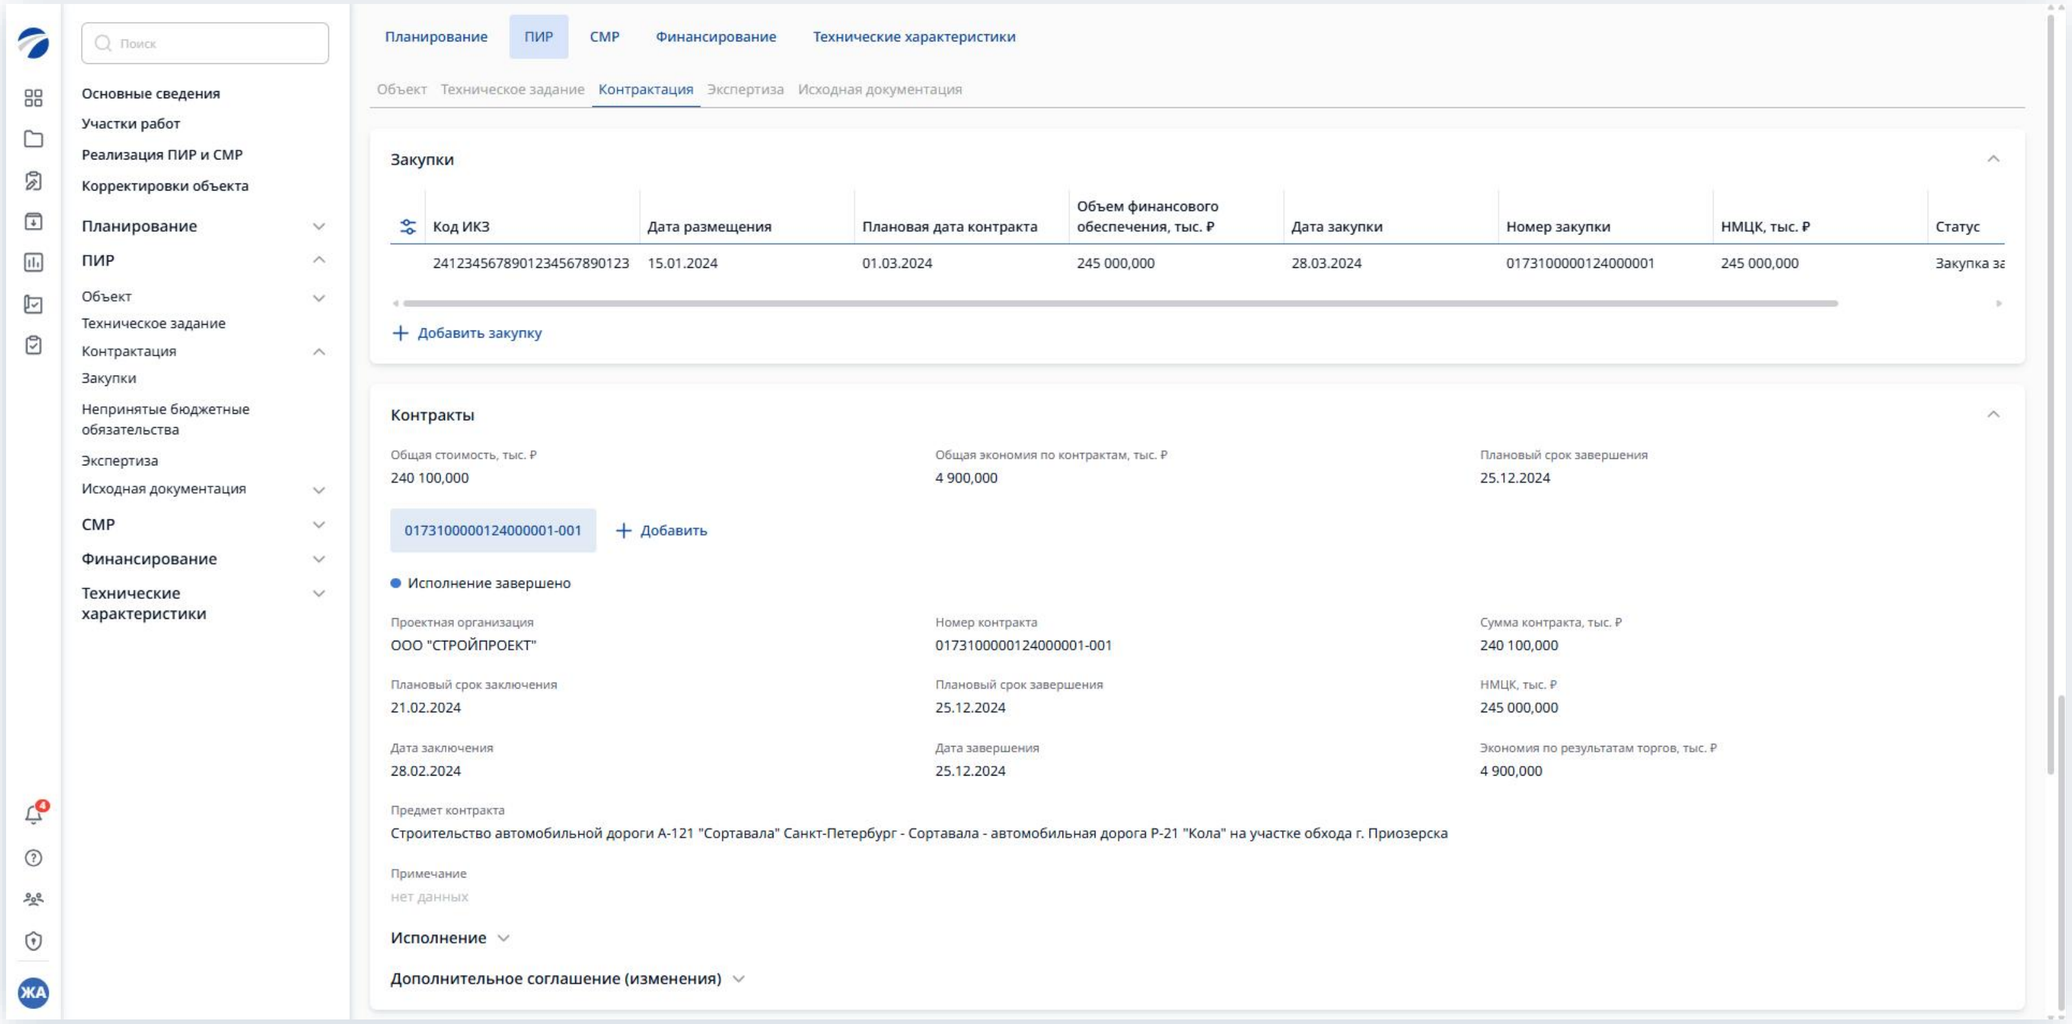


Раздел «ПИР» - «Контрактация» (исполнение)

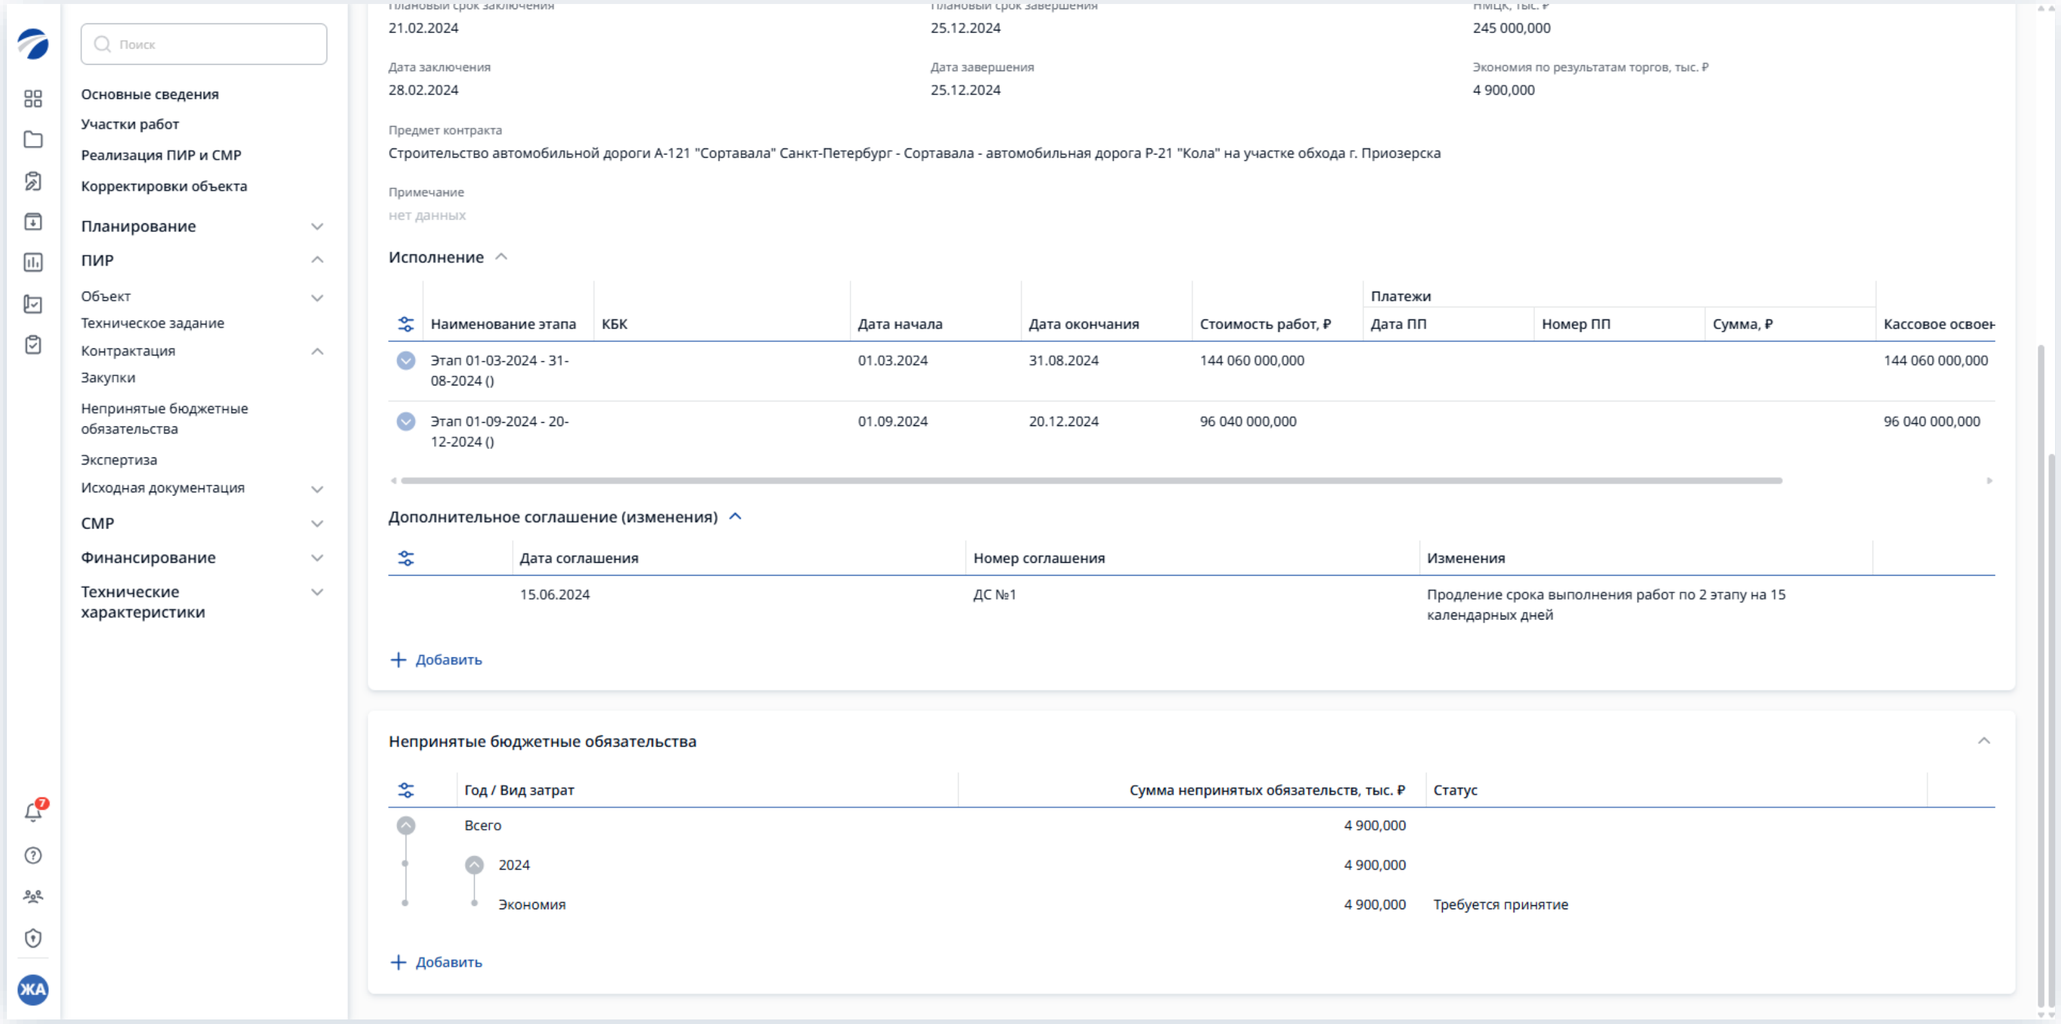


Раздел «ПИР» - «Экспертиза»

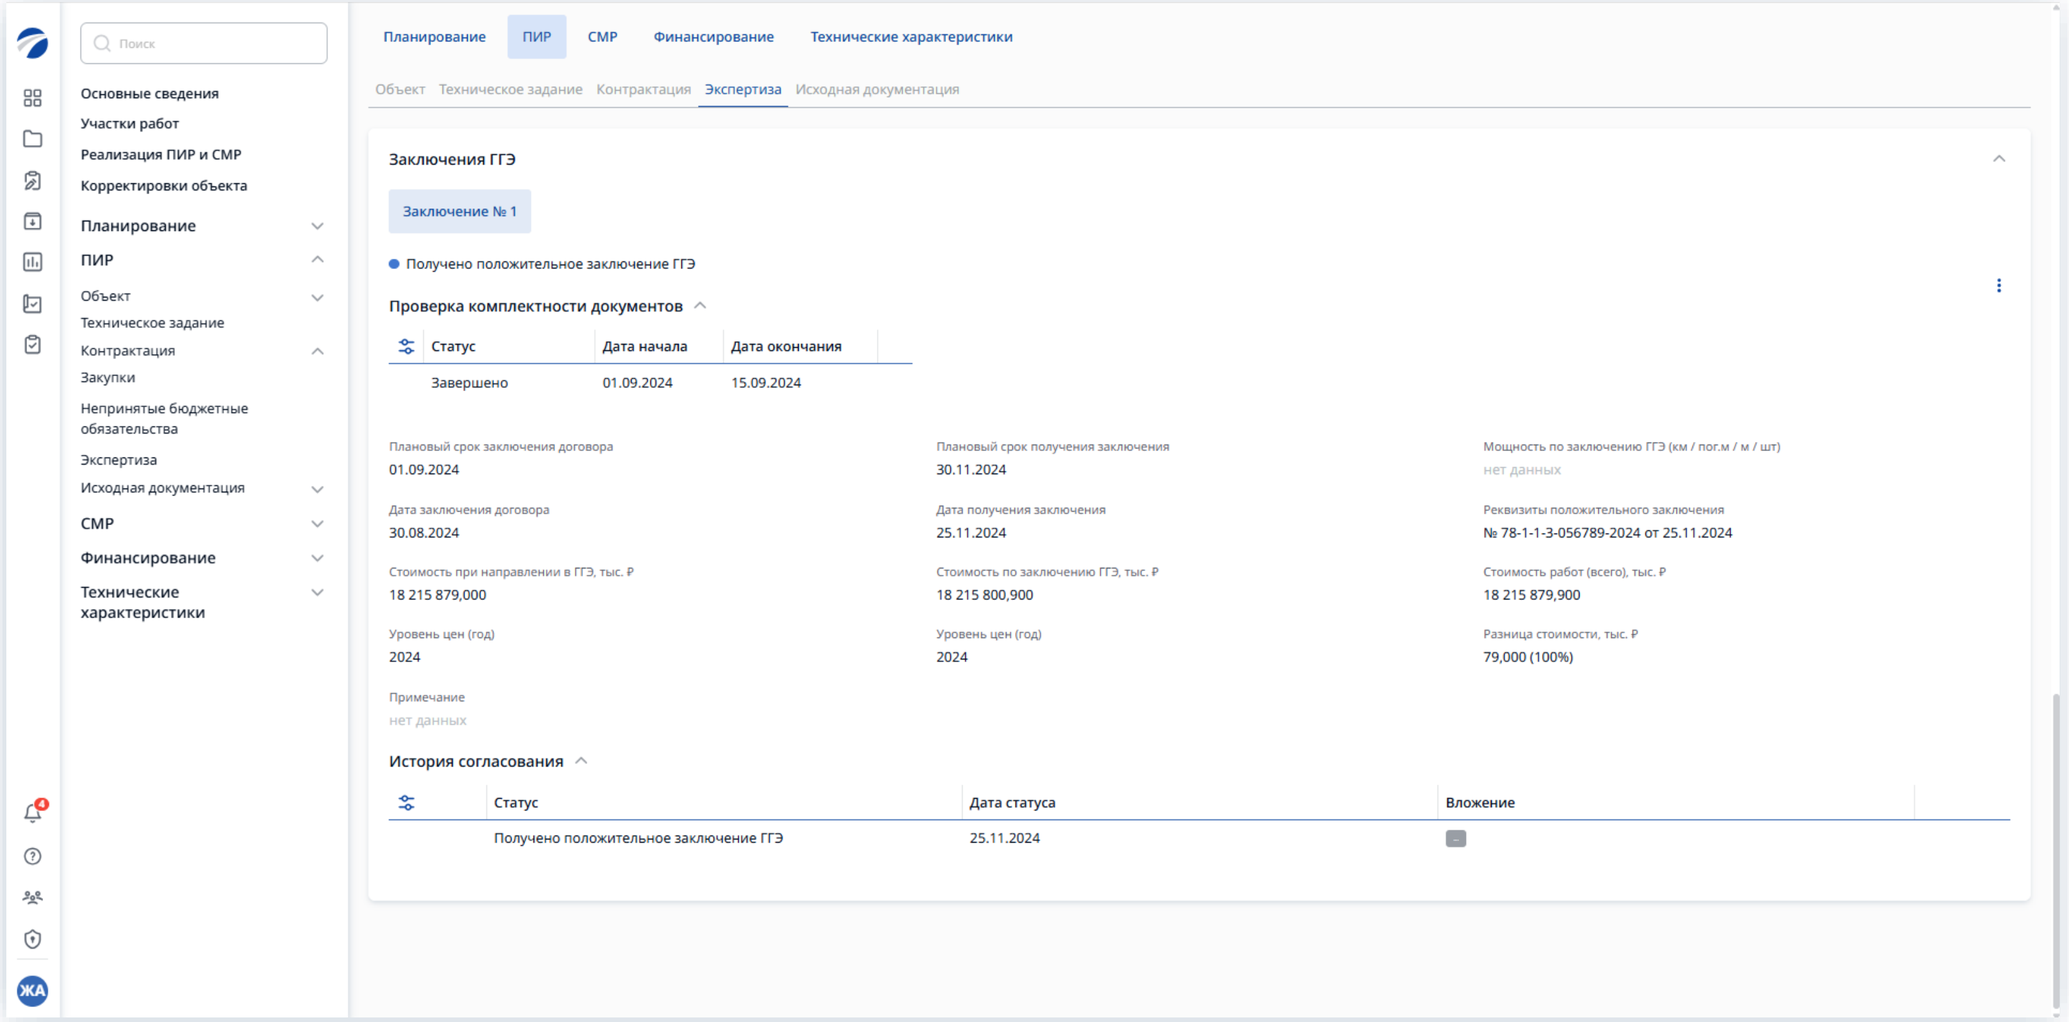


Раздел «ПИР» - «Исходная документация»

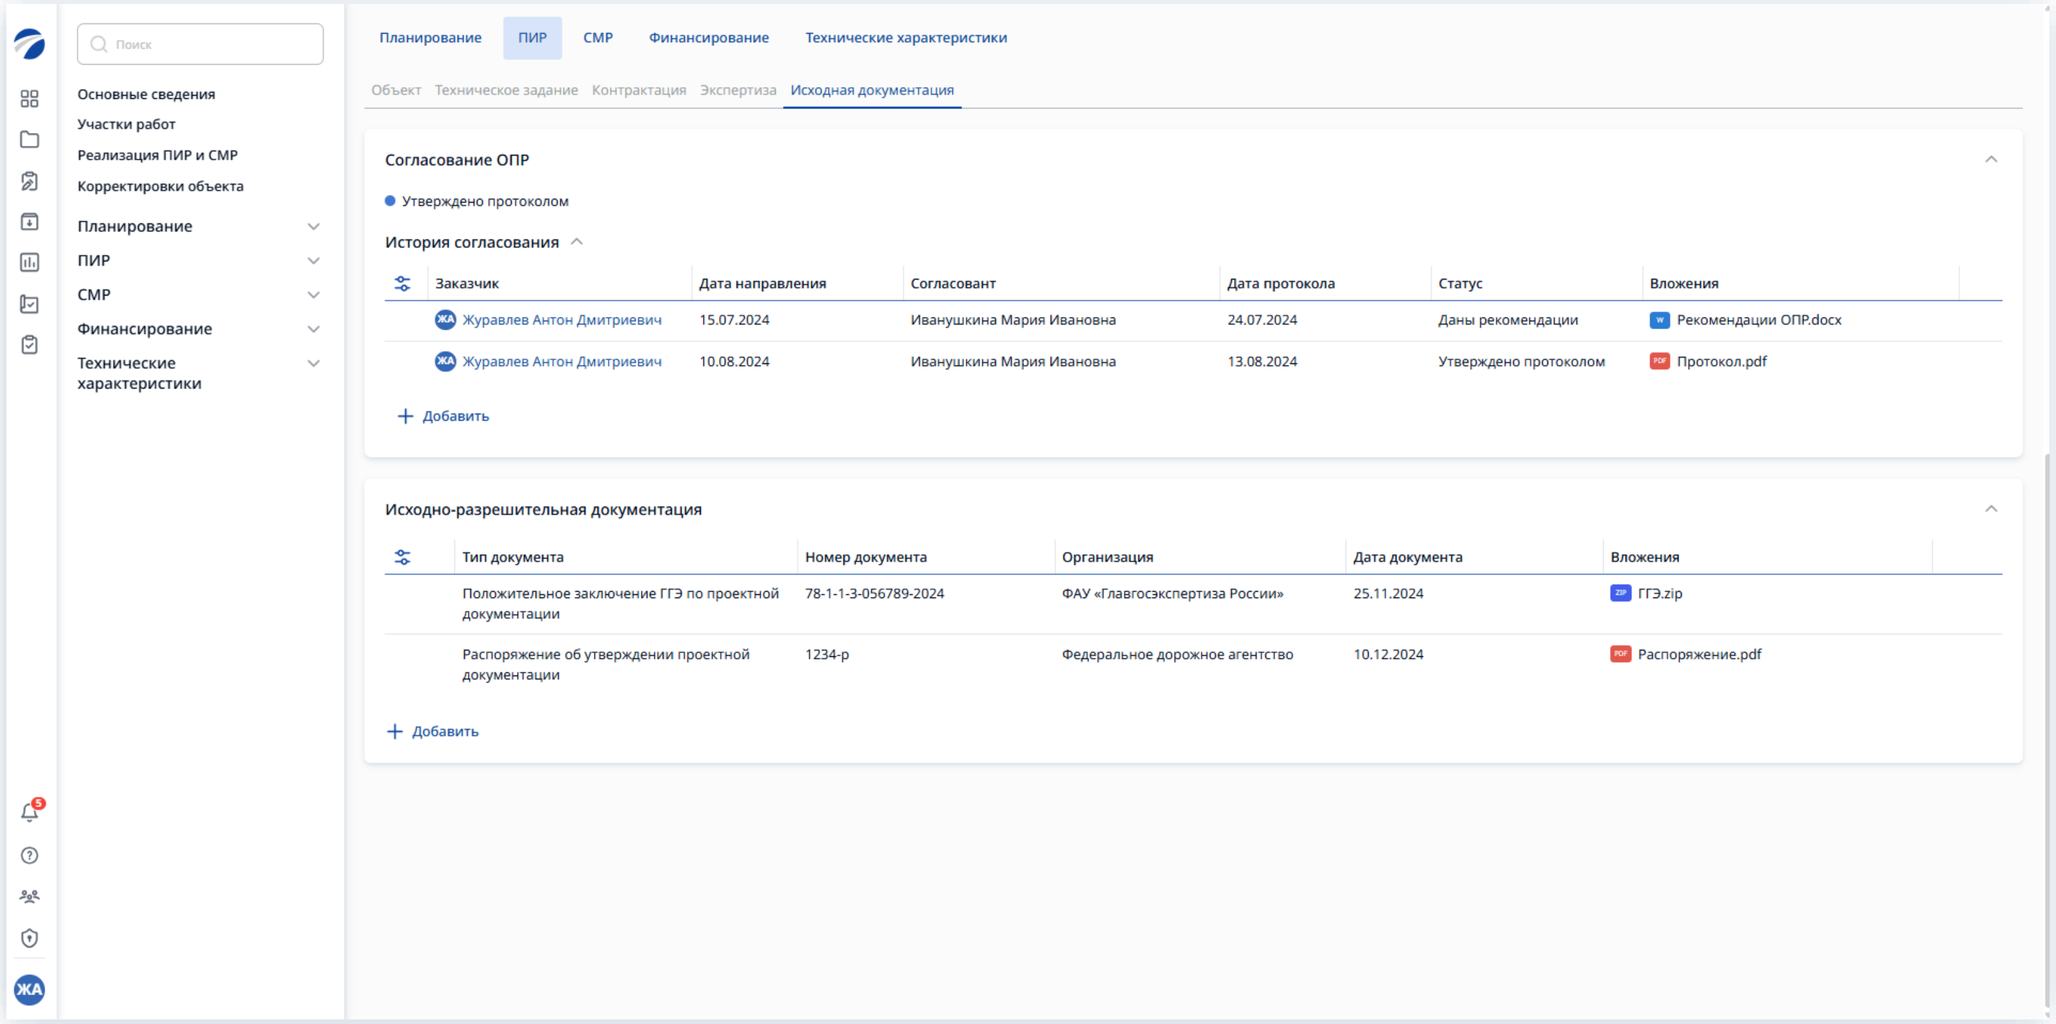


Раздел «СМР» - «Объект»

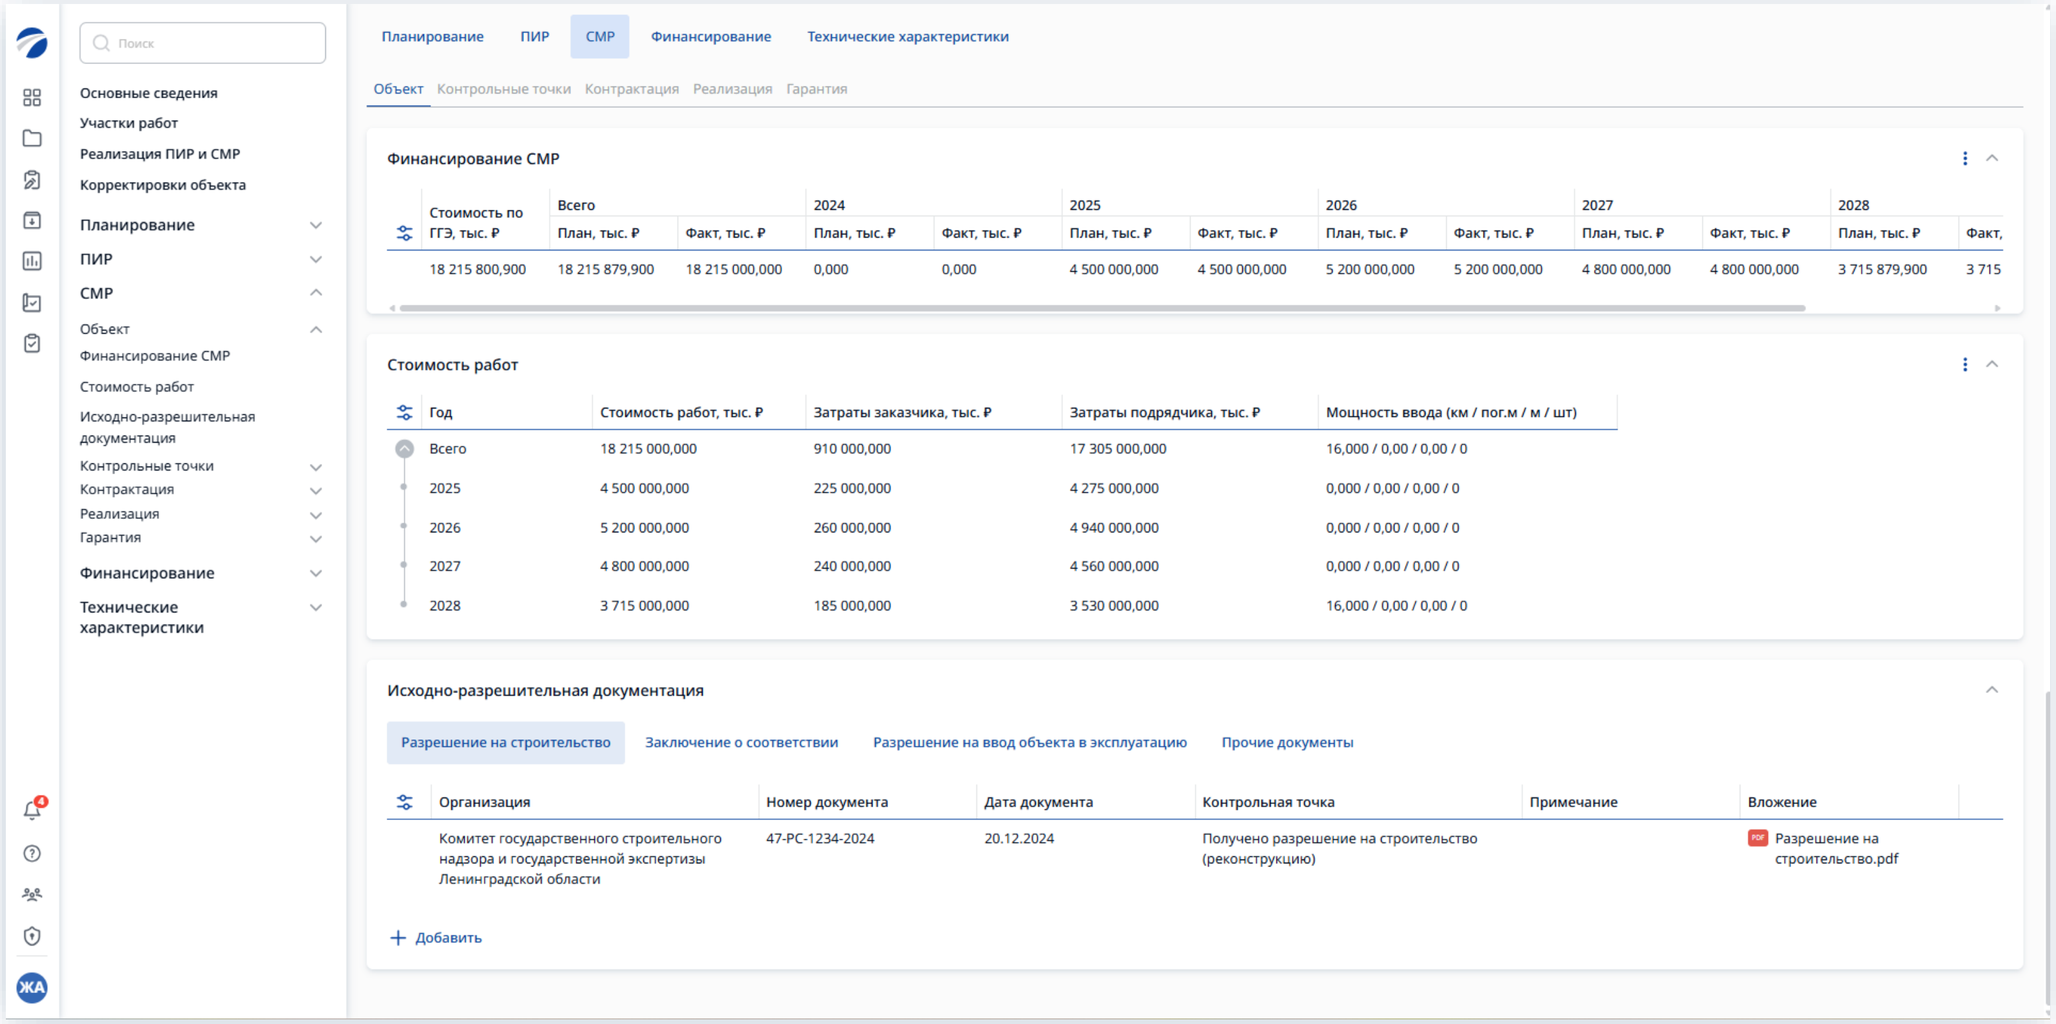


Раздел «СМР» - «Контрольные точки»

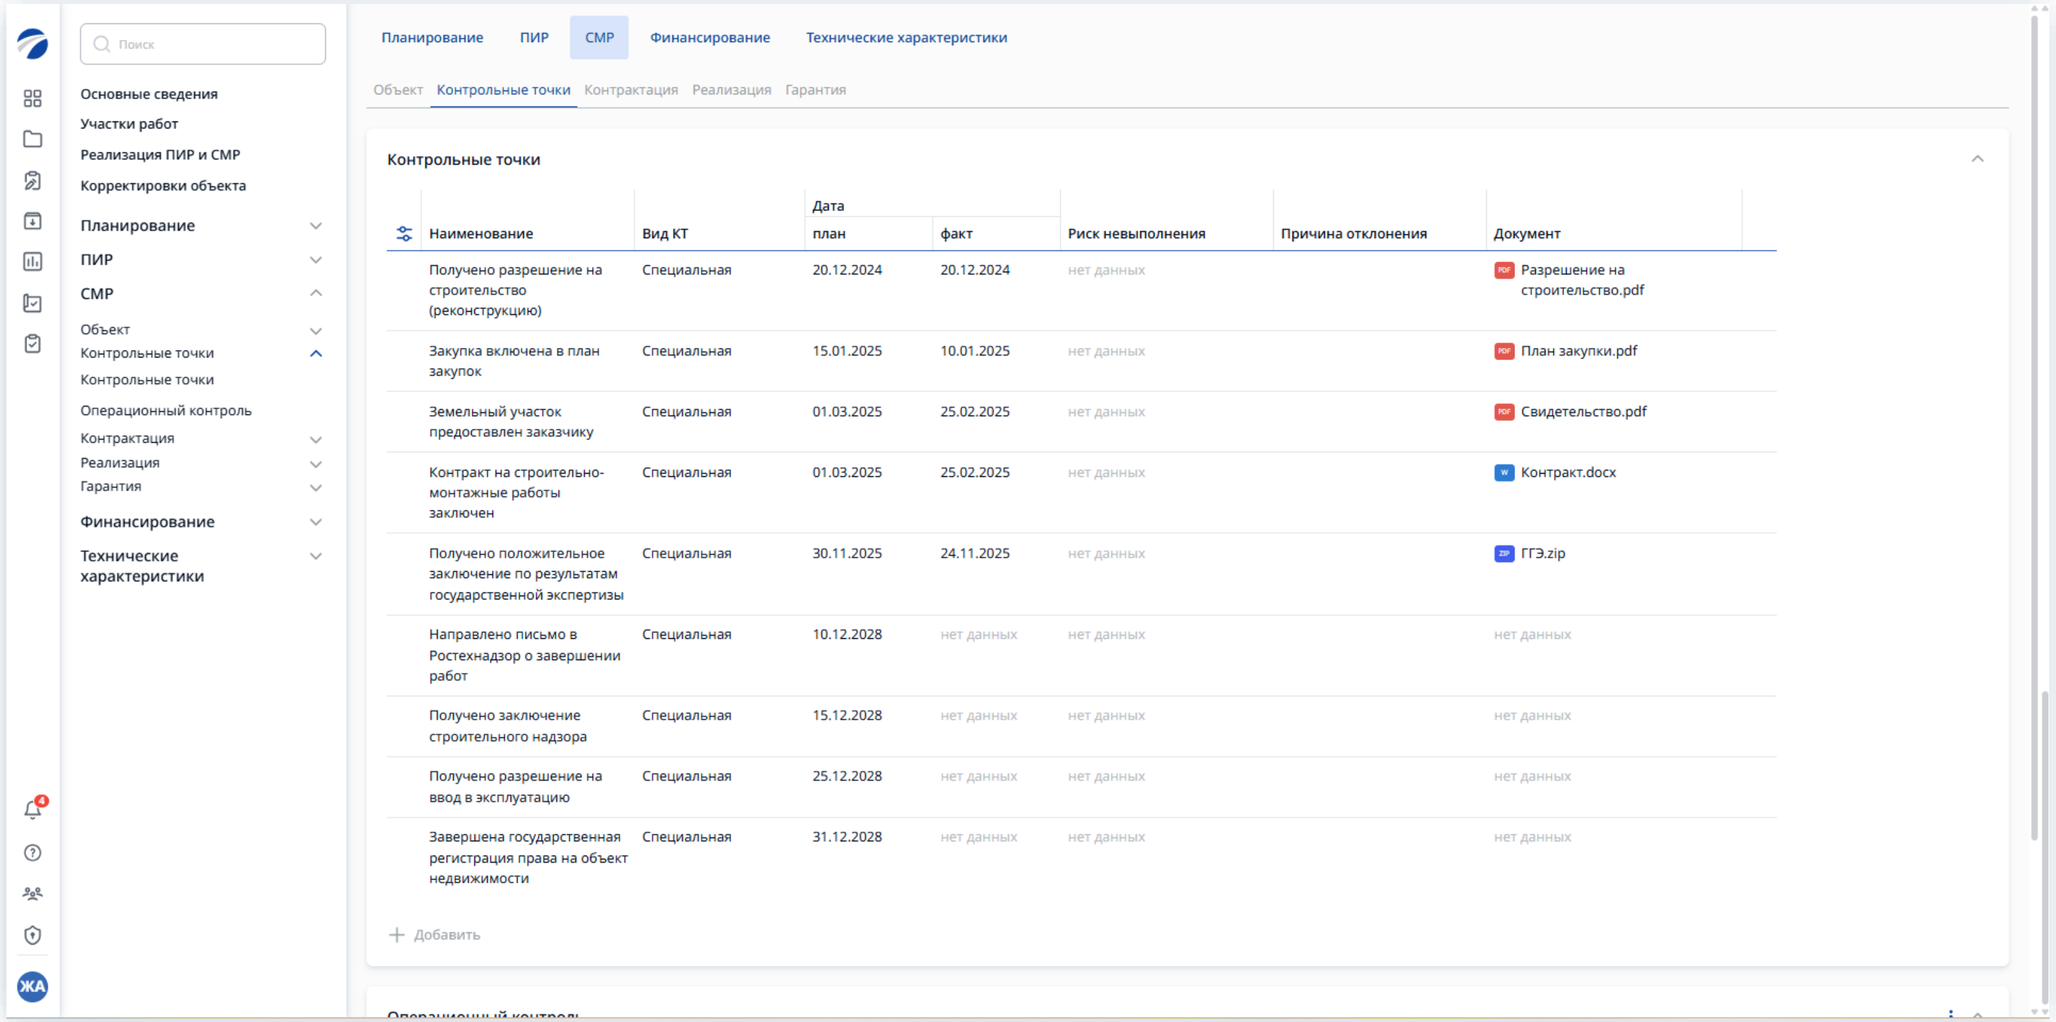


Раздел «СМР» - «Контрольные точки» (операционный контроль)

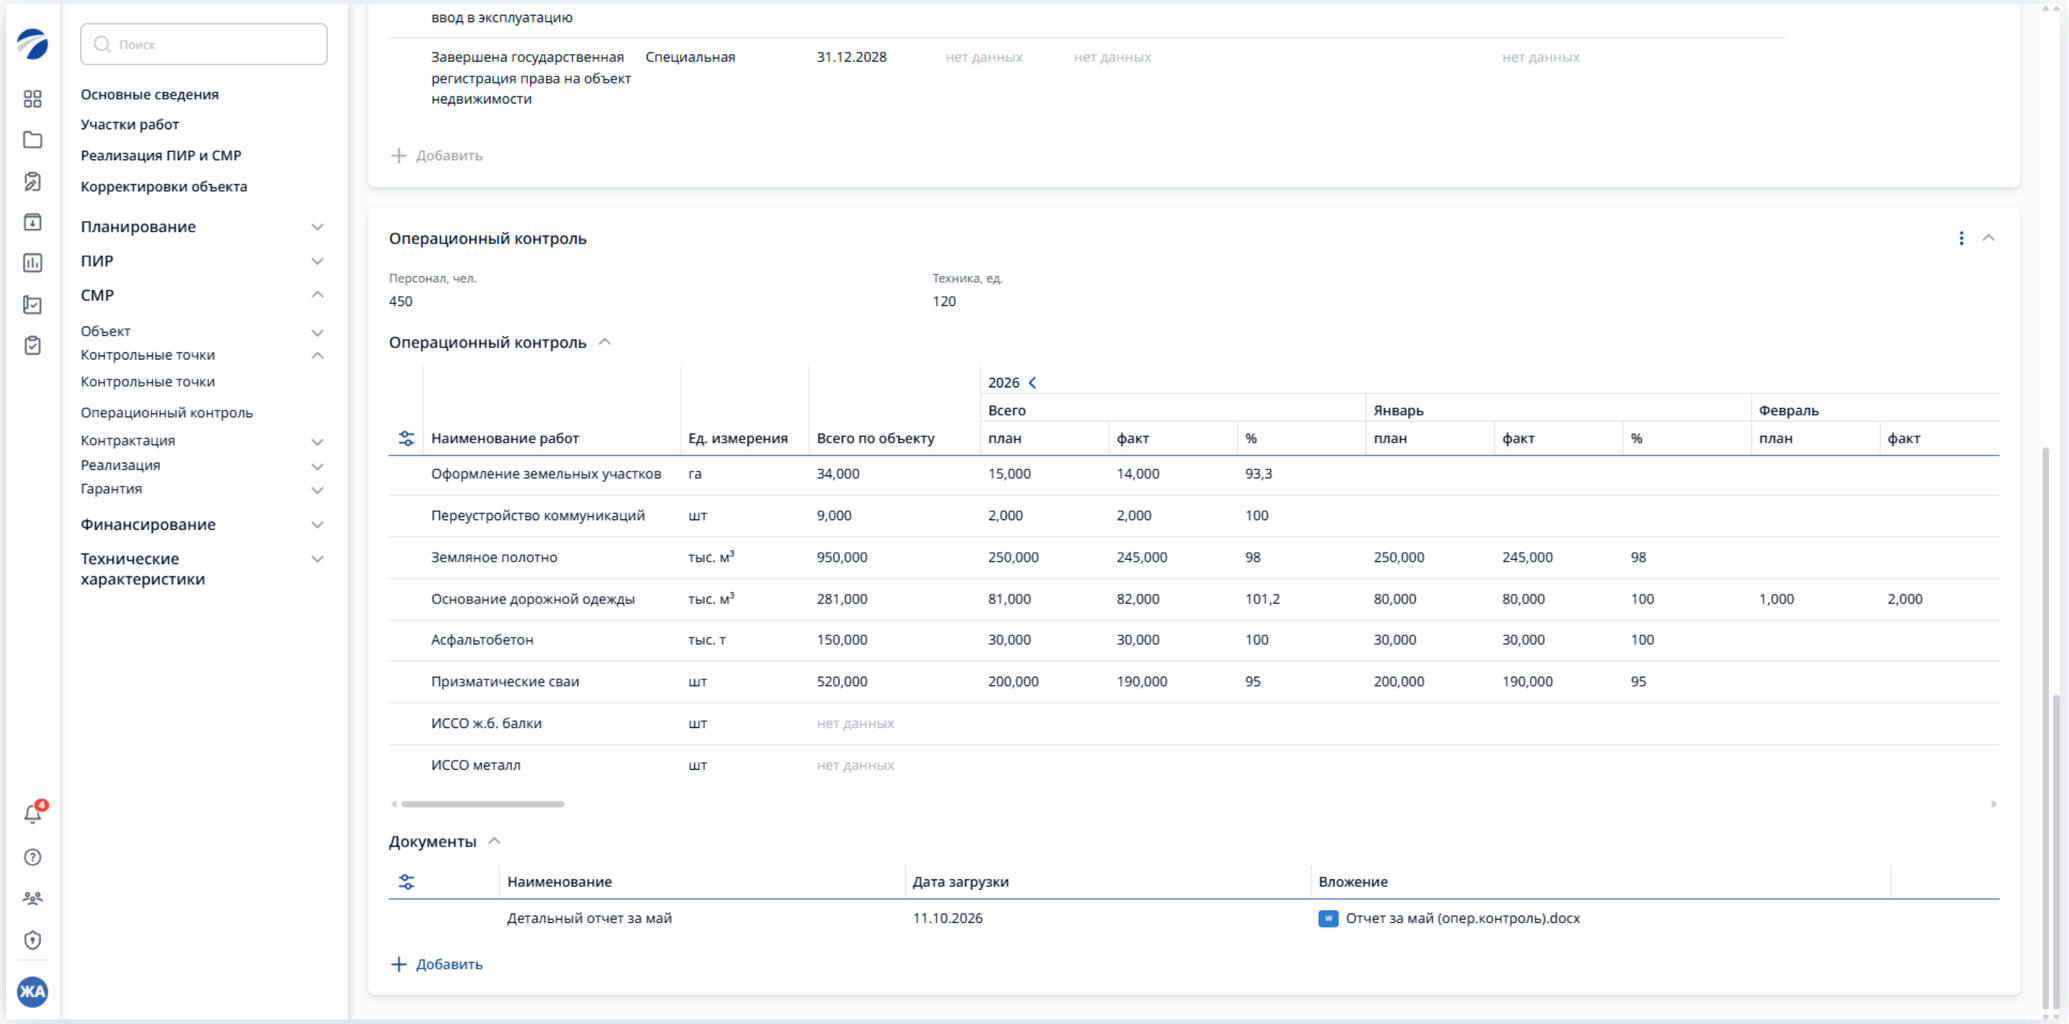


21 Раздел «СМР» - «Контрактация»

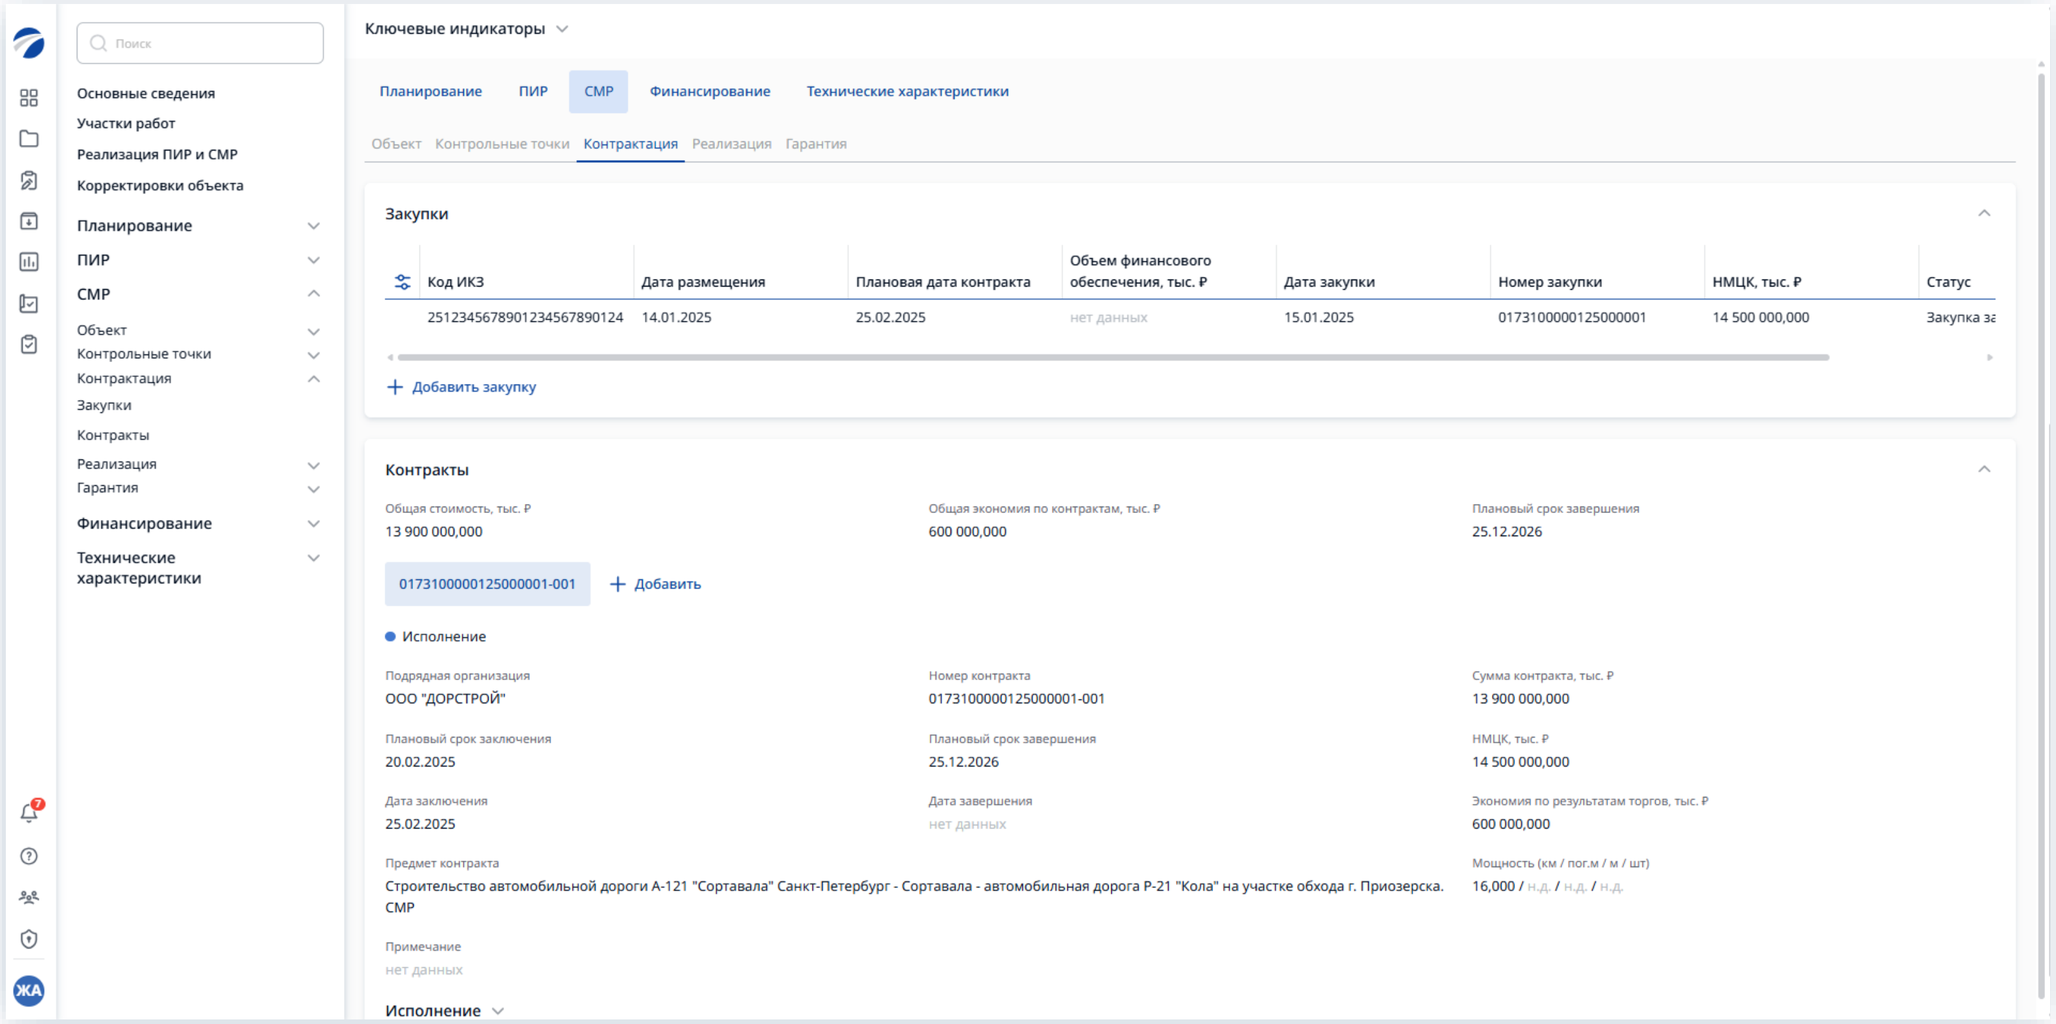

Раздел «СМР» - «Контрактация» (исполнение)

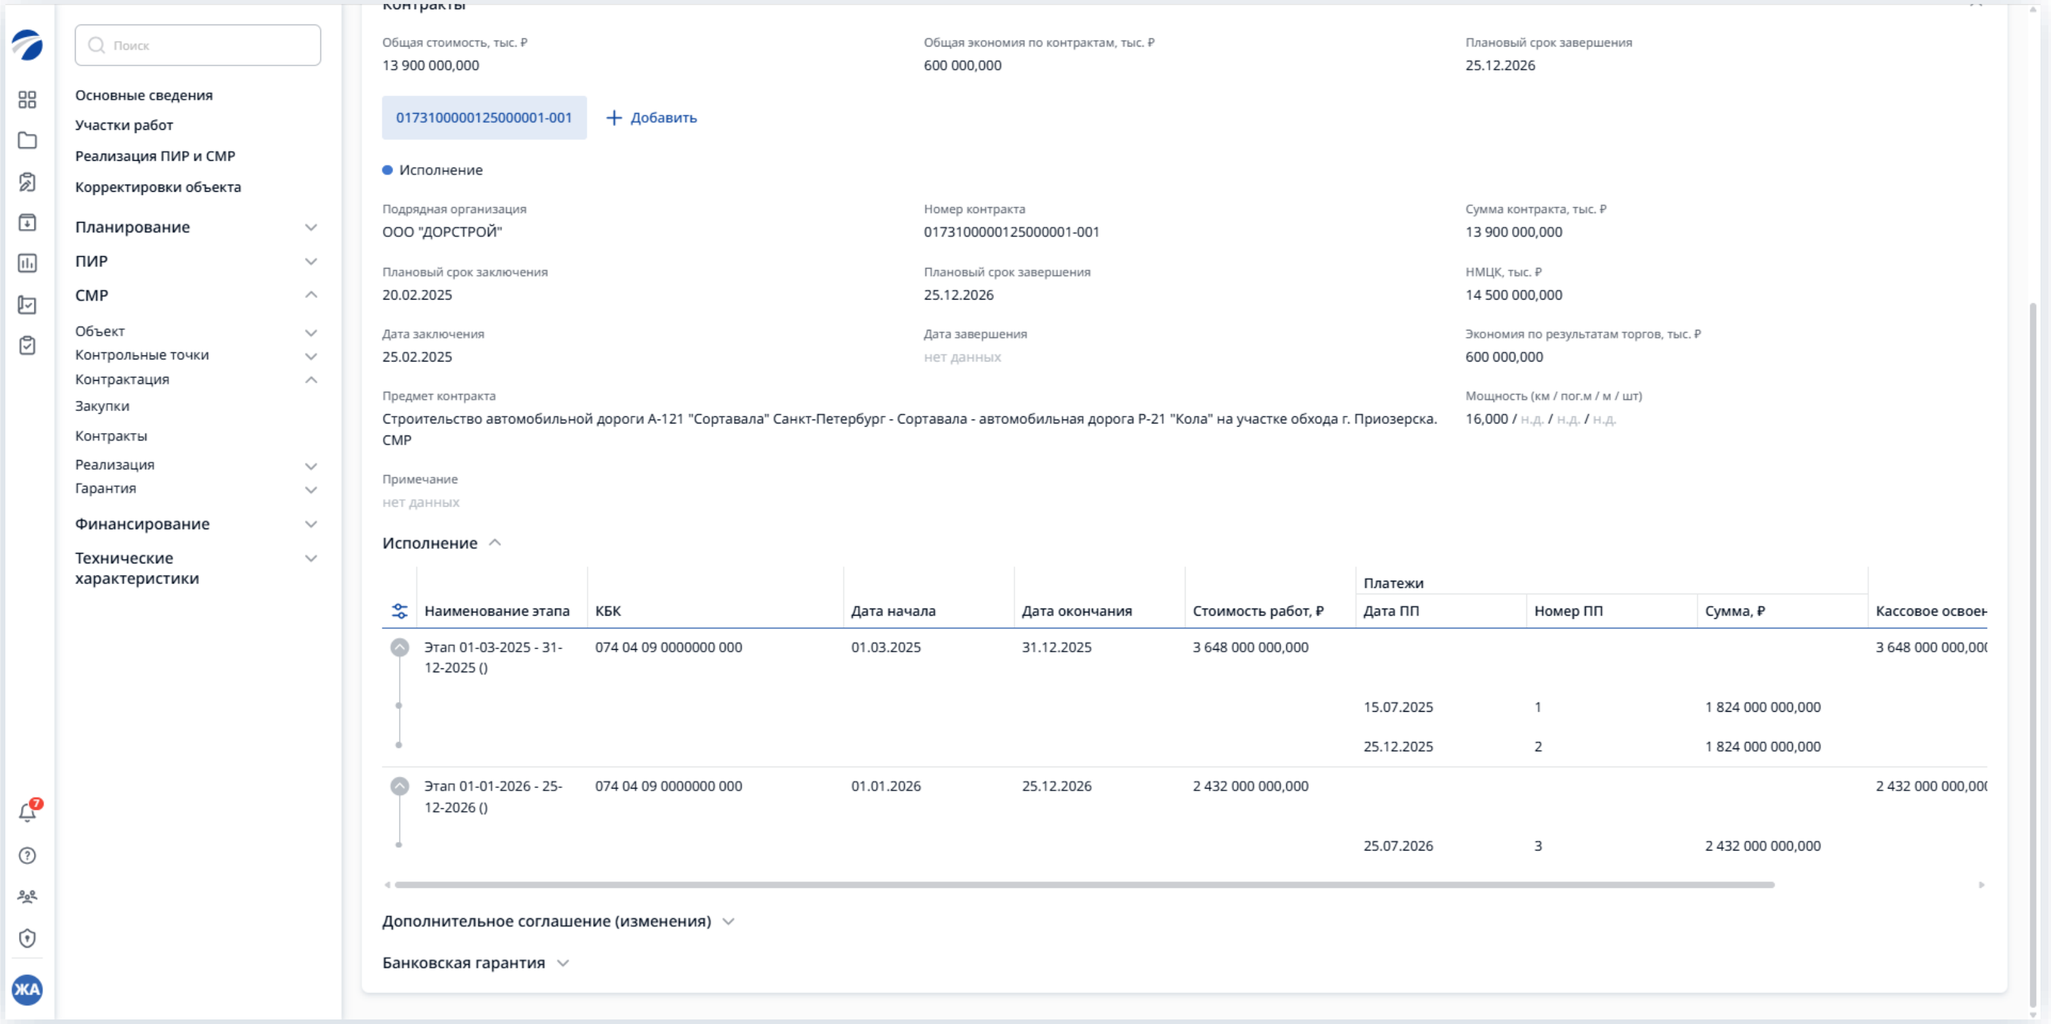


Раздел «СМР» - «Реализация»

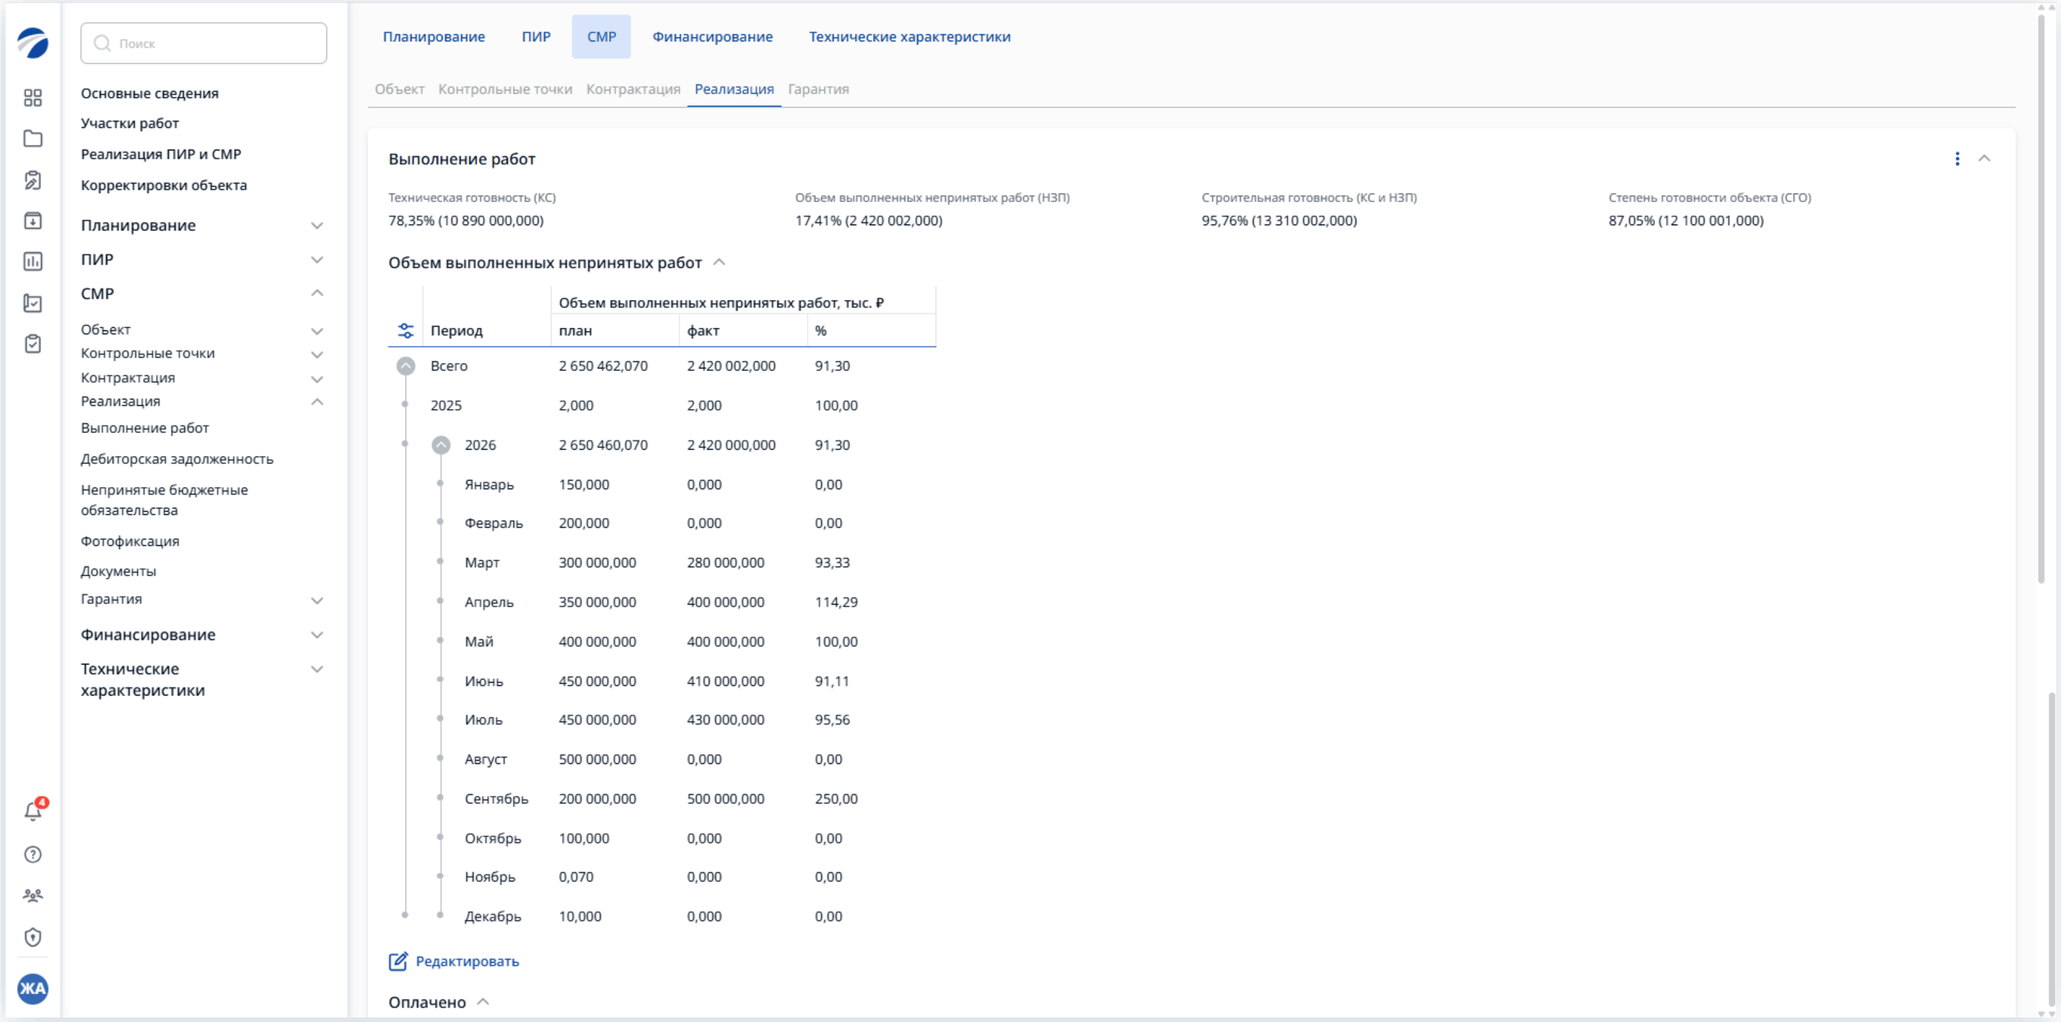


Период	Объем выполненных непринятых работ, тыс. ₽ план	факт	%
Всего	2 650 462,070	2 420 002,000	91,30
2025	2,000	2,000	100,00
2026	2 650 460,070	2 420 000,000	91,30
Январь	150,000	0,000	0,00
Февраль	200,000	0,000	0,00
Март	300 000,000	280 000,000	93,33
Апрель	350 000,000	400 000,000	114,29
Май	400 000,000	400 000,000	100,00
Июнь	450 000,000	410 000,000	91,11
Июль	450 000,000	430 000,000	95,56
Август	500 000,000	0,000	0,00
Сентябрь	200 000,000	500 000,000	250,00
Октябрь	100,000	0,000	0,00
Ноябрь	0,070	0,000	0,00
Декабрь	10,000	0,000	0,00

Раздел «СМР» - «Реализация» (оплачено)

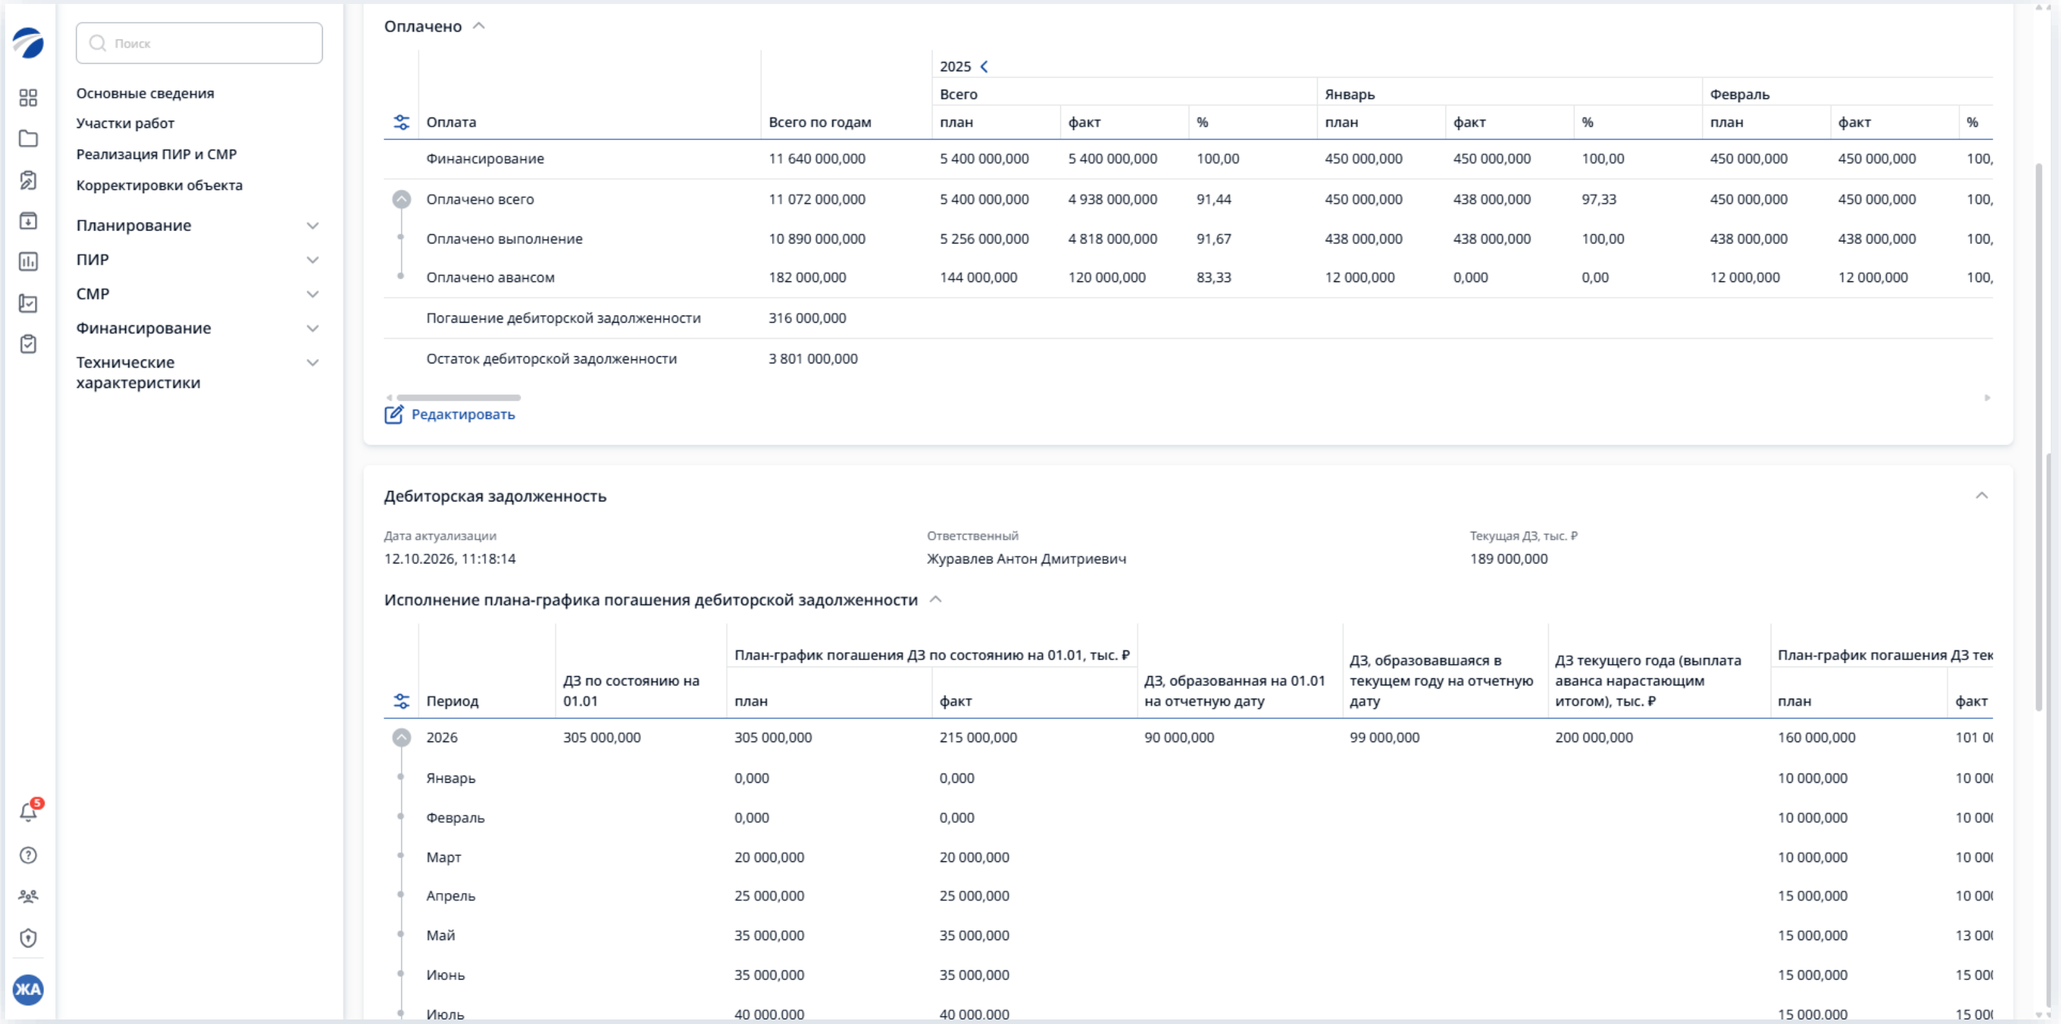

Раздел «СМР» - «Реализация» (дебиторская задолженность)

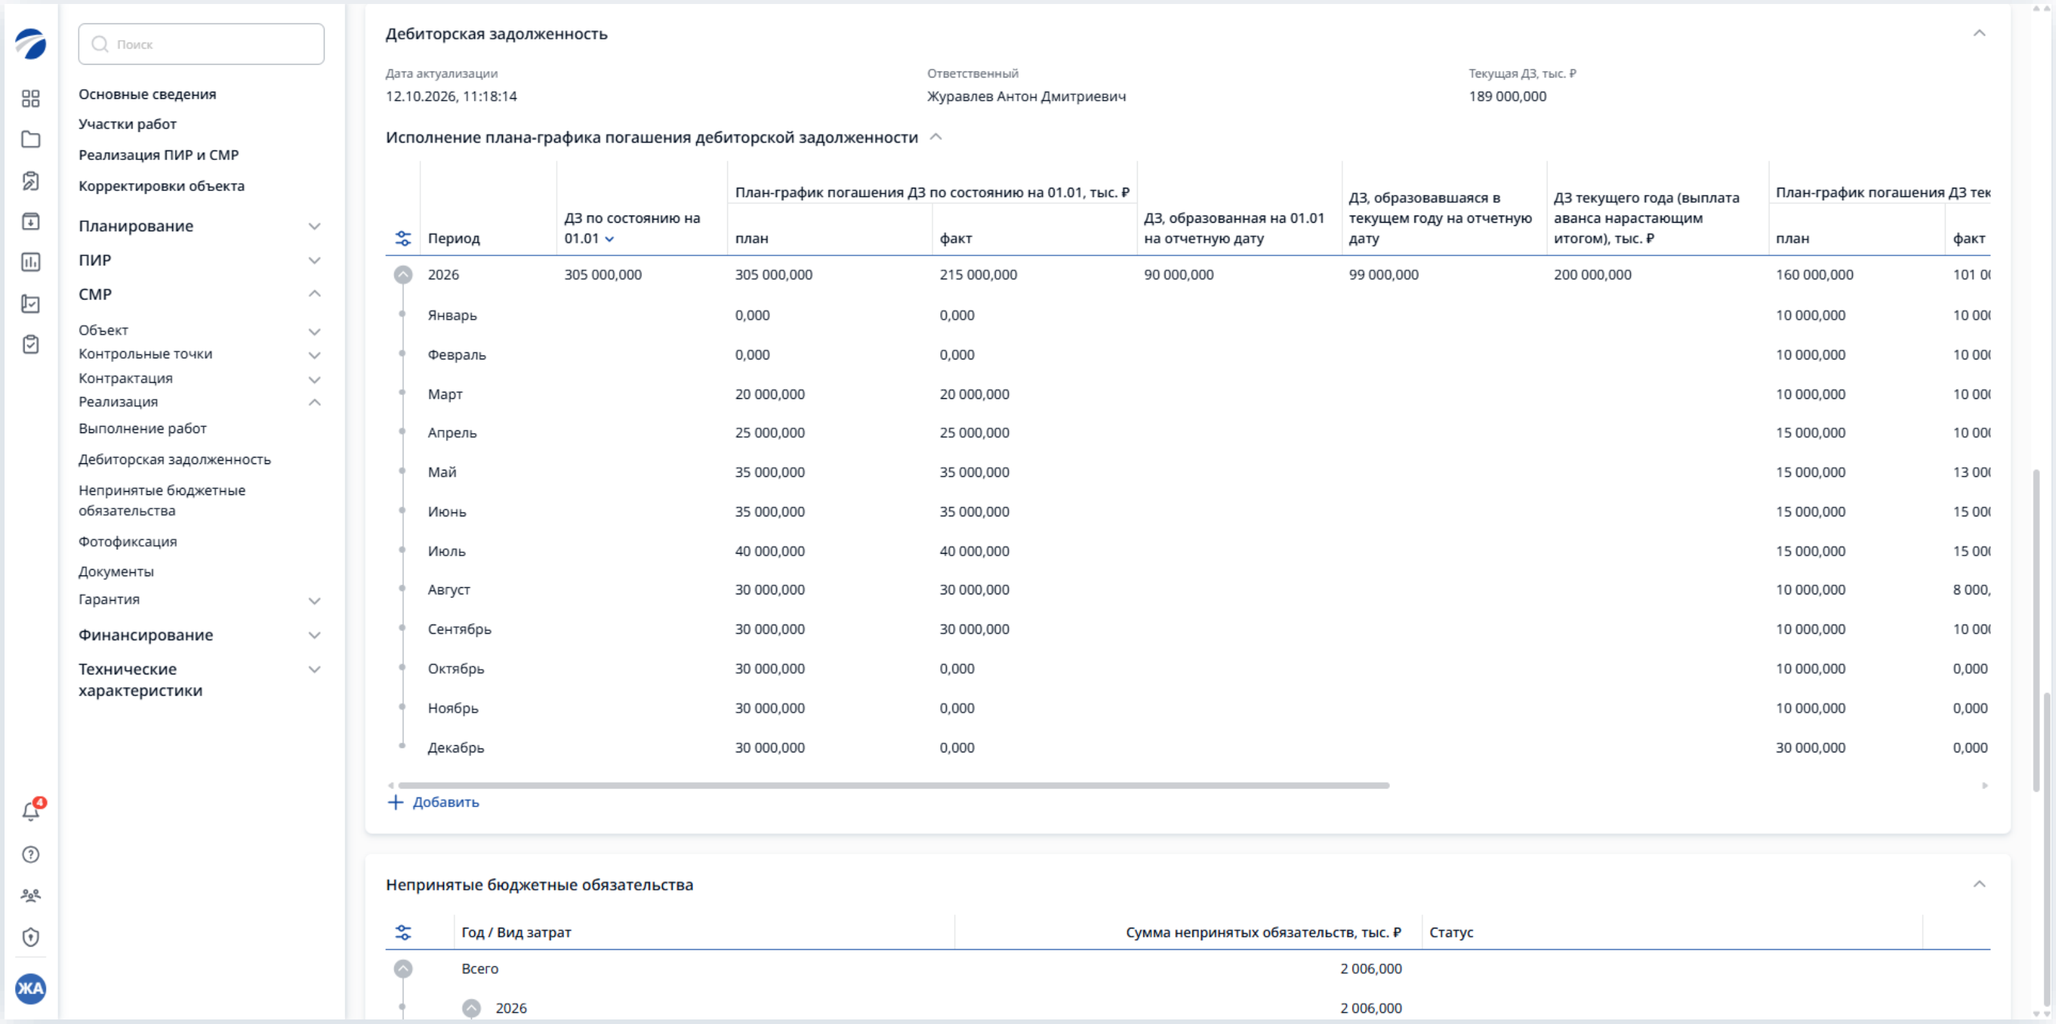

Дебиторская задолженность

Дата актуализации: 12.10.2026, 11:18:14

Ответственный: Журавлев Антон Дмитриевич

Текущая ДЗ, тыс. ₽: 189 000,000

Исполнение плана-графика погашения дебиторской задолженности


Период	ДЗ по состоянию на 01.01	План-график погашения ДЗ по состоянию на 01.01, тыс. ₽		ДЗ, образованная на 01.01 на отчетную дату	ДЗ, образовавшаяся в текущем году на отчетную дату	ДЗ текущего года (выплата аванса нарастающим итогом), тыс. ₽	План-график погашения ДЗ тек	
		план	факт				план	факт
2026	305 000,000	305 000,000	215 000,000	90 000,000	99 000,000	200 000,000	160 000,000	101 0
Январь		0,000	0,000				10 000,000	10 00
Февраль		0,000	0,000				10 000,000	10 00
Март		20 000,000	20 000,000				10 000,000	10 00
Апрель		25 000,000	25 000,000				15 000,000	10 00
Май		35 000,000	35 000,000				15 000,000	13 00
Июнь		35 000,000	35 000,000				15 000,000	15 00
Июль		40 000,000	40 000,000				15 000,000	15 00
Август		30 000,000	30 000,000				10 000,000	8 000,
Сентябрь		30 000,000	30 000,000				10 000,000	10 00
Октябрь		30 000,000	0,000				10 000,000	0,000
Ноябрь		30 000,000	0,000				10 000,000	0,000
Декабрь		30 000,000	0,000				30 000,000	0,000

+ Добавить


Непринятые бюджетные обязательства

Год / Вид затрат	Сумма непринятых обязательств, тыс. ₽	Статус
Всего	2 006,000	
2026	2 006,000	


Раздел «СМР» - «Реализация» (непринятые БО и документы)

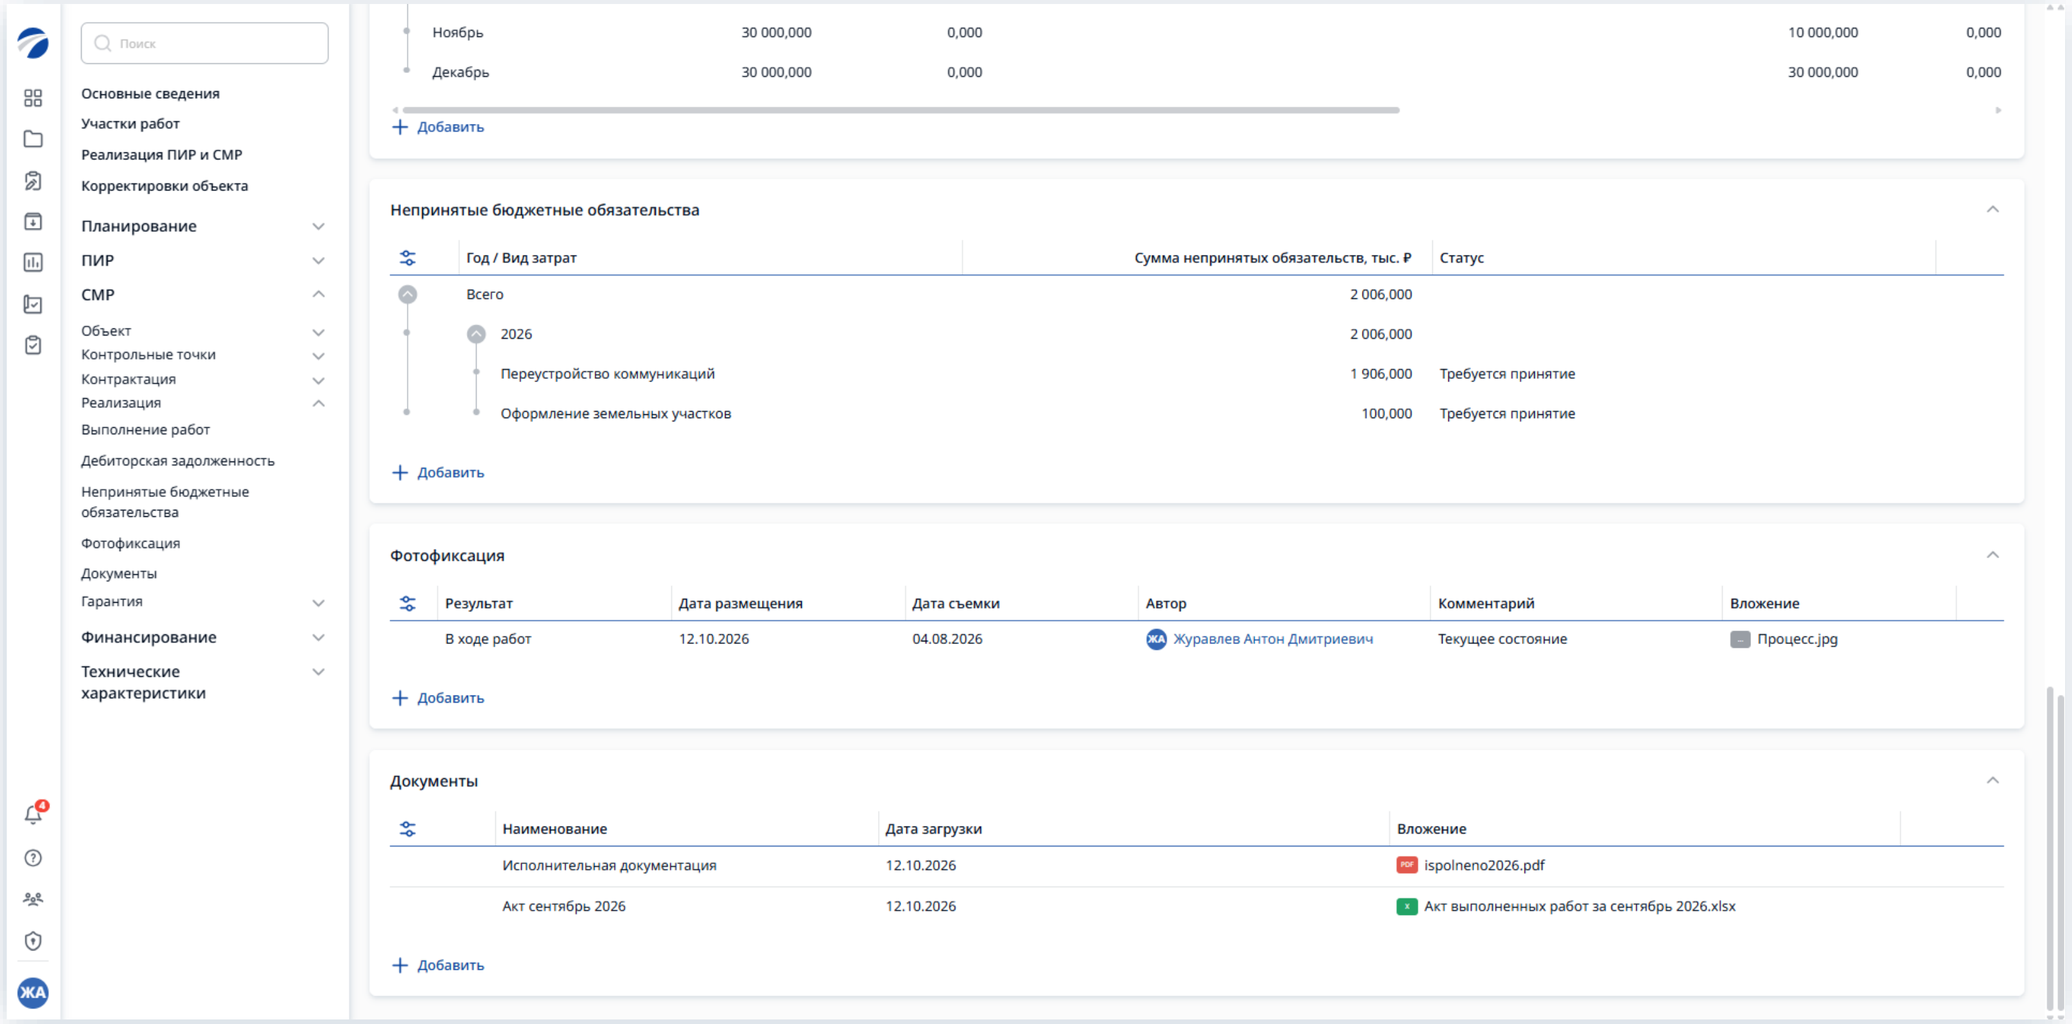

Раздел «СМР» - «Гарантия»

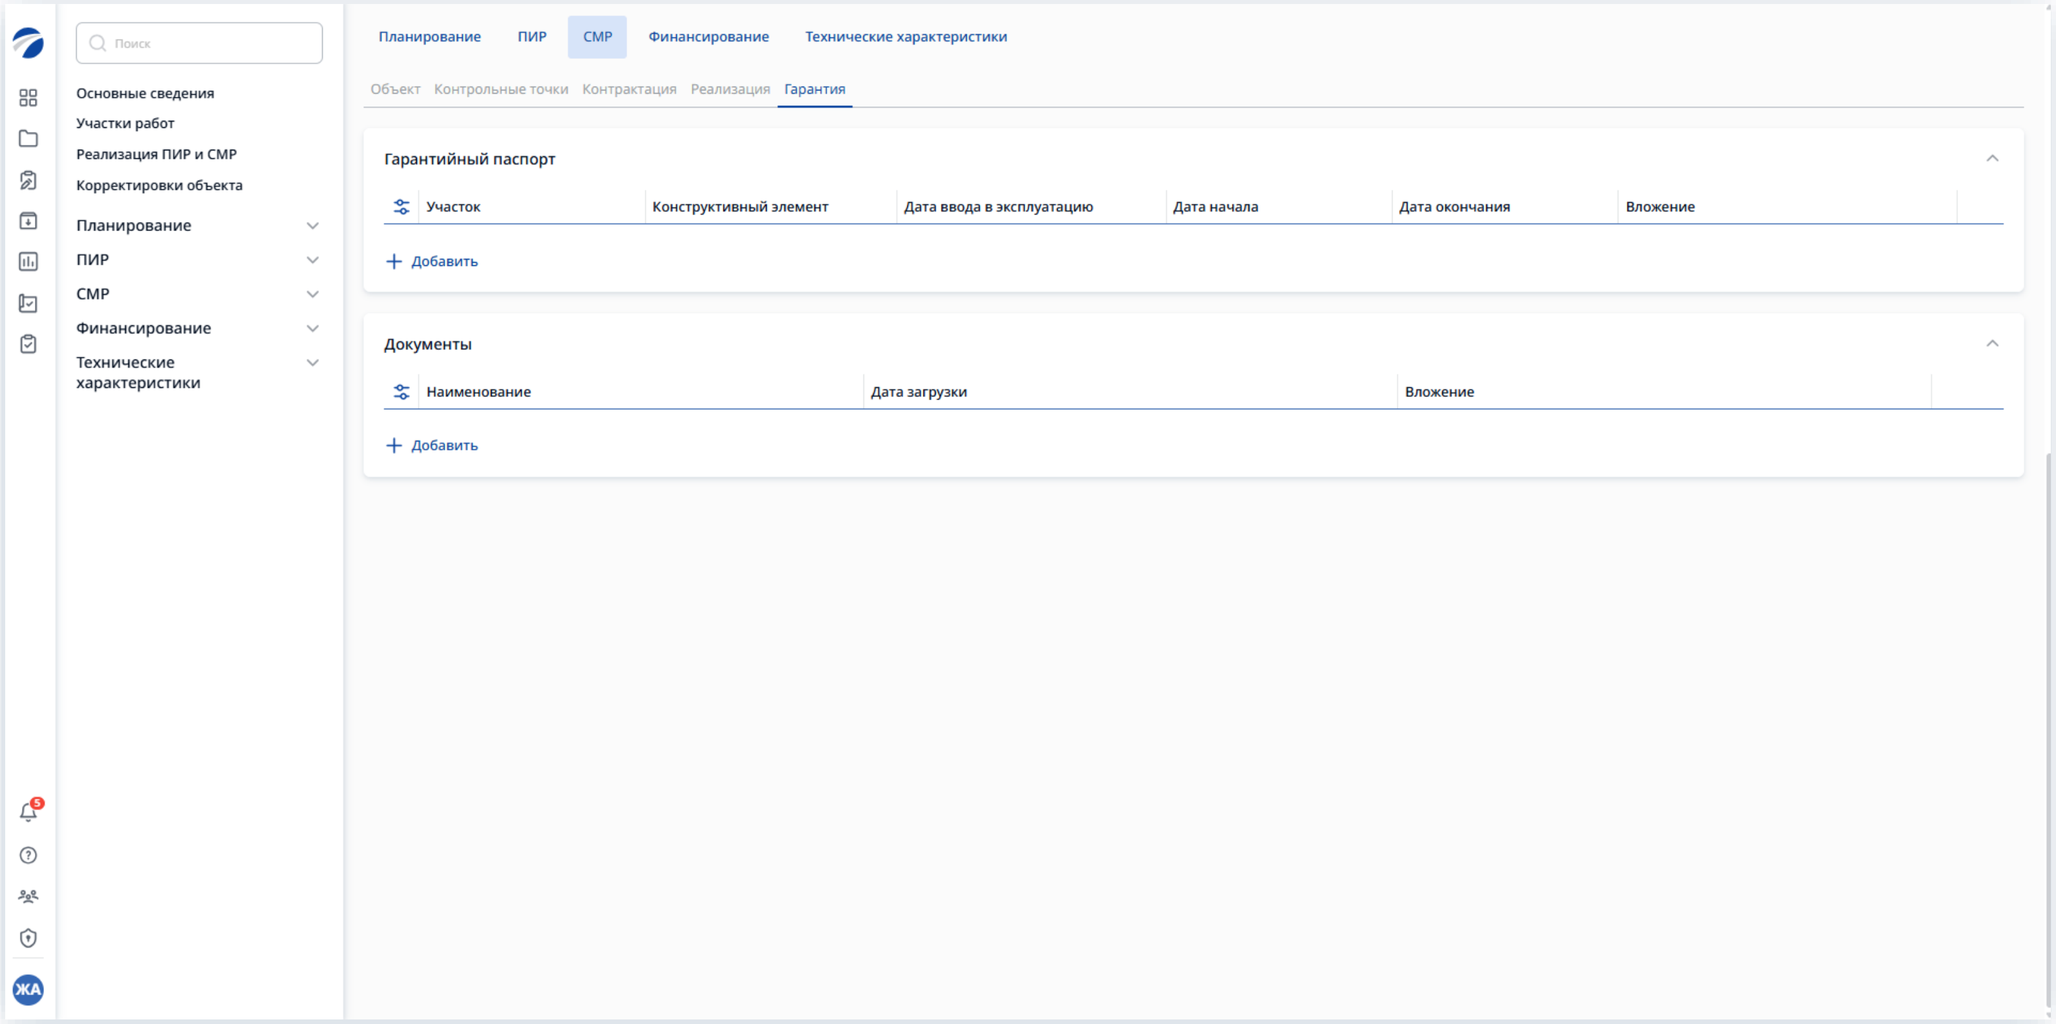


Раздел «Финансирование» (агрегаты значений)

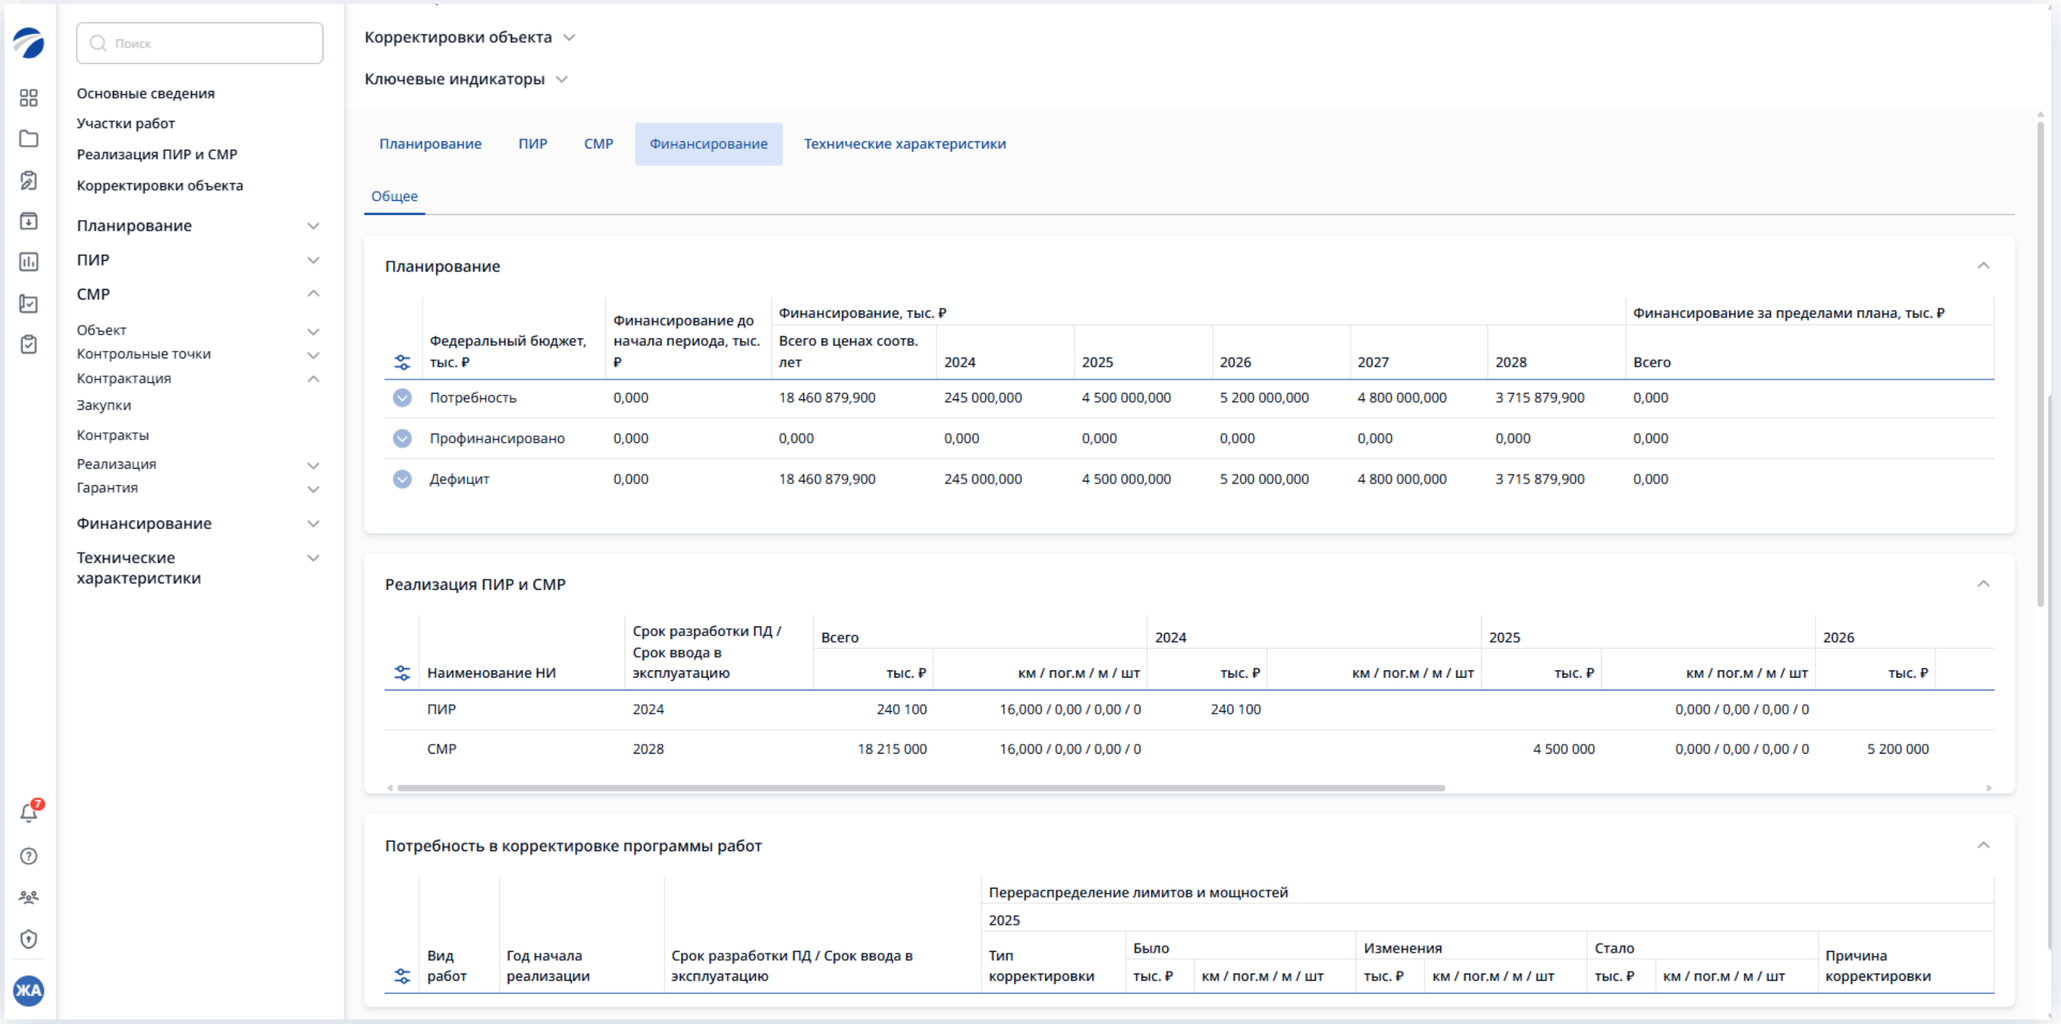


Раздел «Финансирование» (агрегаты значений)




Раздел «Технические характеристики»

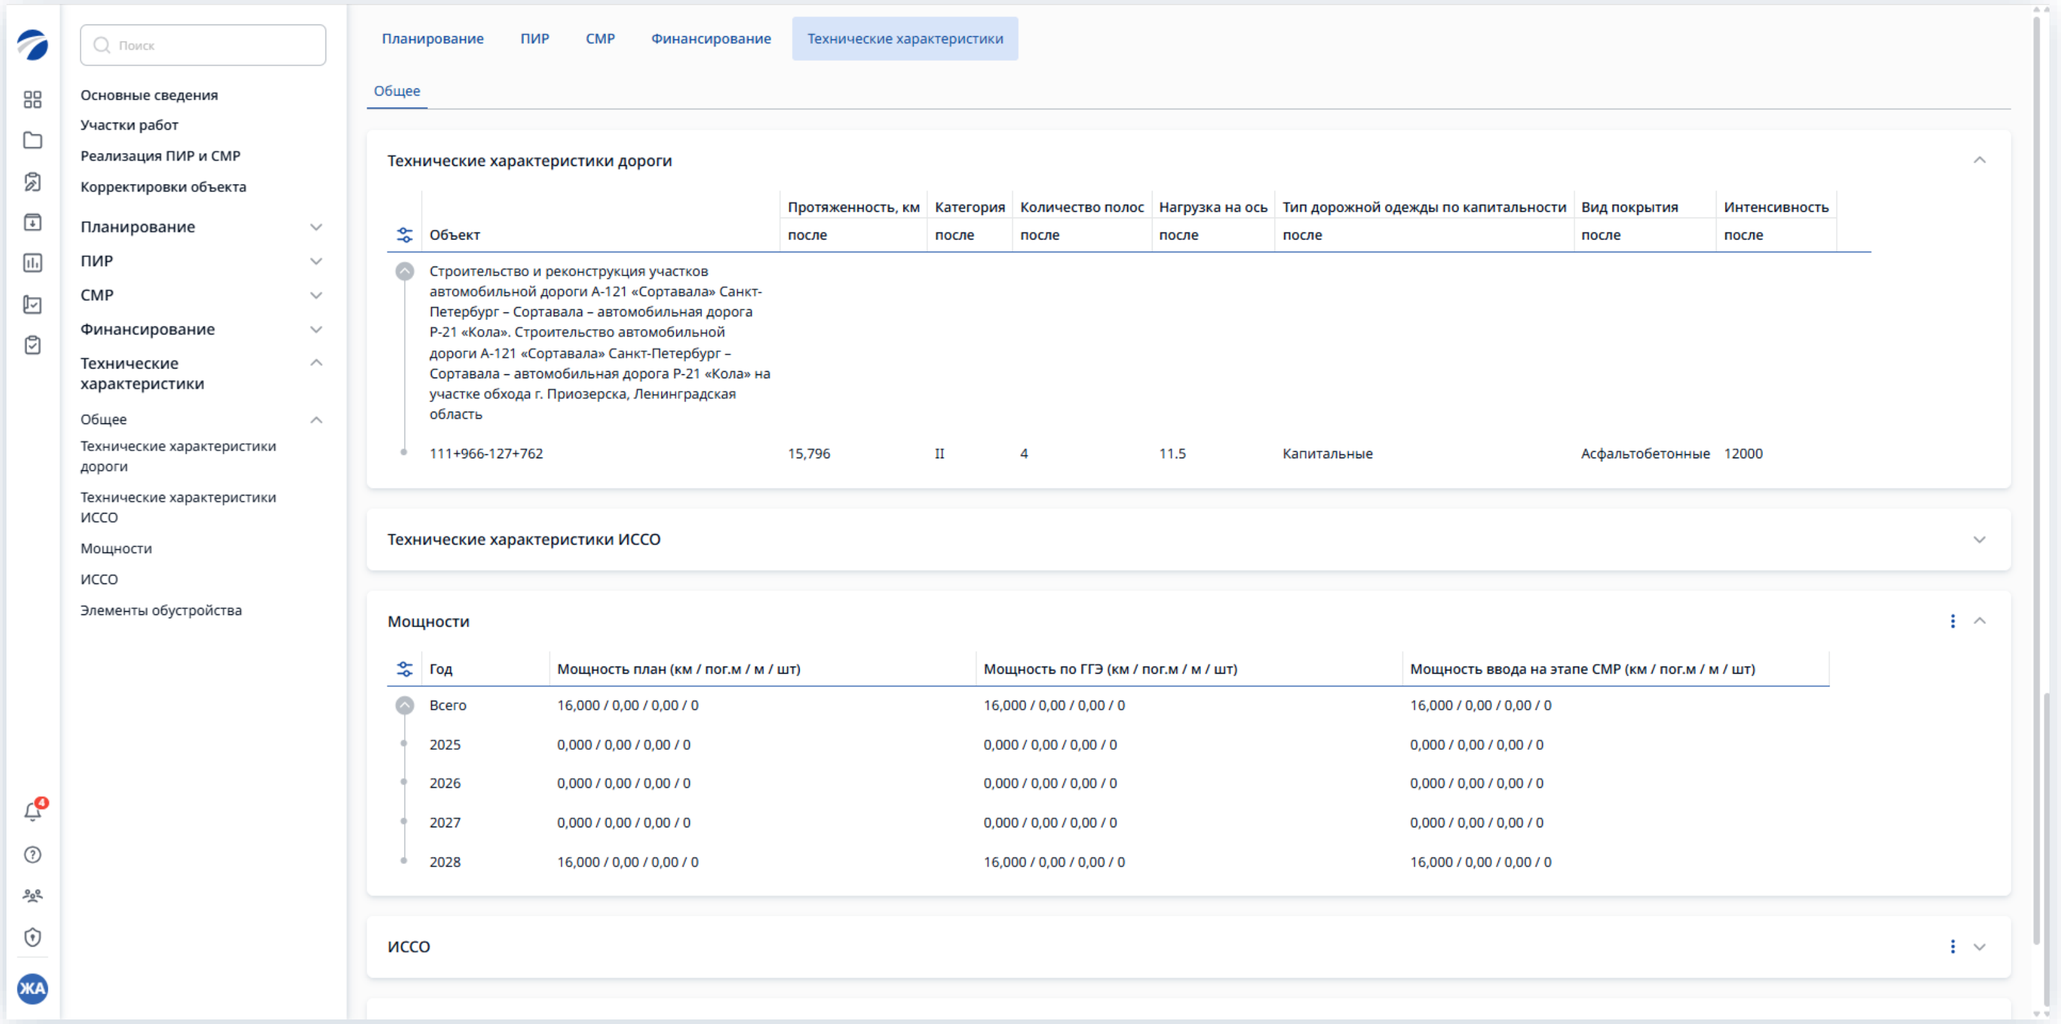


Раздел «Технические характеристики» (ИССО и элементы обустройства)

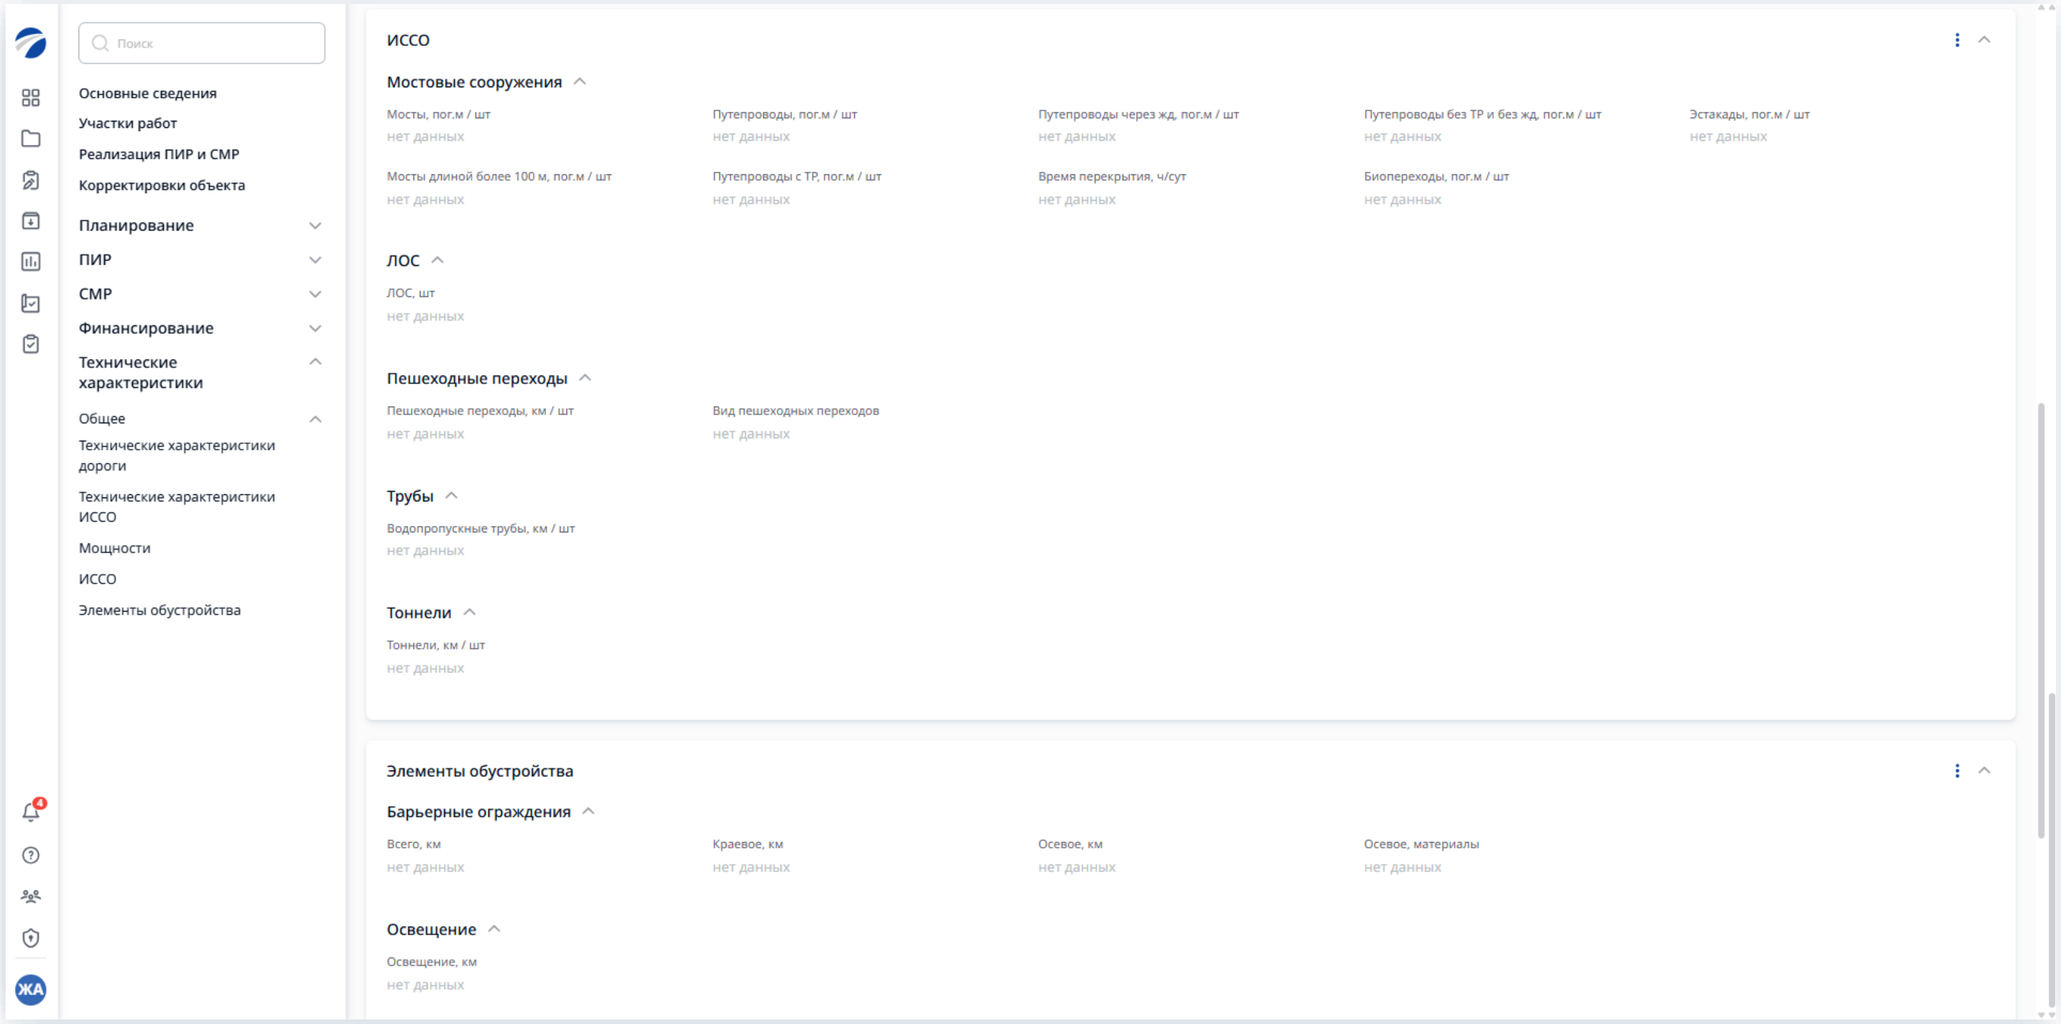

Аналитическая панель ОКС

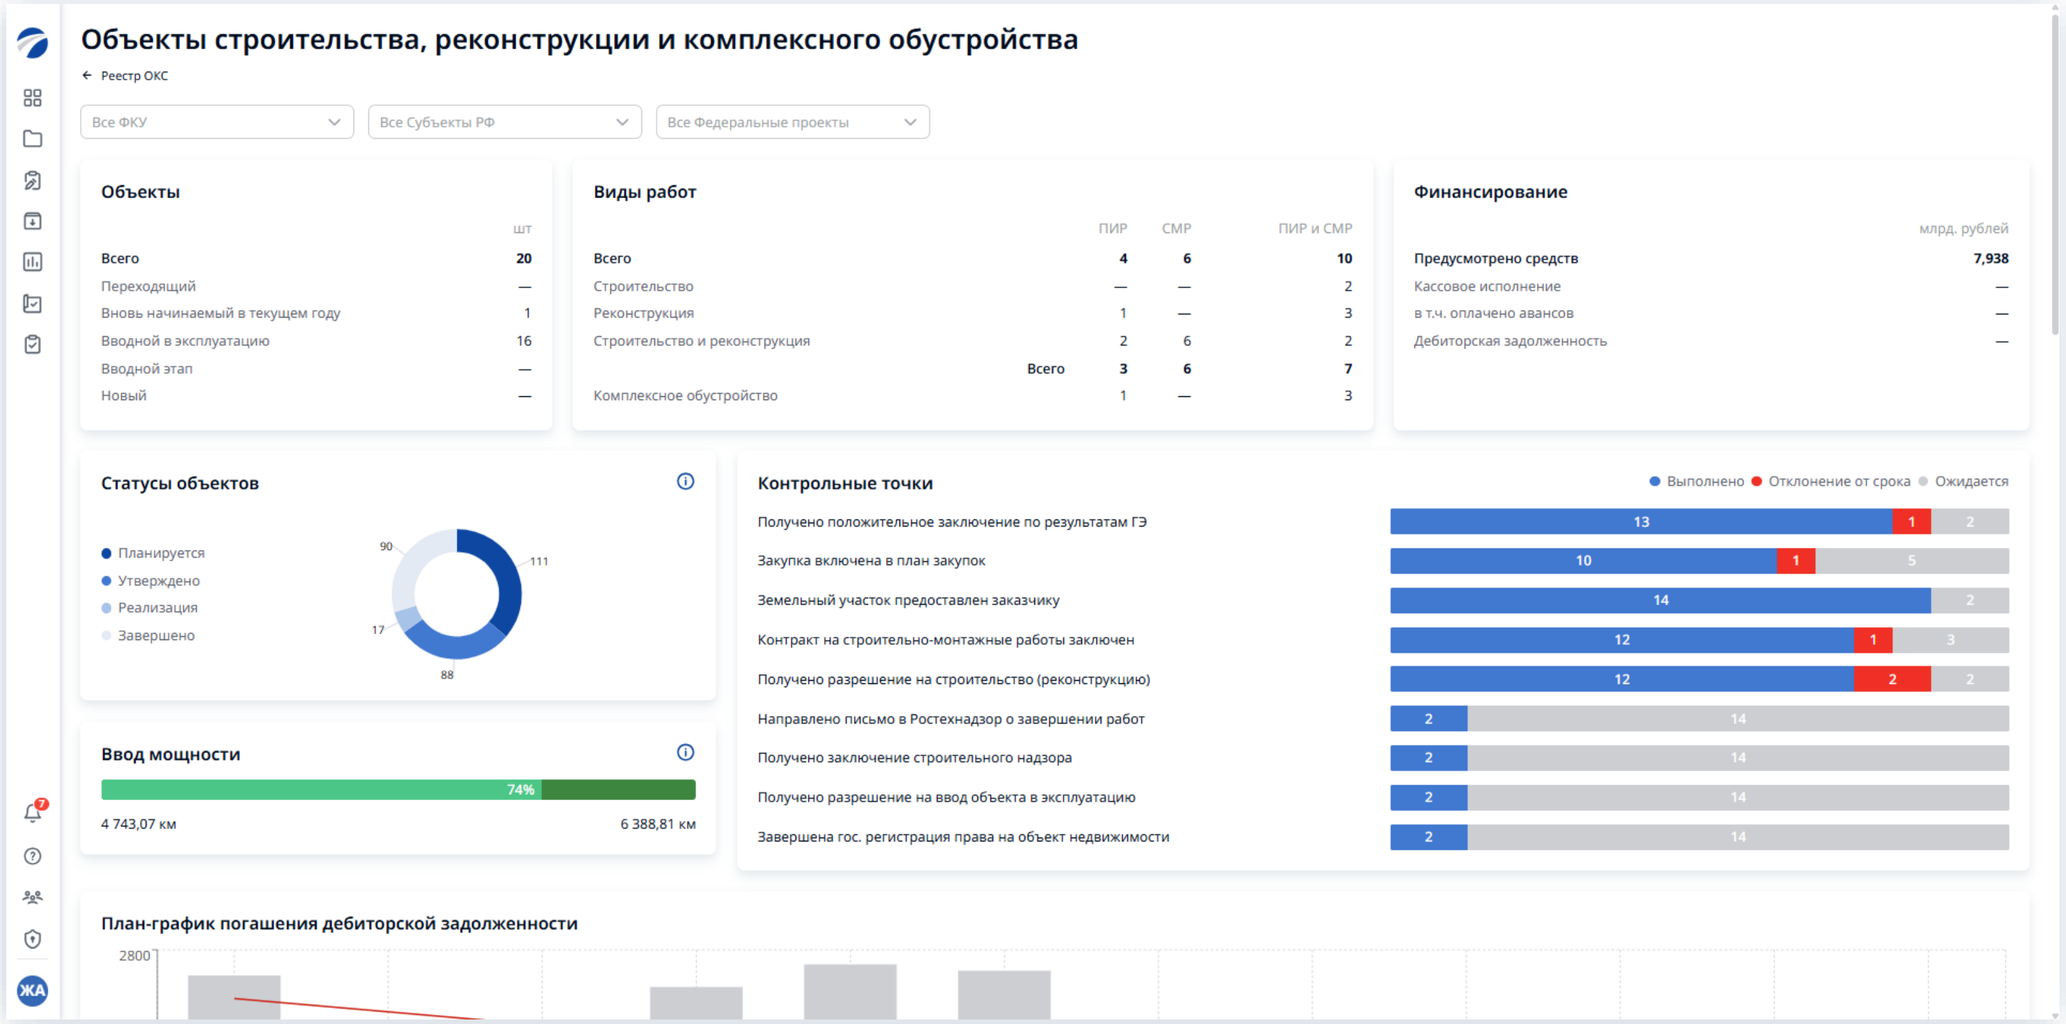

Аналитическая панель ОКС

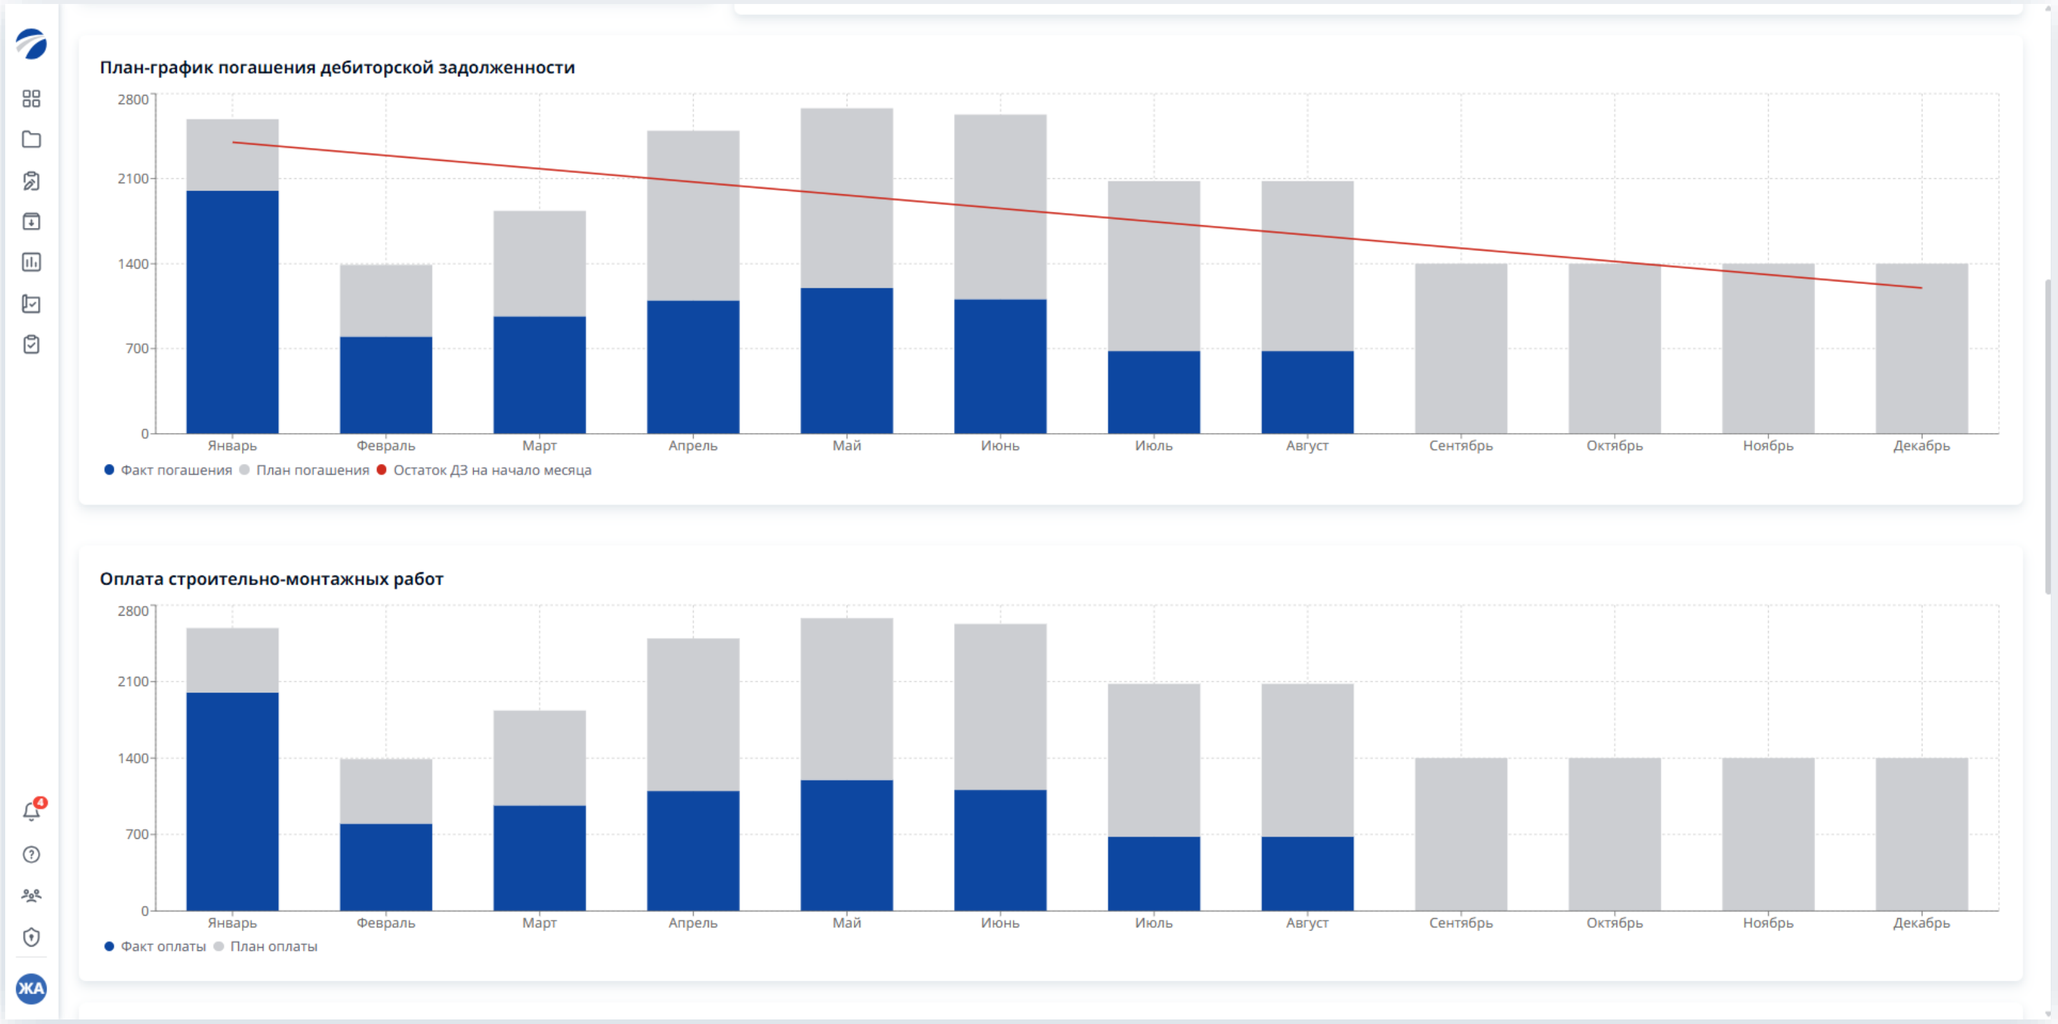

Аналитическая панель ОКС

Исполнение бюджета по ФКУ

ФКУ	Контрактация, млрд. руб.									Кассовое исполнение, млрд. руб.									Дебиторская задолженность, млрд. руб.								
	ПИР		СМР		ПИР+СМР		ВСЕГО			Всего			В текущем году			В текущем месяце			Всего			В текущем году			В текущем месяце		
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Всего по Российской Федерации	135	112	99	80	99	80	47,451	19,094	40	47,451	19,094	40	47,451	19,094	40	47,451	19,094	40	1,260	0,060	5	1,260	0,060	5	1,260	0,060	5
ФКУ УПРДОР "РОССИЯ"	8	7	5	3	5	3	8,120	7,000	87	8,120	7,000	87	8,120	7,000	87	8,120	7,000	87	0,060	0,060	100	0,060	0,060	100	0,060	0,060	100
ФКУ Упрдор Москва-Харьков	5	5	4	3	4	3	4,400	4,000	90	4,400	4,000	90	4,400	4,000	90	4,400	4,000	90									
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"	8	3	5	4	5	4	8,094	6,984	80	8,094	6,984	80	8,094	6,984	80	8,094	6,984	80									
ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"	2	0	2	1	2	1	2,023	0,989	46																		
ФКУ "Поволжуправтодор"	4	4	4	4	4	4	2,890	2,890	100	2,890	2,890	100	2,890	2,890	100	2,890	2,890	100									
ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"	5	5	5	5	5	5	3,777	3,777	100	3,777	3,777	100	3,777	3,777	100	3,777	3,777	100									
ФКУ Упрдор "Тамань"	7	6	7	7	7	7	7,900	6,999	90	7,900	6,999	90	7,900	6,999	90	7,900	6,999	90	1,000		0	1,000		0	1,000		0
ФКУ Упрдор "Черноморье"	4	4	4	4	4	4	3,980	3,980	100	3,980	3,980	100	3,980	3,980	100	3,980	3,980	100									
ФКУ Упрдор "Новороссия"	5	1	3	2	3	2	5,129	1,155	20										0,200		0	0,200		0	0,200		0
ФКУ Упрдор "Кавказ"	7	6	3	2	3	2	8,320	6,980	80	8,320	6,980	80	8,320	6,980	80	8,320	6,980	80									
ФКУ "Уралуправтодор"	7	7	3	3	3	3	6,932	6,932	100	6,932	6,932	100	6,932	6,932	100	6,932	6,932	100									
ФКУ "Сибуправтодор"	6	6	6	6	6	6	5,300	5,300	100	5,300	5,300	100	5,300	5,300	100	5,300	5,300	100									
ФКУ Упрдор "Прибайкалье"	5	5	5	5	5	5	4,900	4,900	100	4,900	4,900	100	4,900	4,900	100	4,900	4,900	100									
ФКУ Упрдор "Вилюй"	3	1	2	1	2	1	2,450	1,210	49										0,150		0	0,150		0	0,150		0
ФКУ ДСД "Дальний Восток"	2	1	2	1	2	1	2,019	1,987	90	2,019	1,987	90	2,019	1,987	90	2,019	1,987	90									

Детализация объектов в плане работ

49 объектов

Оценка эффективности

Статус согласования

10 | 13 | 6 | 29

На подготовке

Задания на проектирование

10 20

Аналитическая панель ОКС

ФКУ Упрдор "Северо-Запад"	8	5	5	4	5	4	8,094	6,984	80	8,094	6,984	80	8,094	6,984	80	8,094	6,984	80					
ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"	2	0	2	1	2	1	2,023	0,989	46														
ФКУ "Поволжуправтодор"	4	4	4	4	4	4	2,890	2,890	100	2,890	2,890	100	2,890	2,890	100	2,890	2,890	100					
ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"	5	5	5	5	5	5	3,777	3,777	100	3,777	3,777	100	3,777	3,777	100	3,777	3,777	100					
ФКУ Упрдор "Тамань"	7	6	7	7	7	7	7,900	6,999	90	7,900	6,999	90	7,900	6,999	90	7,900	6,999	90	1,000	0	1,000	0	1,000	0
ФКУ Упрдор "Черноморье"	4	4	4	4	4	4	3,980	3,980	100	3,980	3,980	100	3,980	3,980	100	3,980	3,980	100					
ФКУ Упрдор "Новороссия"	5	1	3	2	3	2	5,129	1,155	20										0,200	0	0,200	0	0,200	0
ФКУ Упрдор "Кавказ"	7	6	3	2	3	2	8,320	6,980	80	8,320	6,980	80	8,320	6,980	80	8,320	6,980	80					
ФКУ "Уралуправтодор"	7	7	3	3	3	3	6,932	6,932	100	6,932	6,932	100	6,932	6,932	100	6,932	6,932	100					
ФКУ "Сибуправтодор"	6	6	6	6	6	6	5,300	5,300	100	5,300	5,300	100	5,300	5,300	100	5,300	5,300	100					
ФКУ Упрдор "Прибайкалье"	5	5	5	5	5	5	4,900	4,900	100	4,900	4,900	100	4,900	4,900	100	4,900	4,900	100					
ФКУ Упрдор "Вилюй"	3	1	2	1	2	1	2,450	1,210	49										0,150	0	0,150	0	0,150	0
ФКУ ДСД "Дальний Восток"	2	1	2	1	2	1	2,019	1,987	90	2,019	1,987	90	2,019	1,987	90	2,019	1,987	90					

Детализация объектов в плане работ

49 объектов

Готовы к РГ	В работе	Проблемы
7	42	19
из них > 3 млрд. руб.	из них > 3 млрд. руб.	в части ТЗ 9
3	33	в части ОЭ 6
		низкая оценка 4

Оценка эффективности

Статус согласования




- На подготовке
- На доработке (МЭ)
- На рассмотрении (МЭ)

Эффективность



- Получено отрицательное решение
- Решение не получено
- Направлено для получения решения
- Получено положительное решение
- Эффективные

Задания на проектирование



- На подготовке
- На доработке (МС)
- На рассмотрении (МС)
- Согласовано (МС)

Модернизация модуля планирования ФГИС СКДФ в части эксплуатации
(капитальный ремонт, ремонт, содержание)

Реестр объектов капитального ремонта

Реестр объектов Капитальный ремонт СМР Дороги

Поиск по наименованию

Помощь


Капитальный ремонт СМР Дороги

Все ФКУ | Все субъекты | ___-___ | Все статусы


24 объекта | Добавить объект | Экспорт

Наименование	Организация	Субъект	Сроки реализации	Статус	Стоимость работ, тыс. ₽	Мощность, км	Мощность, пог.м	Номер СКДФ
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-151 Цивильск-Ульяновск на участке км 191+000 - км 199+000	ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"	Ульяновская область	2022-2026	На рассмотрении	15 320,975	8	нет данных	310470014
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 "Автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 261+250 - км 317+800 (с устройством четырех полос движения), Саратовская область (I этап - автомобильная дорога)	ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"	Саратовская область	2022-2026	На согласовании Росавтодор	91 030,669	16.8	нет данных	310469743
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 "Автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 299+250 - км 317+800	ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"	Саратовская область	2022-2026	На рассмотрении	91 030,669	16.8	нет данных	310469969
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной на участке км 108+000 - км 177+292	ФКУ Упрдор Москва-Харьков	Тульская область	2022-2026	Утверждён	305 294,016	7.054	нет данных	310469917
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза на участке км 147+500 - км 157+000	ФКУ "Поволжуправтодор"	Пензенская область	2022-2026	Черновик	6 384,381	9.523	нет данных	310469954
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 121+000 - км 140+000 (с устройством четырех полос движения)	ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"	Саратовская область	2022-2026	Черновик	211,532	18.774	нет данных	310469760
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск,	ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"	Ульяновская область	2022-2027	Черновик	нет данных	5	нет данных	310469737

Создание объекта капитального ремонта

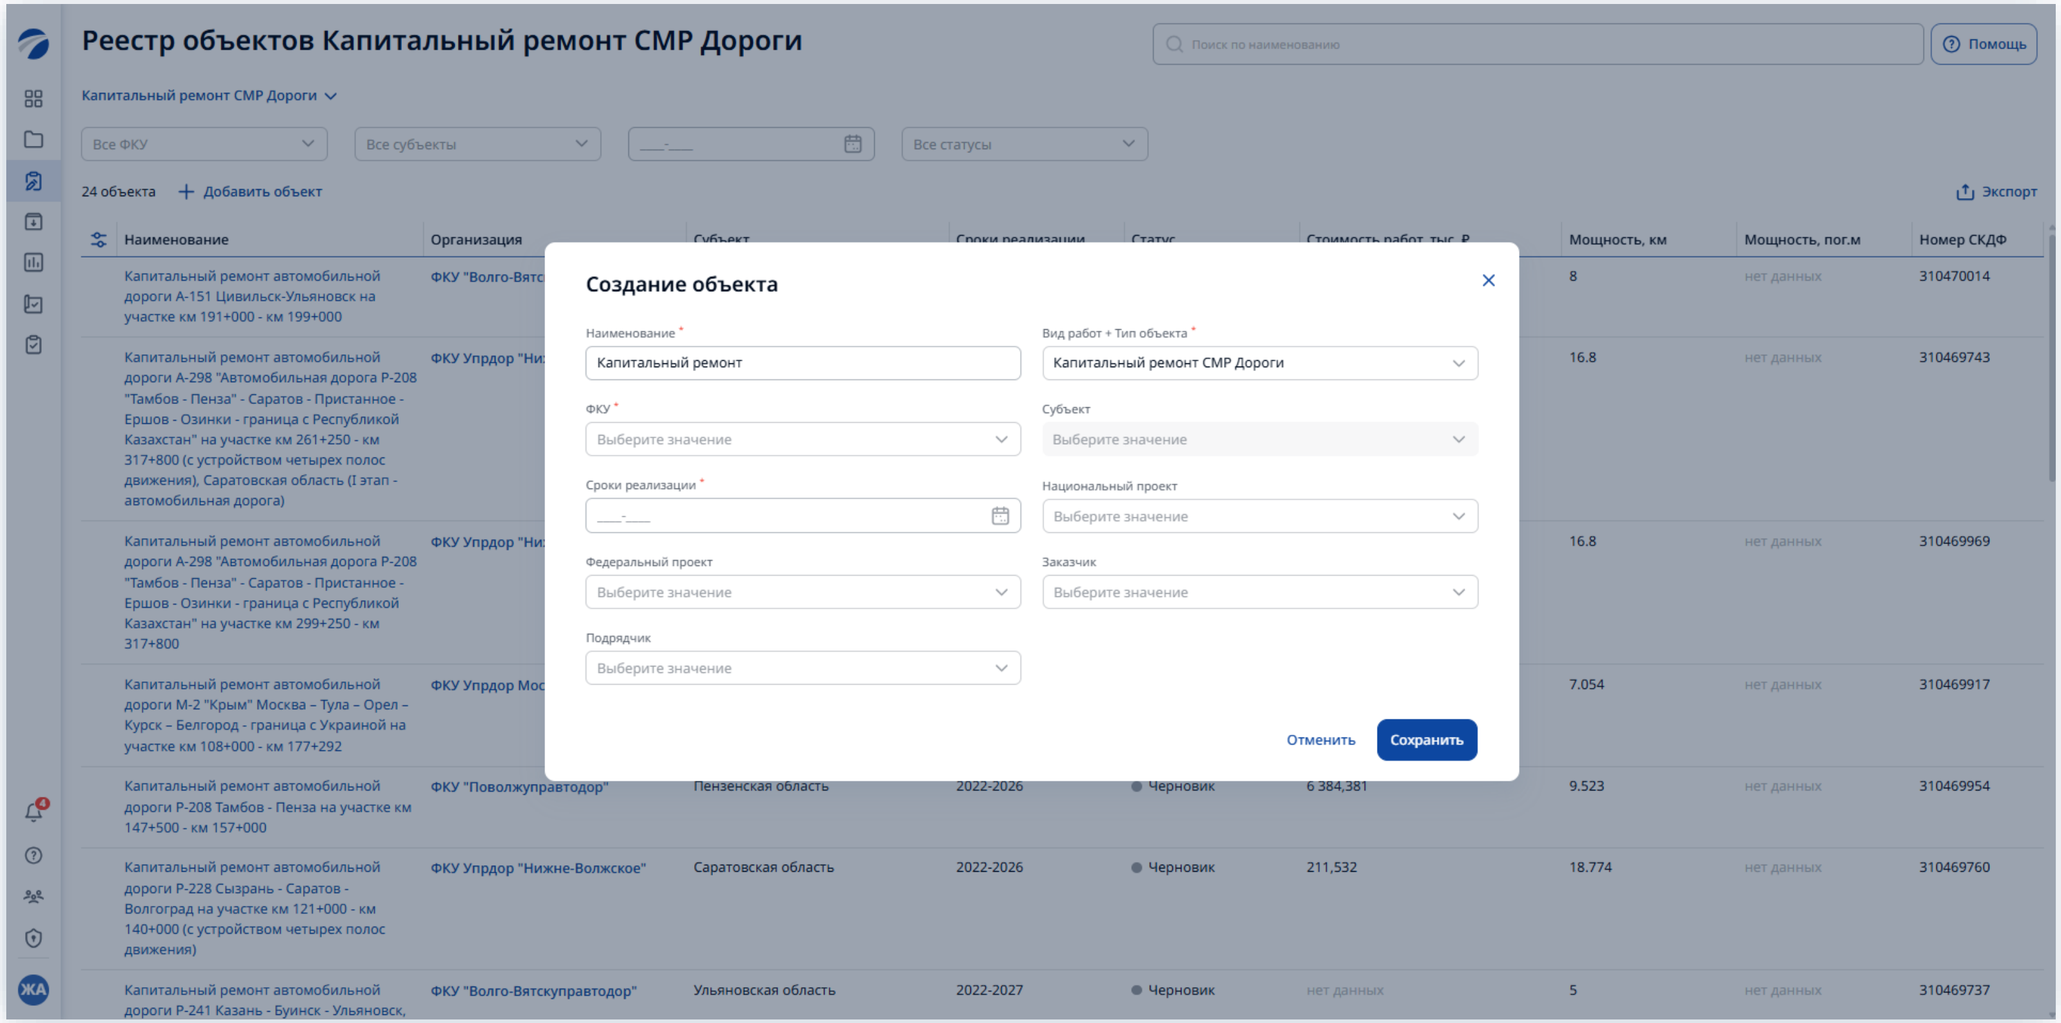


Карточка объекта капитального ремонта

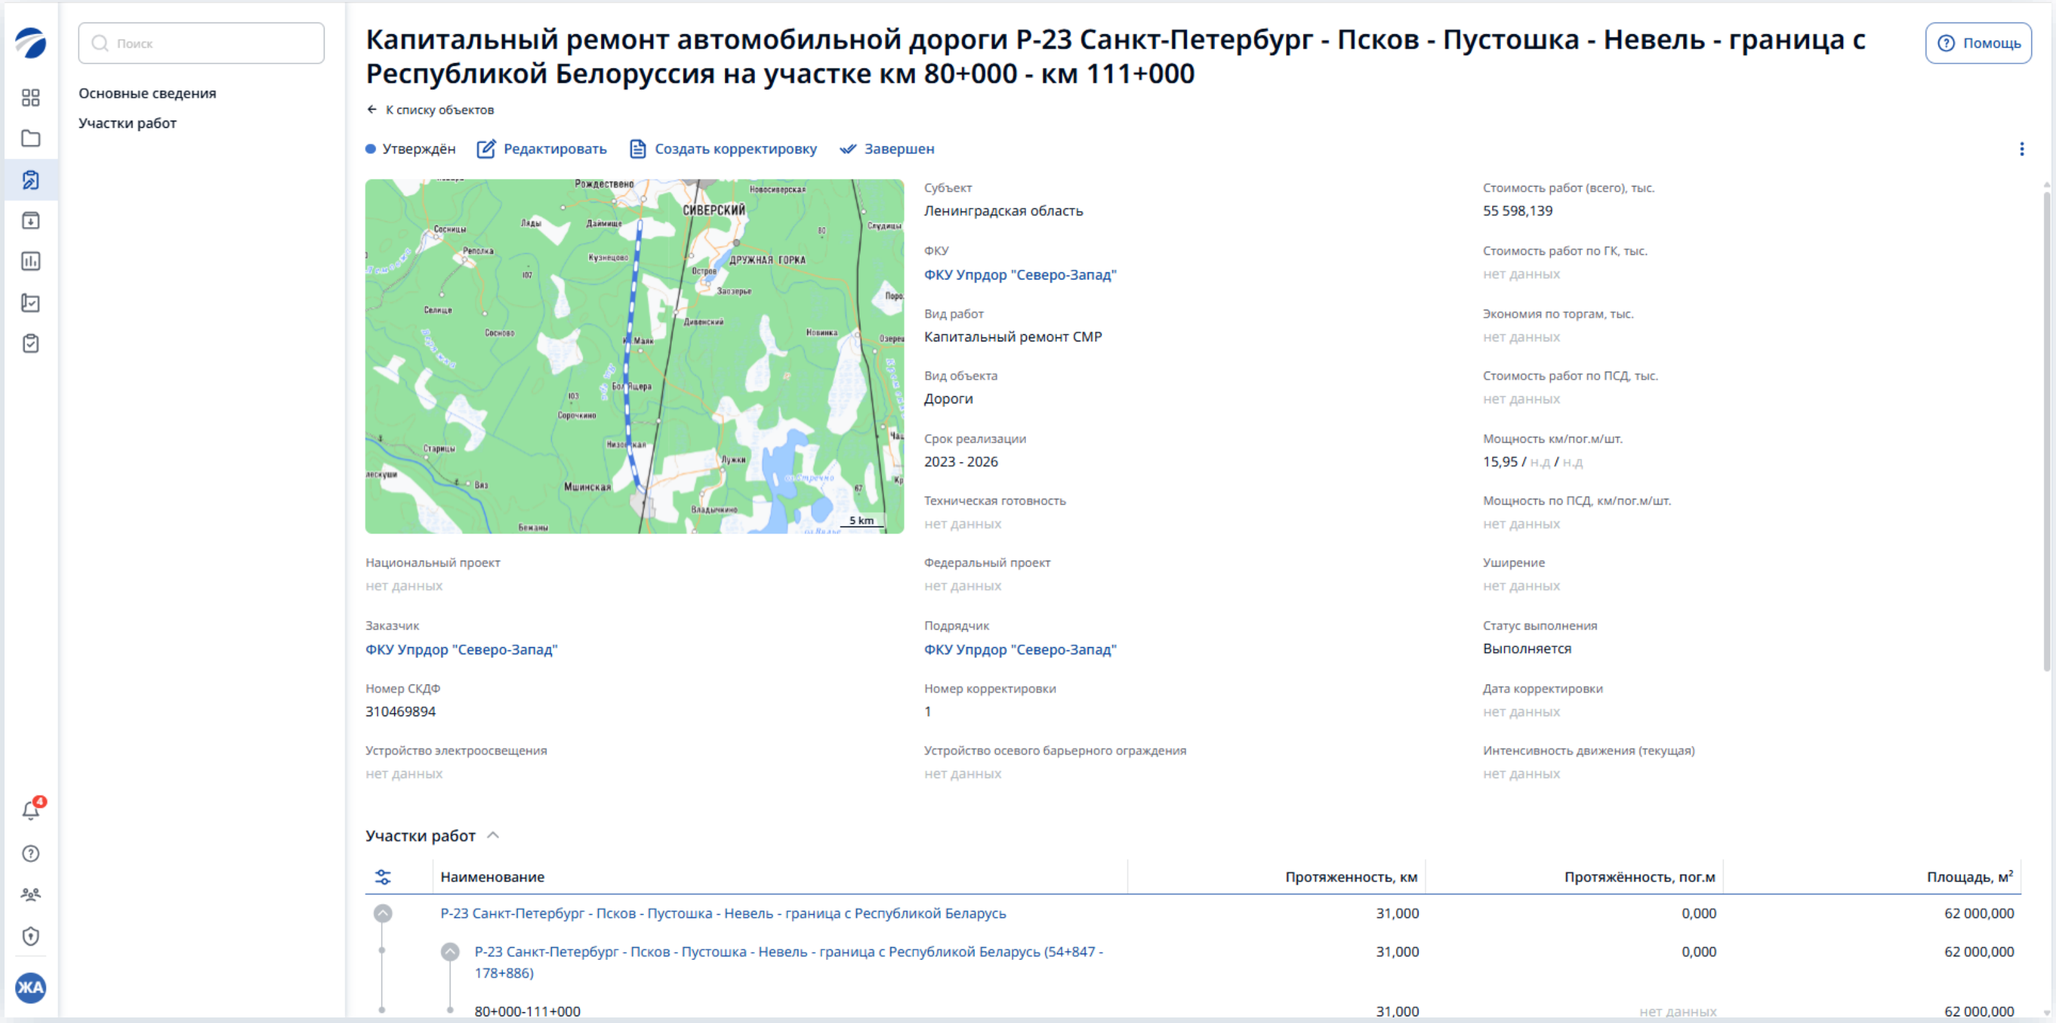

Раздел «Планирование» карточки




Раздел «Планирование» карточки

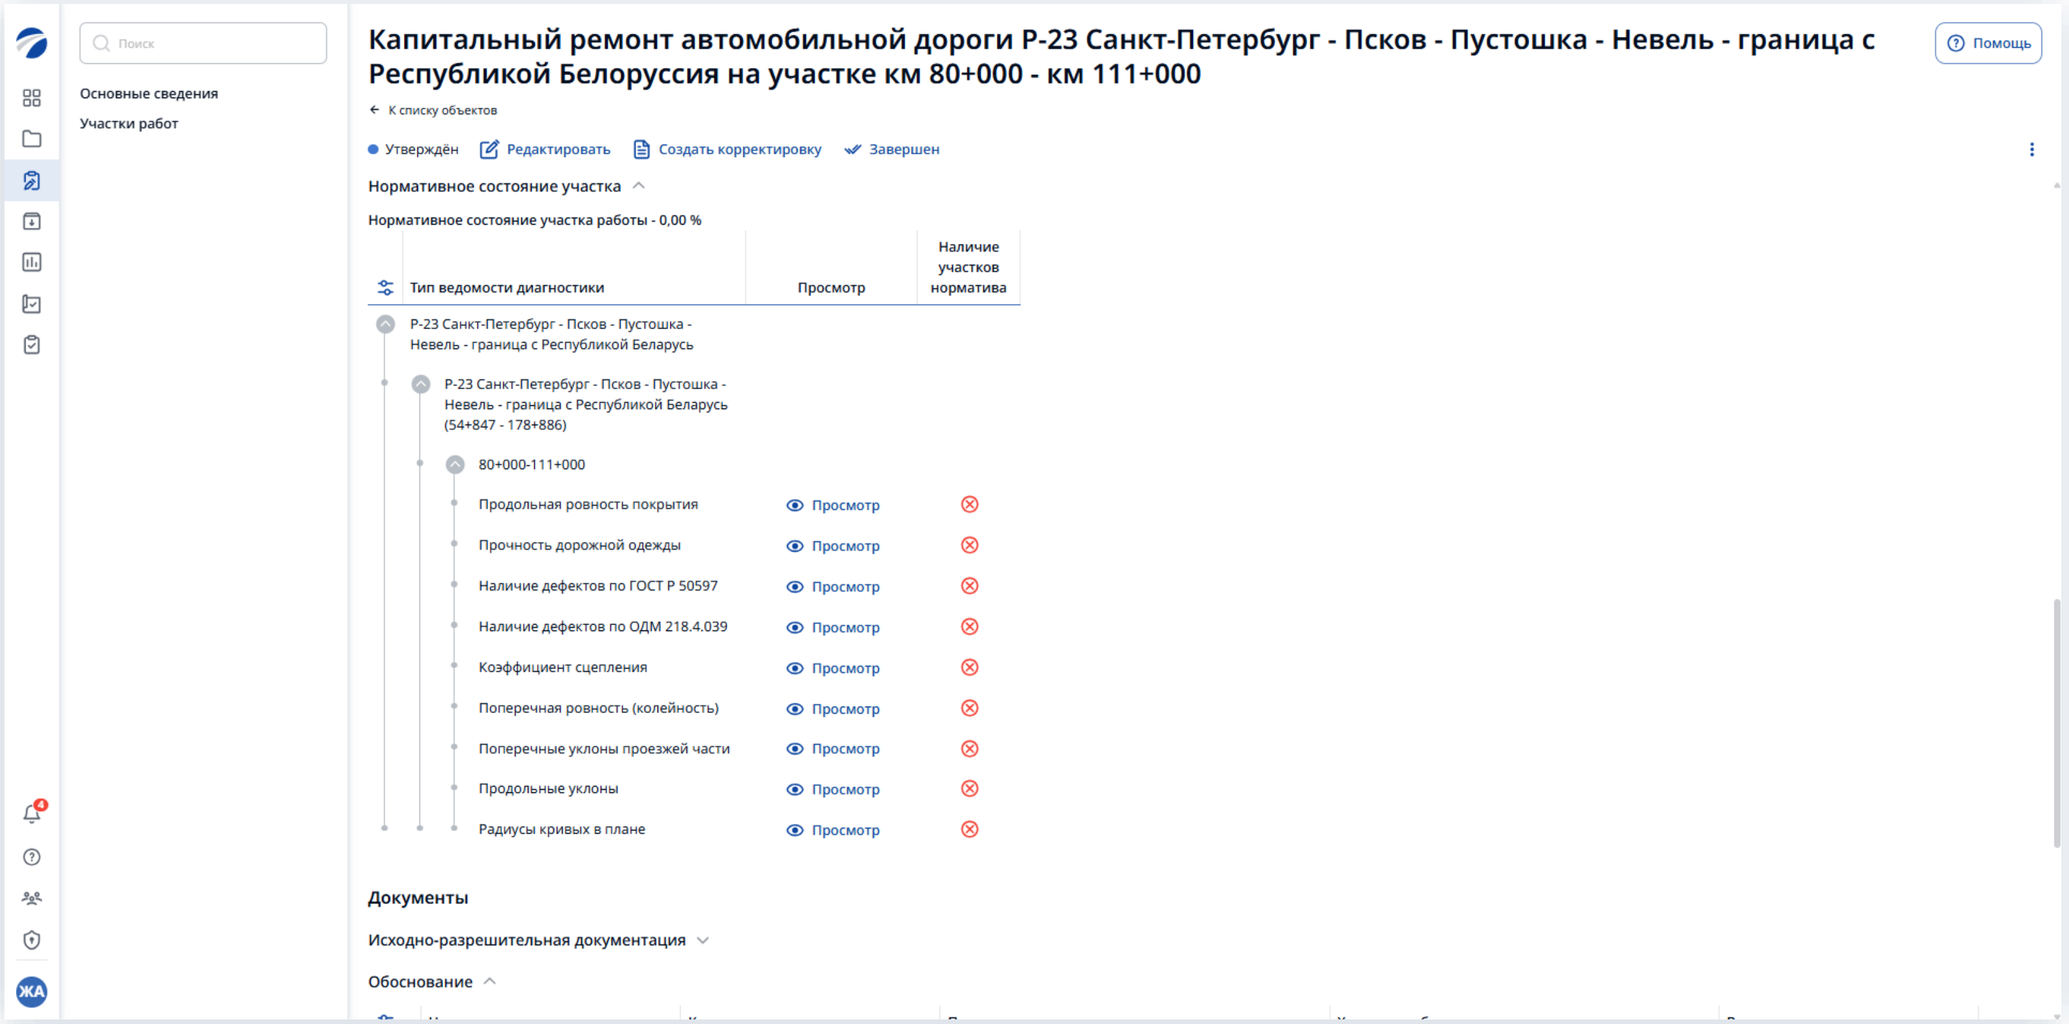


Раздел «Планирование» карточки




Раздел «Объемы работ» карточки

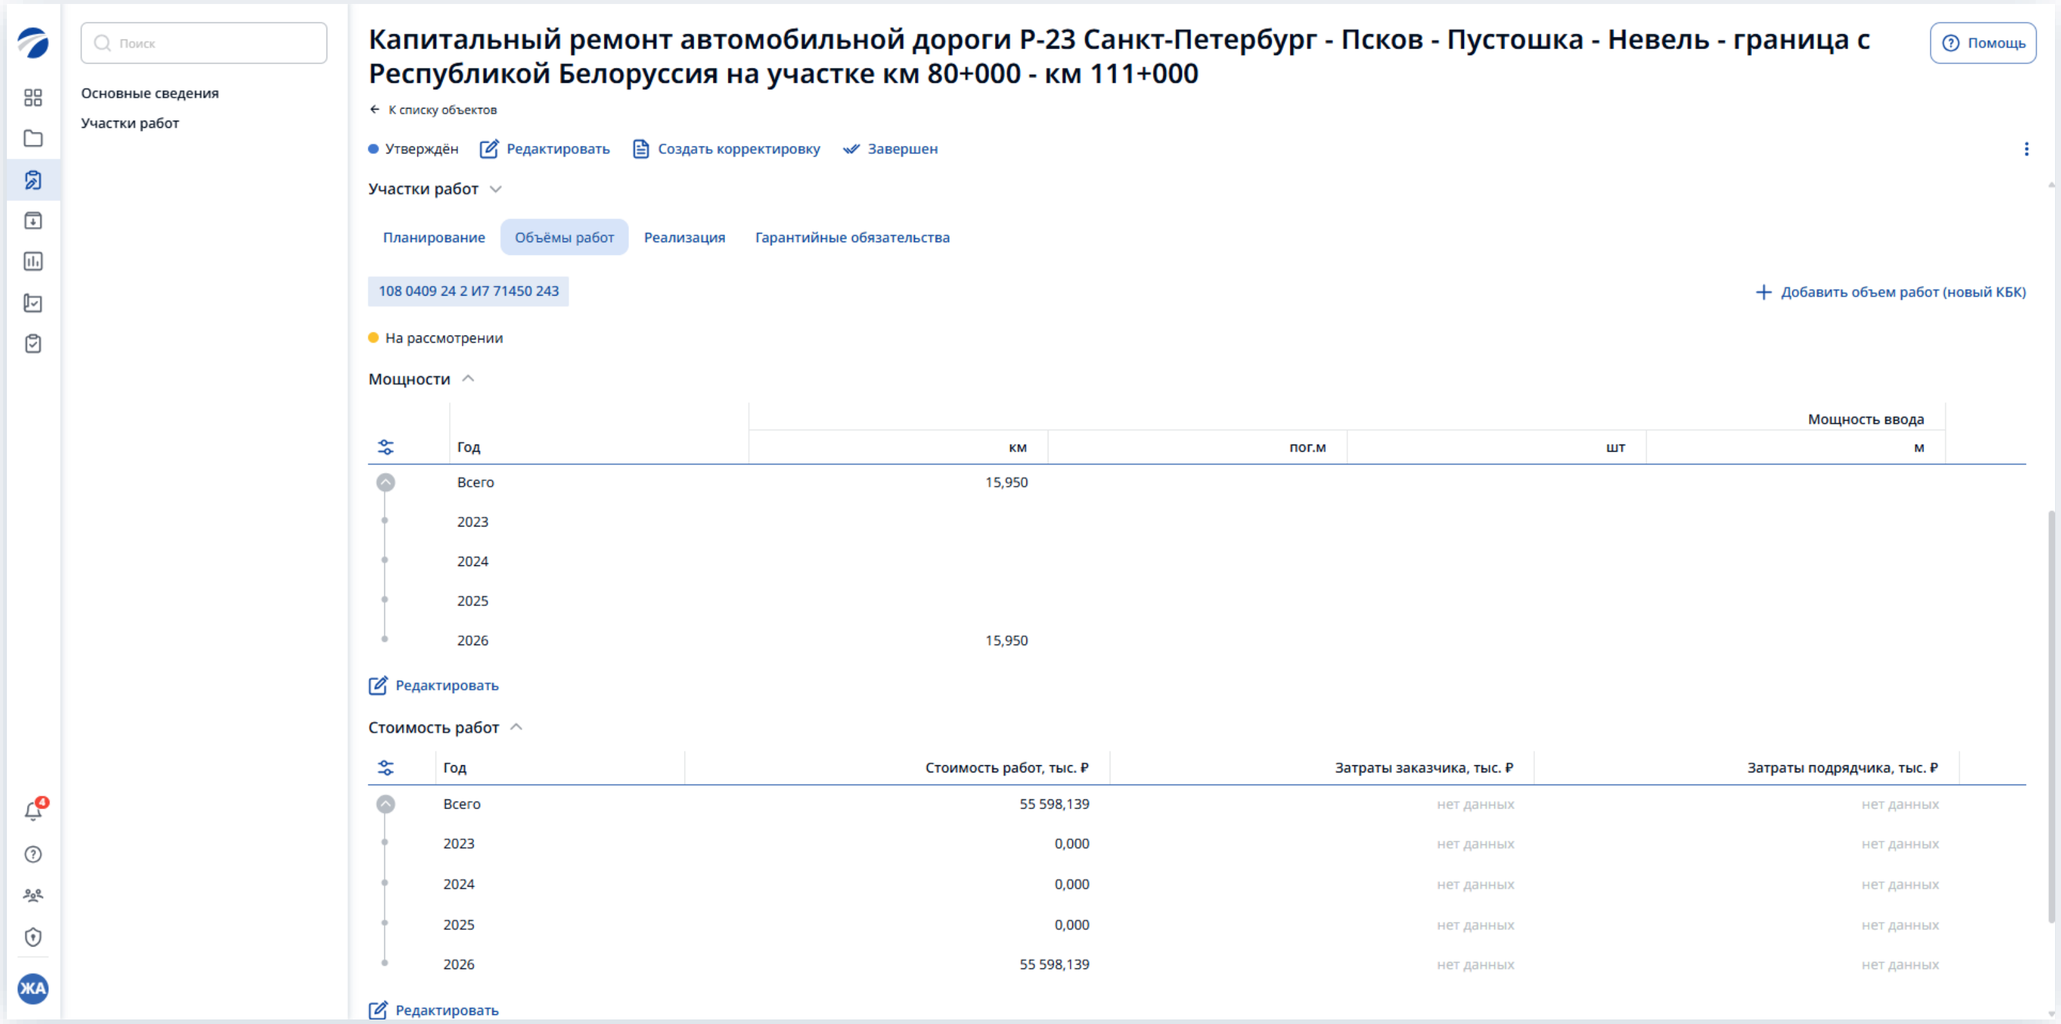

Раздел «Объемы работ» карточки

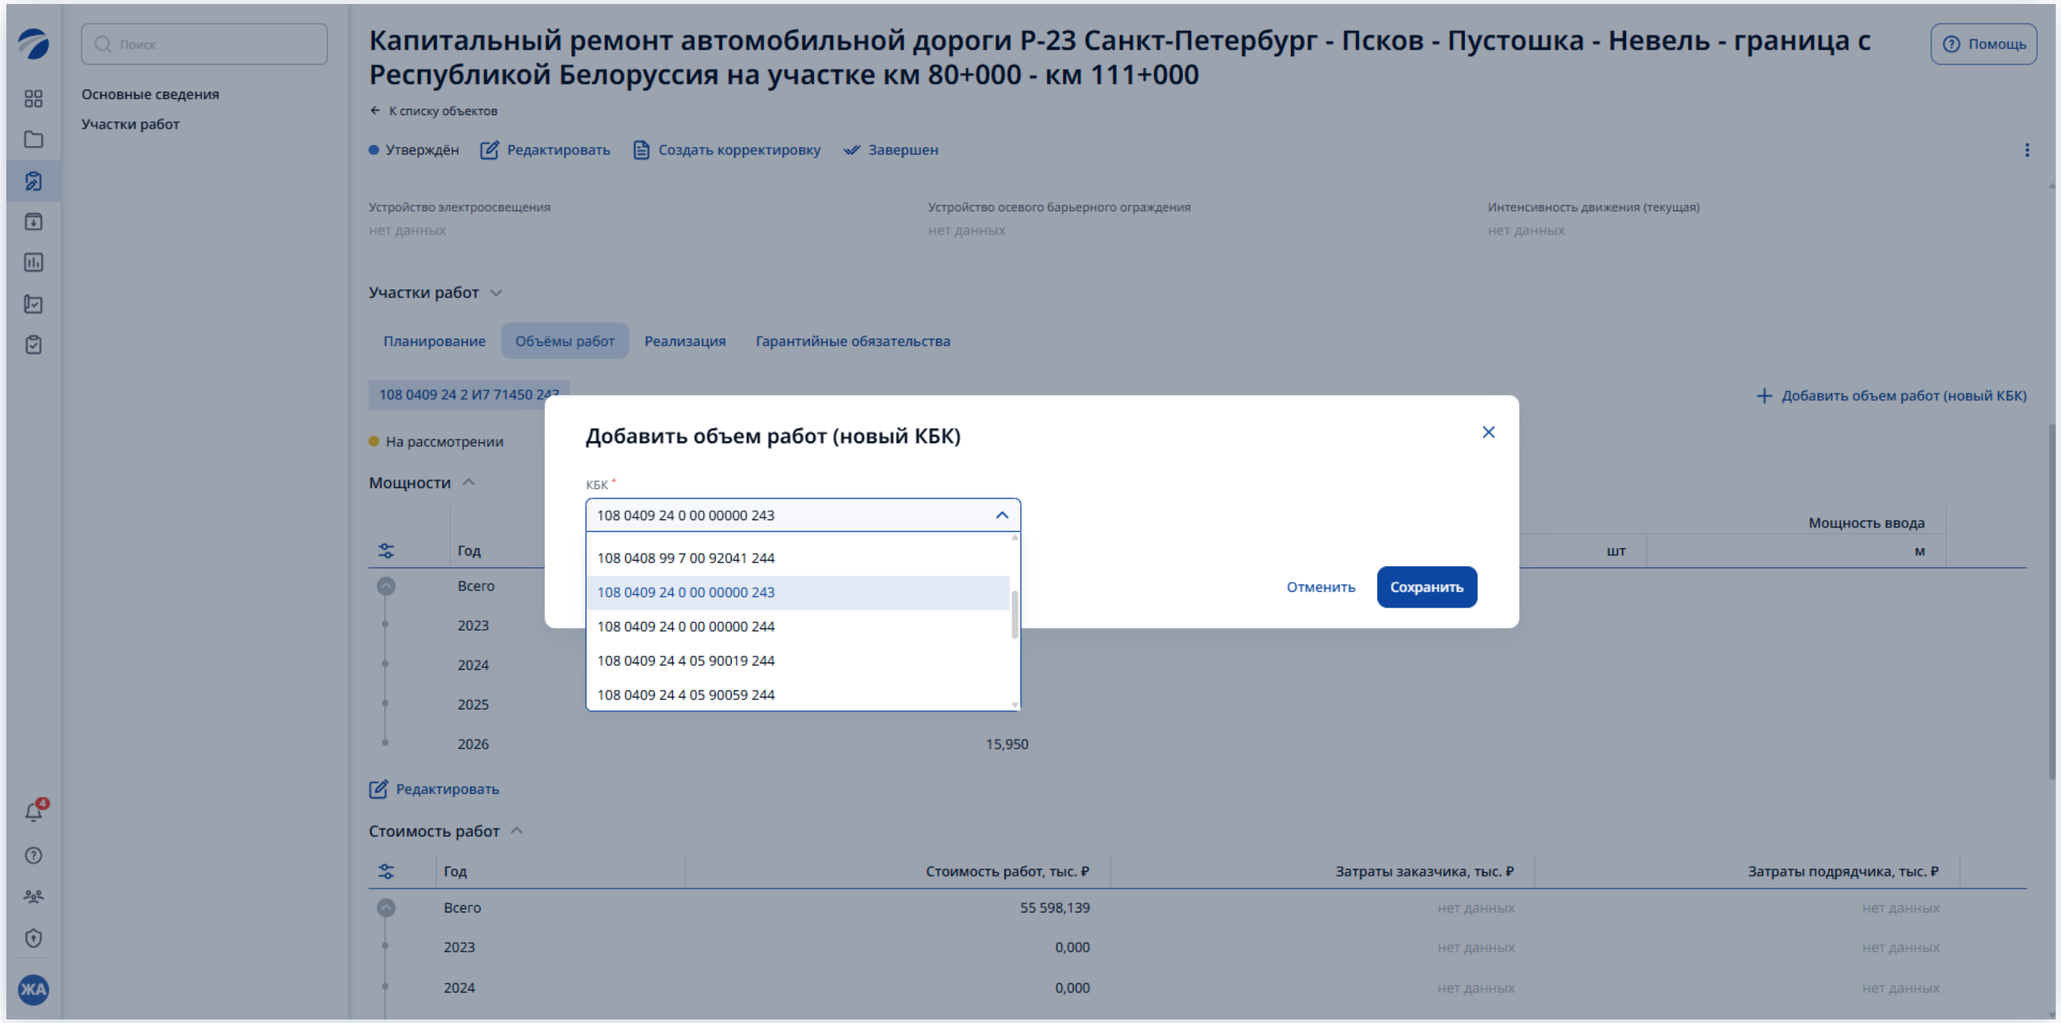


Раздел «Объемы работ» карточки

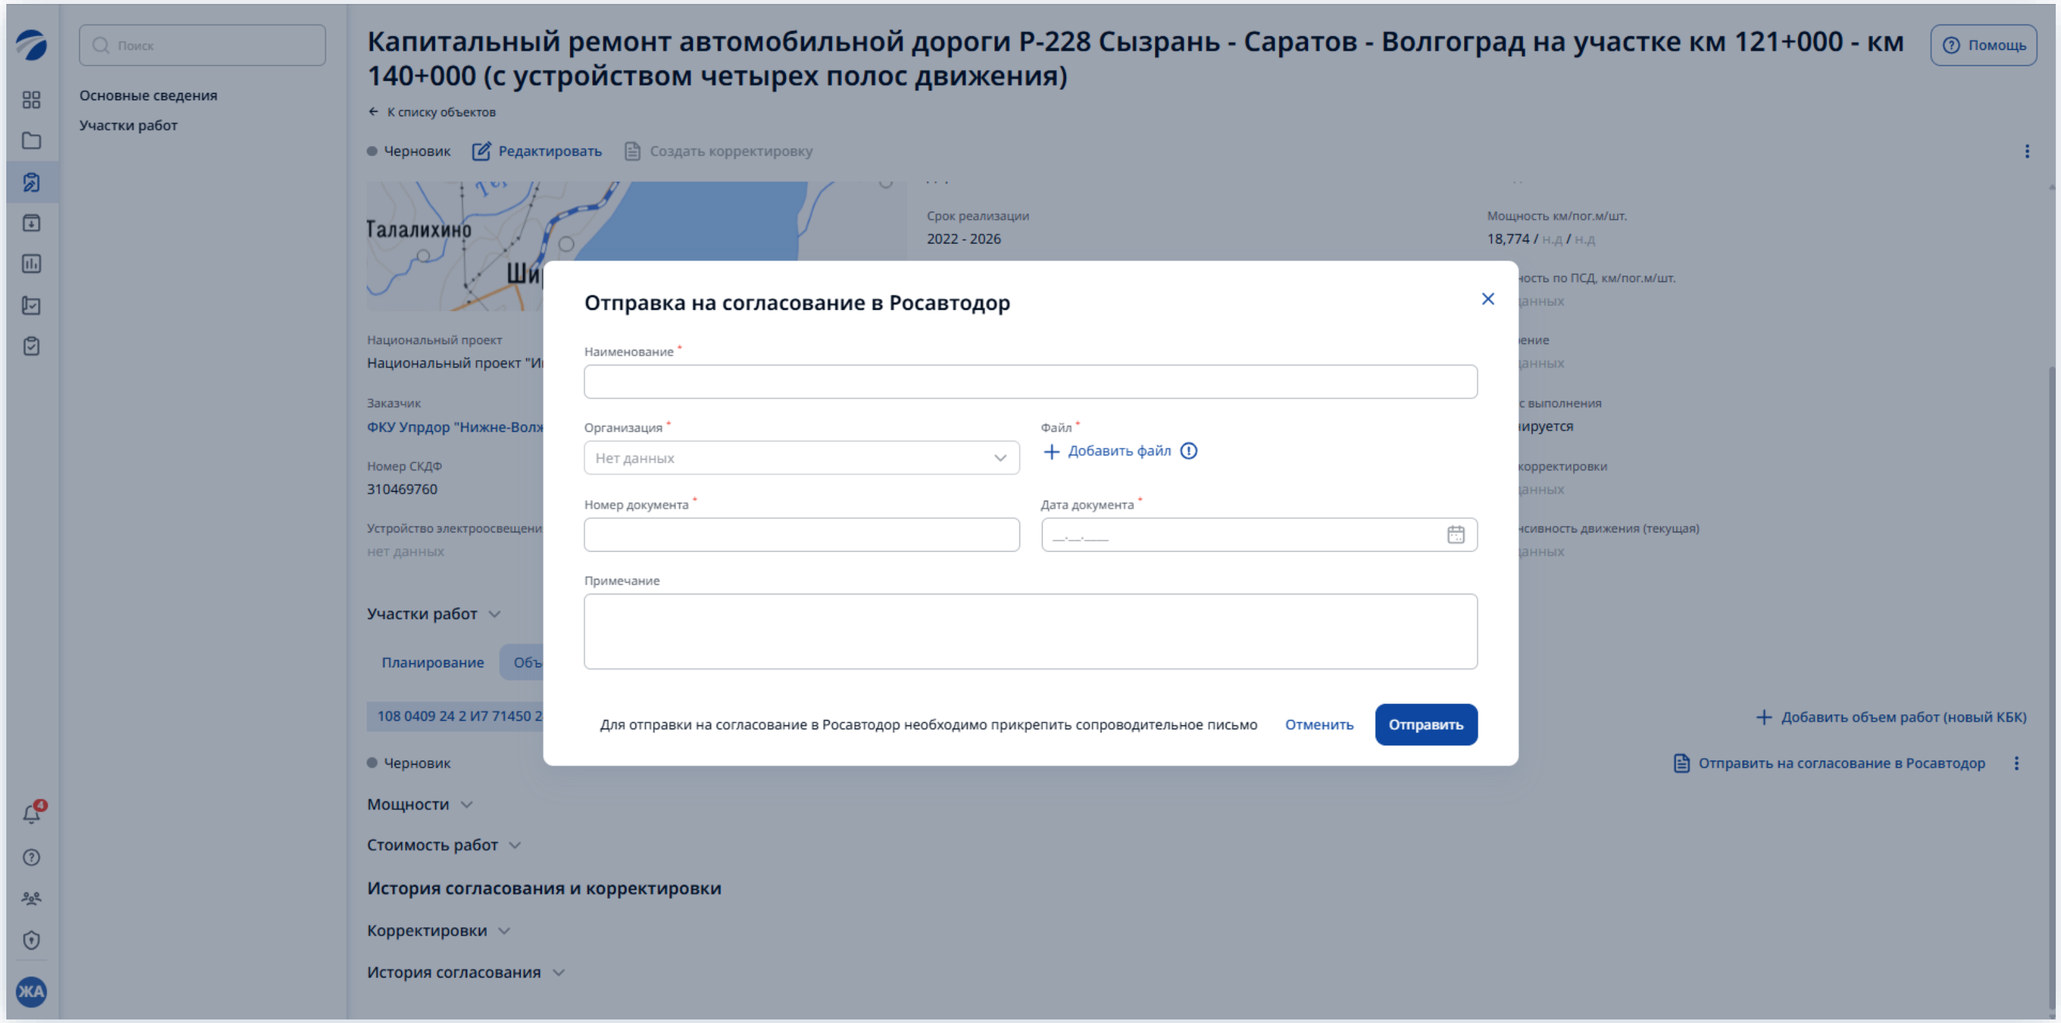


Раздел «Реализация» карточки




Раздел «Реализация» карточки

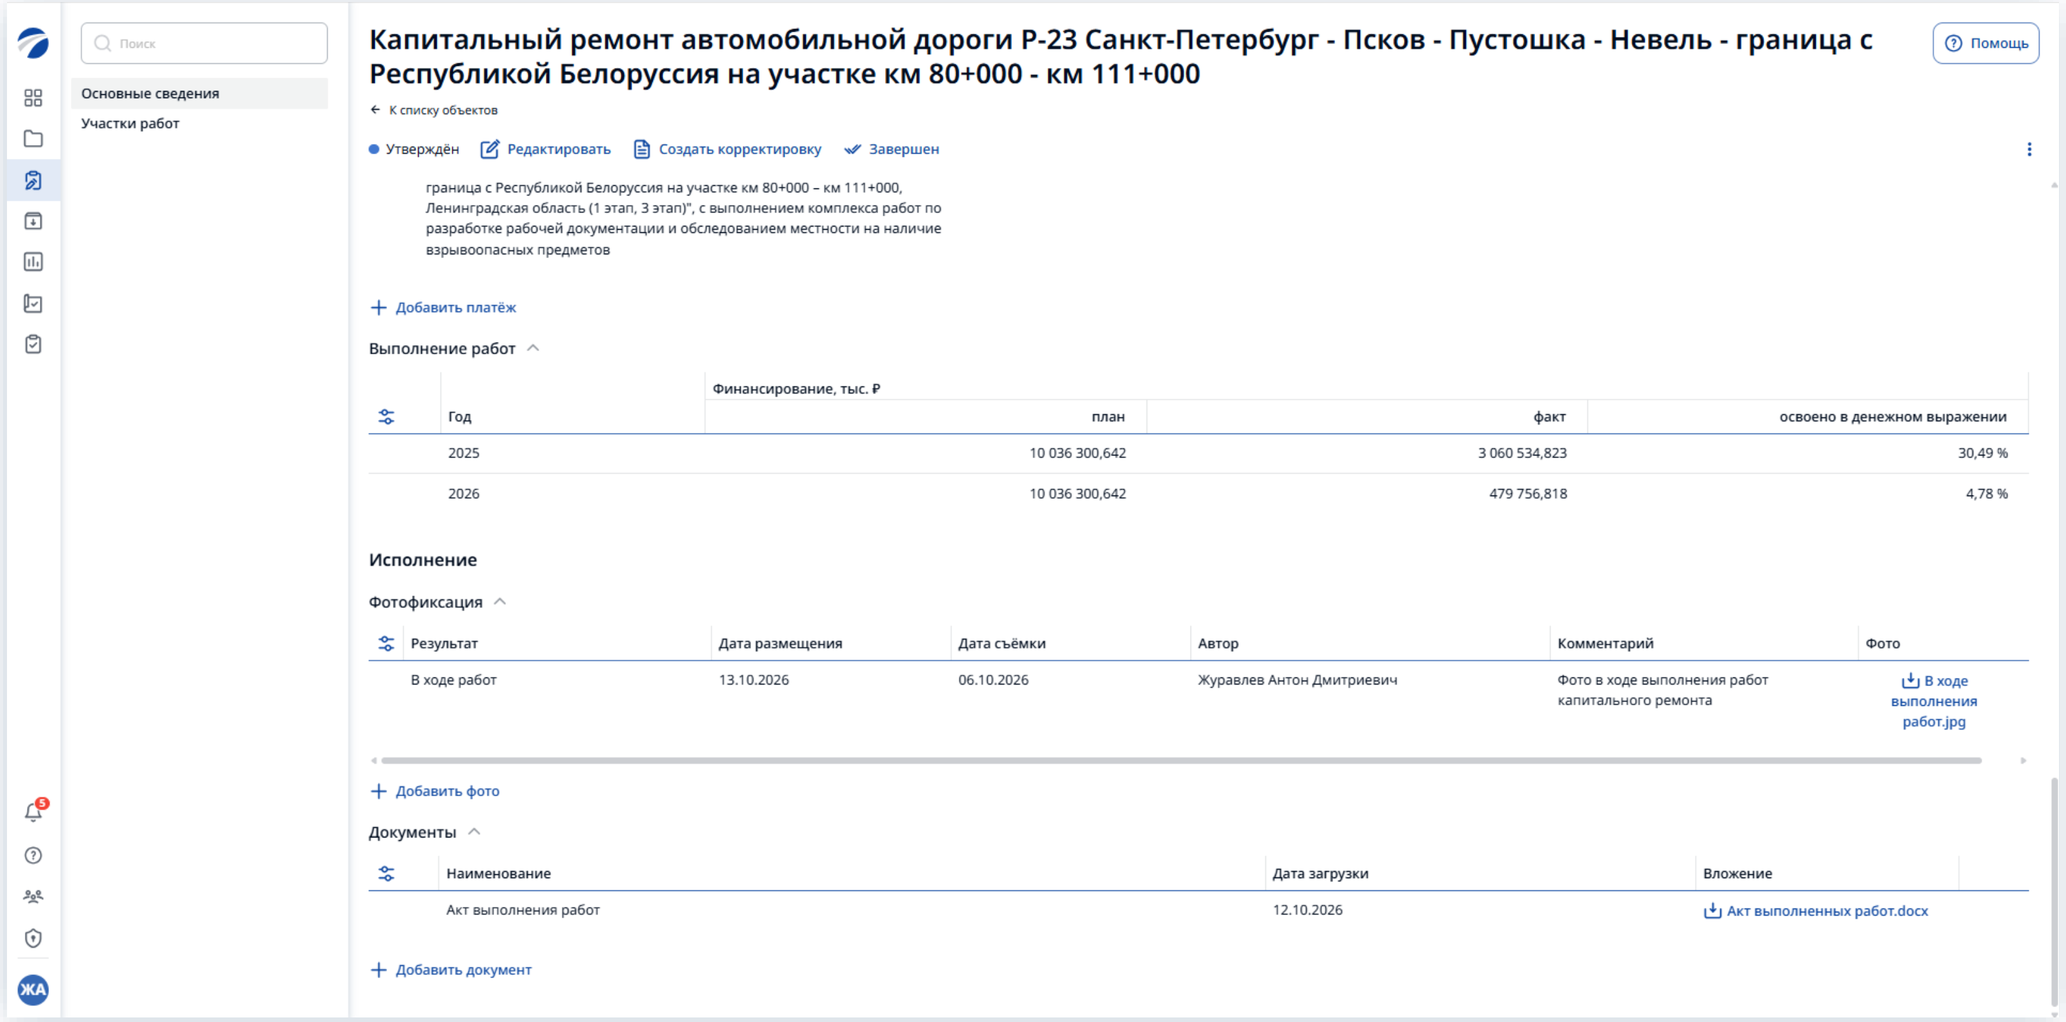

Раздел «Гарантийные обязательства» карточки

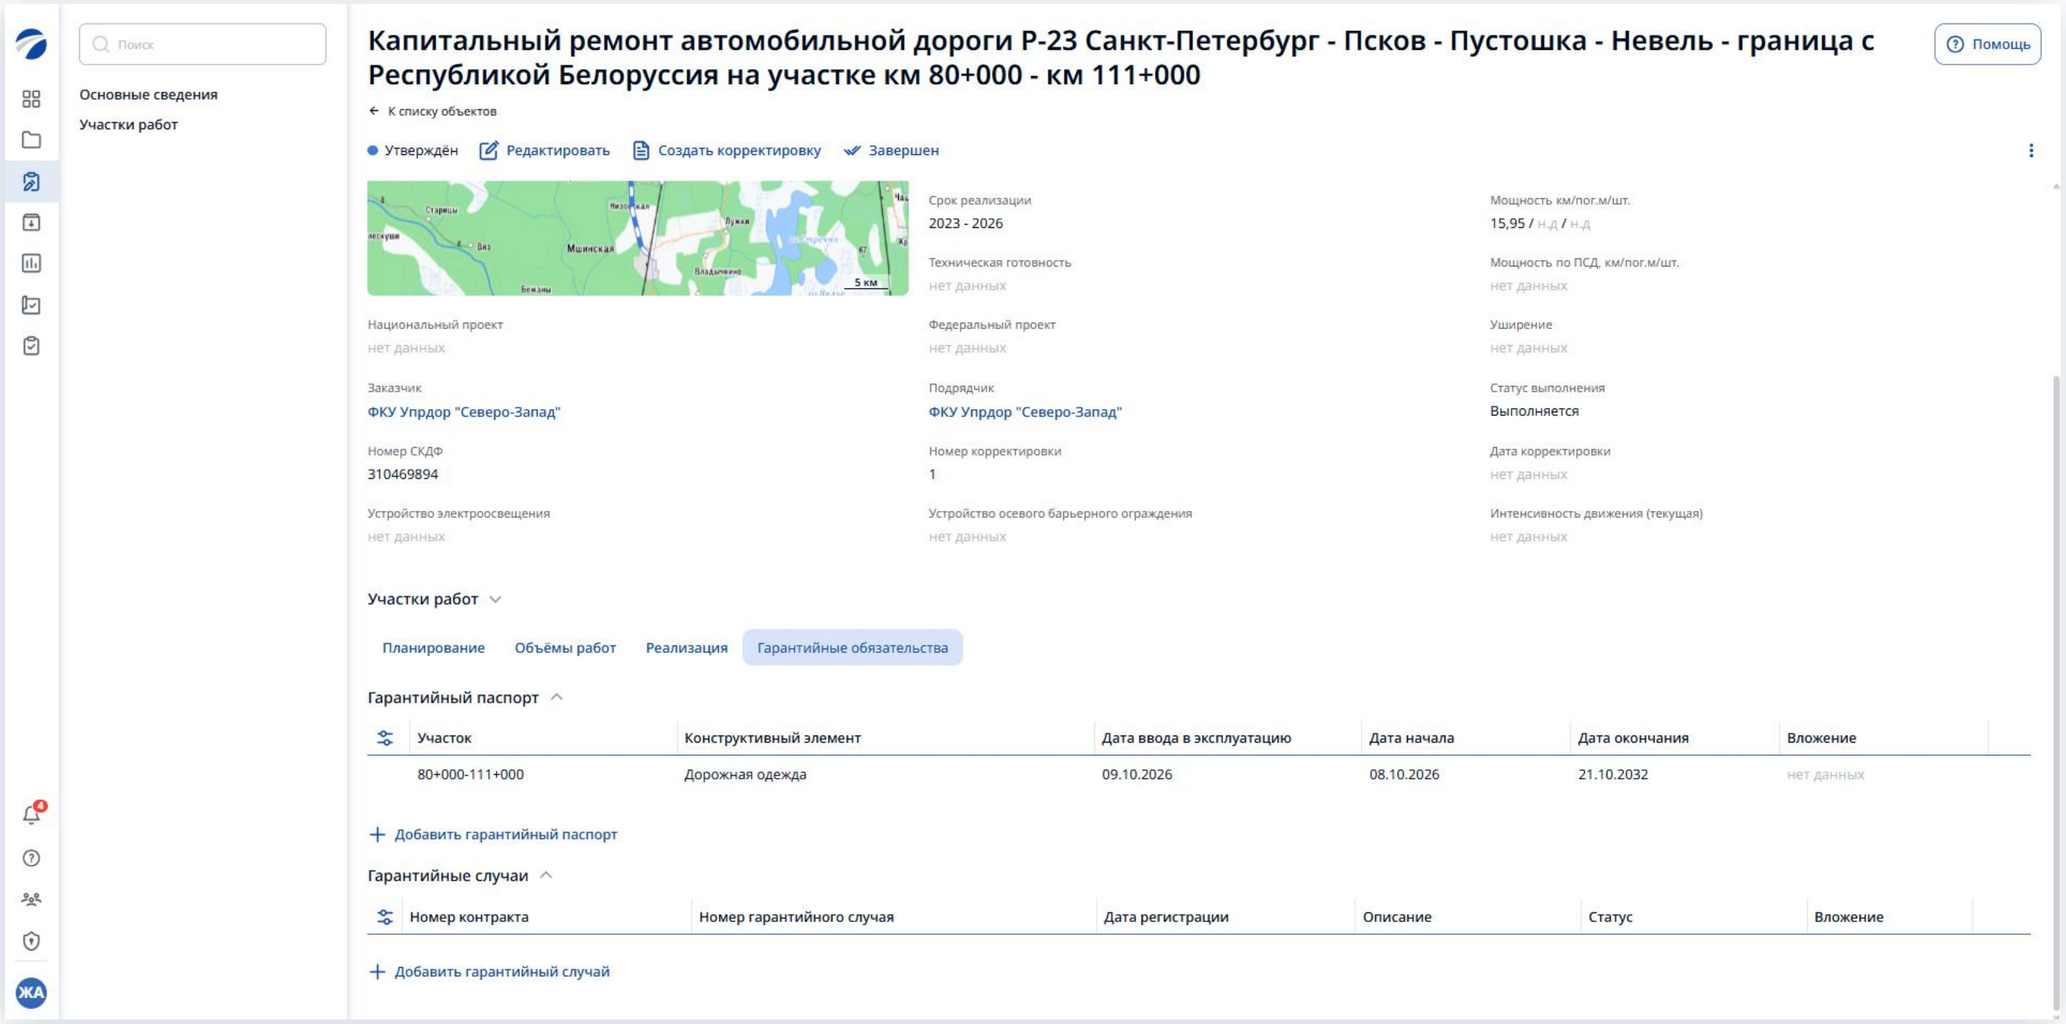

Реестр программ (Росавтодор)

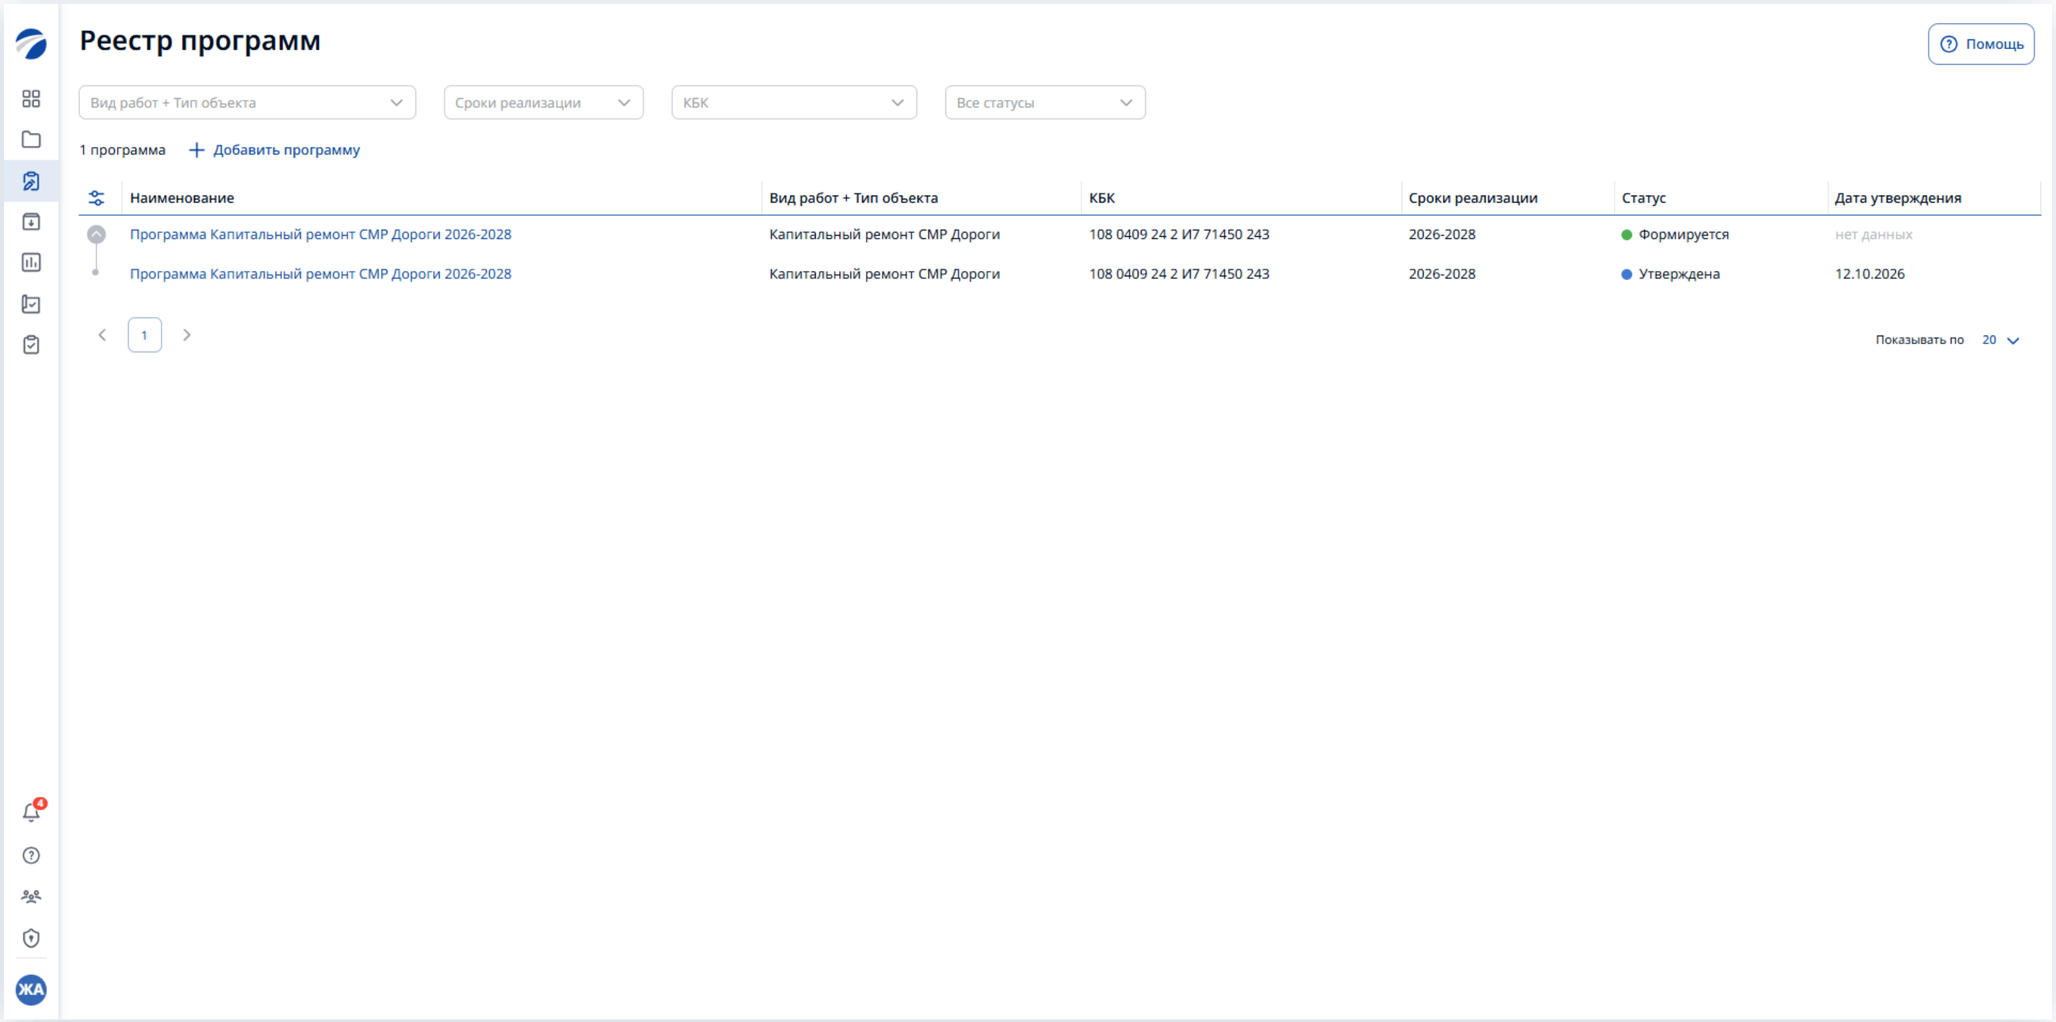

Карточка программы (Предложения ФКУ)

Программа Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

Реестр программ > Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

КБК 108 0409 24 2 И7 71450 243 ● Формируется


Предложения ФКУ | На рассмотрении

Выбрано: 3 объекта ✕ Сбросить

✓ Принять к рассмотрению + Добавить объект


Наименование	Сроки работ	Уточнённый бюджет								
		Профинансировано ранее	Объём работ всего		Объём работ 2026 г.		Объём работ 2027 г.		Объём работ 2028 г.	
		тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽
ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"		0,000	16,800	91 030,669	16,800	91 030,669	0,000	0,000	0,000	0,000
Саратовская область		0,000	16,800	91 030,669	16,800	91 030,669	0,000	0,000	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 "Автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 261+250 - км 317+800 (с устройством четырех полос движения), Саратовская область (I этап - автомобильная дорога)	2022-2026	0,000	16,800	91 030,669	16,800	91 030,669	0,000	0,000	0,000	0,000
ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"		0,000	9,428	1 368 461,559	0,000	895 321,659	9,428	473 139,900	0,000	0,000
Ульяновская область		0,000	6,418	507 920,689	0,000	384 282,689	6,418	123 638,000	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самара на участке км 208+240 - км 214+650	2022-2027	0,000	6,418	507 920,689	0,000	384 282,689	6,418	123 638,000	0,000	0,000
Республика Марий Эл		0,000	3,010	860 540,870	0,000	511 038,970	3,010	349 501,900	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке км 92+360 - км 95+566	2025-2027	0,000	3,010	860 540,870	0,000	511 038,970	3,010	349 501,900	0,000	0,000
ФКУ Упрдор "Черноморье"		0,000	3,128	3 764 846,539	0,000	500 000,000	3,128	3 264 846,539	0,000	0,000
Республика Адыгея		0,000	3,128	3 764 846,539	0,000	500 000,000	3,128	3 264 846,539	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск (направление Бжедугхабль - Адыгейск) на участке км 0+044 - км 3+178	2026-2027	0,000	3,128	3 764 846,539	0,000	500 000,000	3,128	3 264 846,539	0,000	0,000

Карточка программы (Предложения ФКУ)

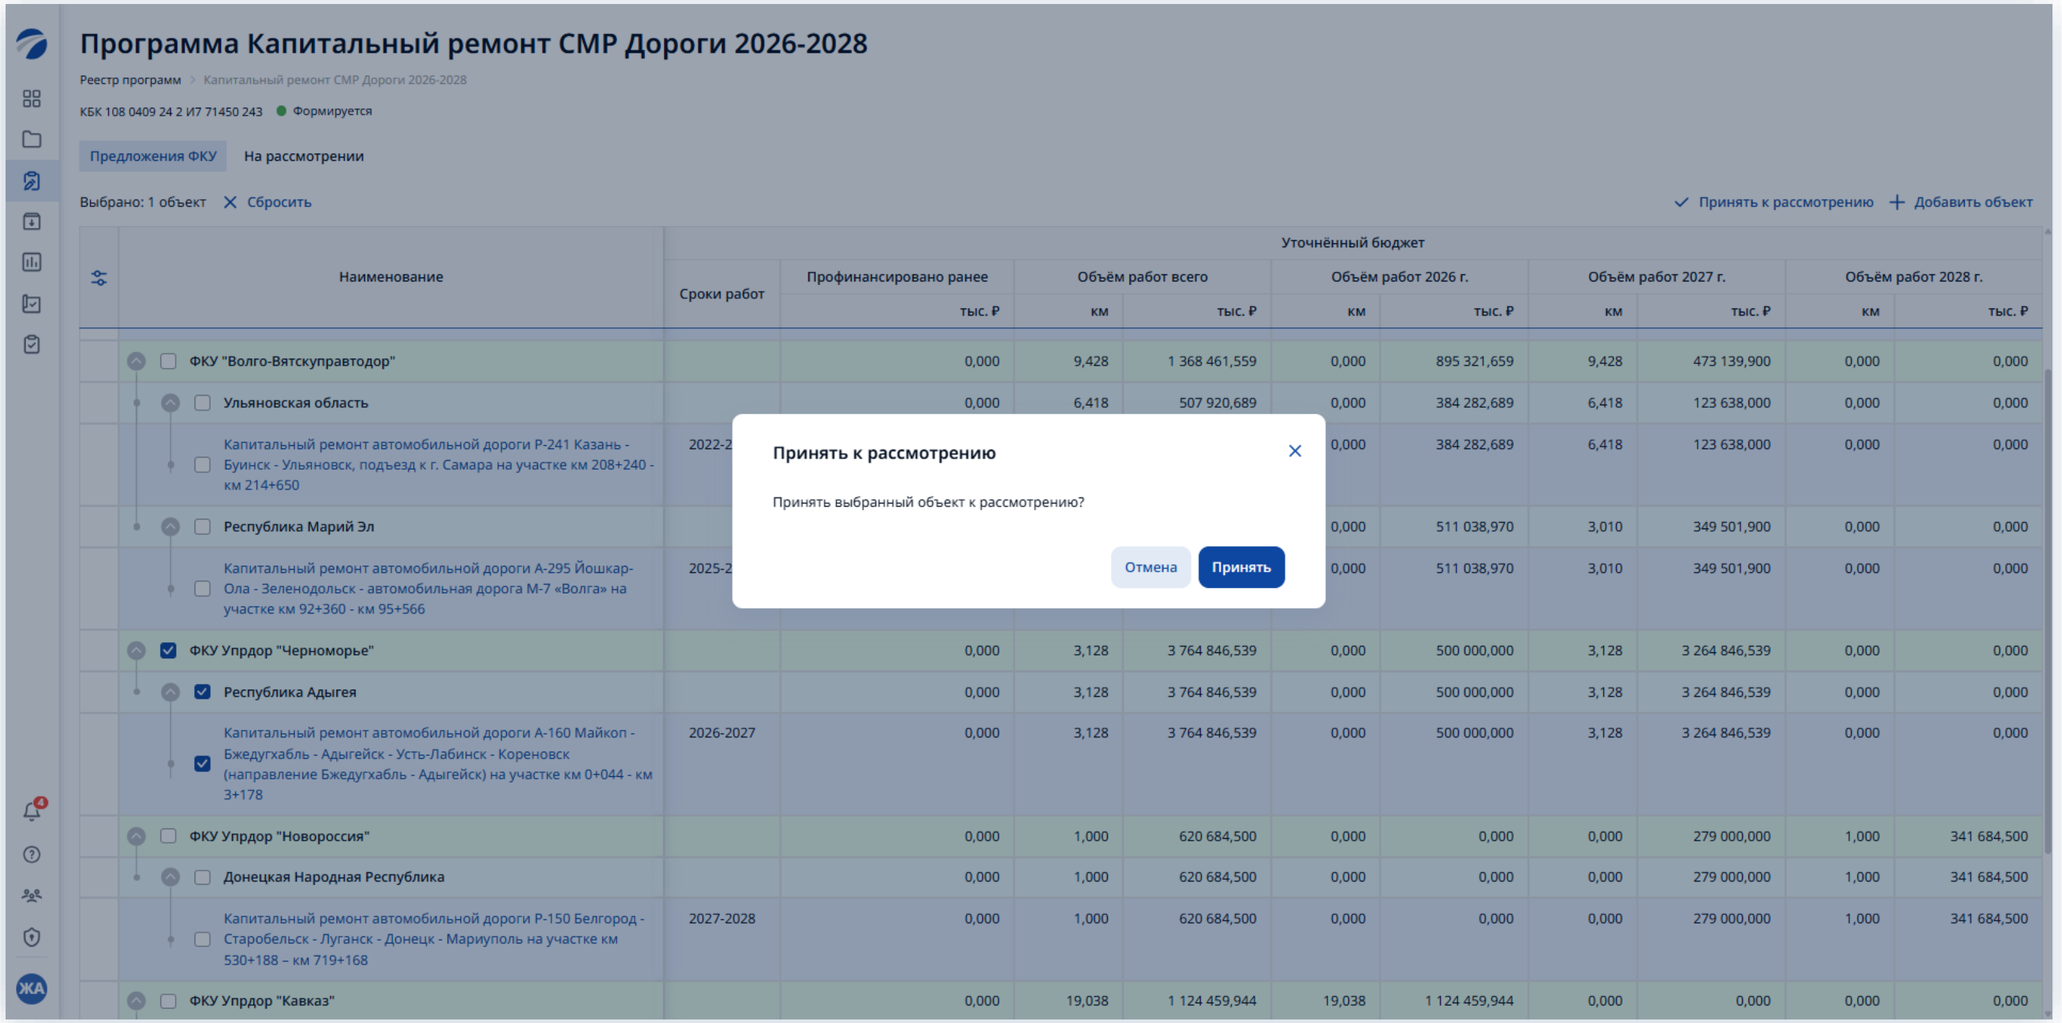

Наименование	Сроки работ	Уточнённый бюджет: Профинансировано ранее, тыс. ₽	Объём работ всего, км	Объём работ всего, тыс. ₽	Объём работ 2026 г., км	Объём работ 2026 г., тыс. ₽	Объём работ 2027 г., км	Объём работ 2027 г., тыс. ₽	Объём работ 2028 г., км	Объём работ 2028 г., тыс. ₽
ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"		0,000	9,428	1 368 461,559	0,000	895 321,659	9,428	473 139,900	0,000	0,000
Ульяновская область		0,000	6,418	507 920,689	0,000	384 282,689	6,418	123 638,000	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самара на участке км 208+240 - км 214+650	2022-2				0,000	384 282,689	6,418	123 638,000	0,000	0,000
Республика Марий Эл					0,000	511 038,970	3,010	349 501,900	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке км 92+360 - км 95+566	2025-2				0,000	511 038,970	3,010	349 501,900	0,000	0,000
ФКУ Упрдор "Черноморье"		0,000	3,128	3 764 846,539	0,000	500 000,000	3,128	3 264 846,539	0,000	0,000
Республика Адыгея		0,000	3,128	3 764 846,539	0,000	500 000,000	3,128	3 264 846,539	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск (направление Бжедугхабль - Адыгейск) на участке км 0+044 - км 3+178	2026-2027	0,000	3,128	3 764 846,539	0,000	500 000,000	3,128	3 264 846,539	0,000	0,000
ФКУ Упрдор "Новороссия"		0,000	1,000	620 684,500	0,000	0,000	0,000	279 000,000	1,000	341 684,500
Донецкая Народная Республика		0,000	1,000	620 684,500	0,000	0,000	0,000	279 000,000	1,000	341 684,500
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь на участке км 530+188 – км 719+168	2027-2028	0,000	1,000	620 684,500	0,000	0,000	0,000	279 000,000	1,000	341 684,500
ФКУ Упрдор "Кавказ"		0,000	19,038	1 124 459,944	19,038	1 124 459,944	0,000	0,000	0,000	0,000

Карточка программы (На рассмотрении)

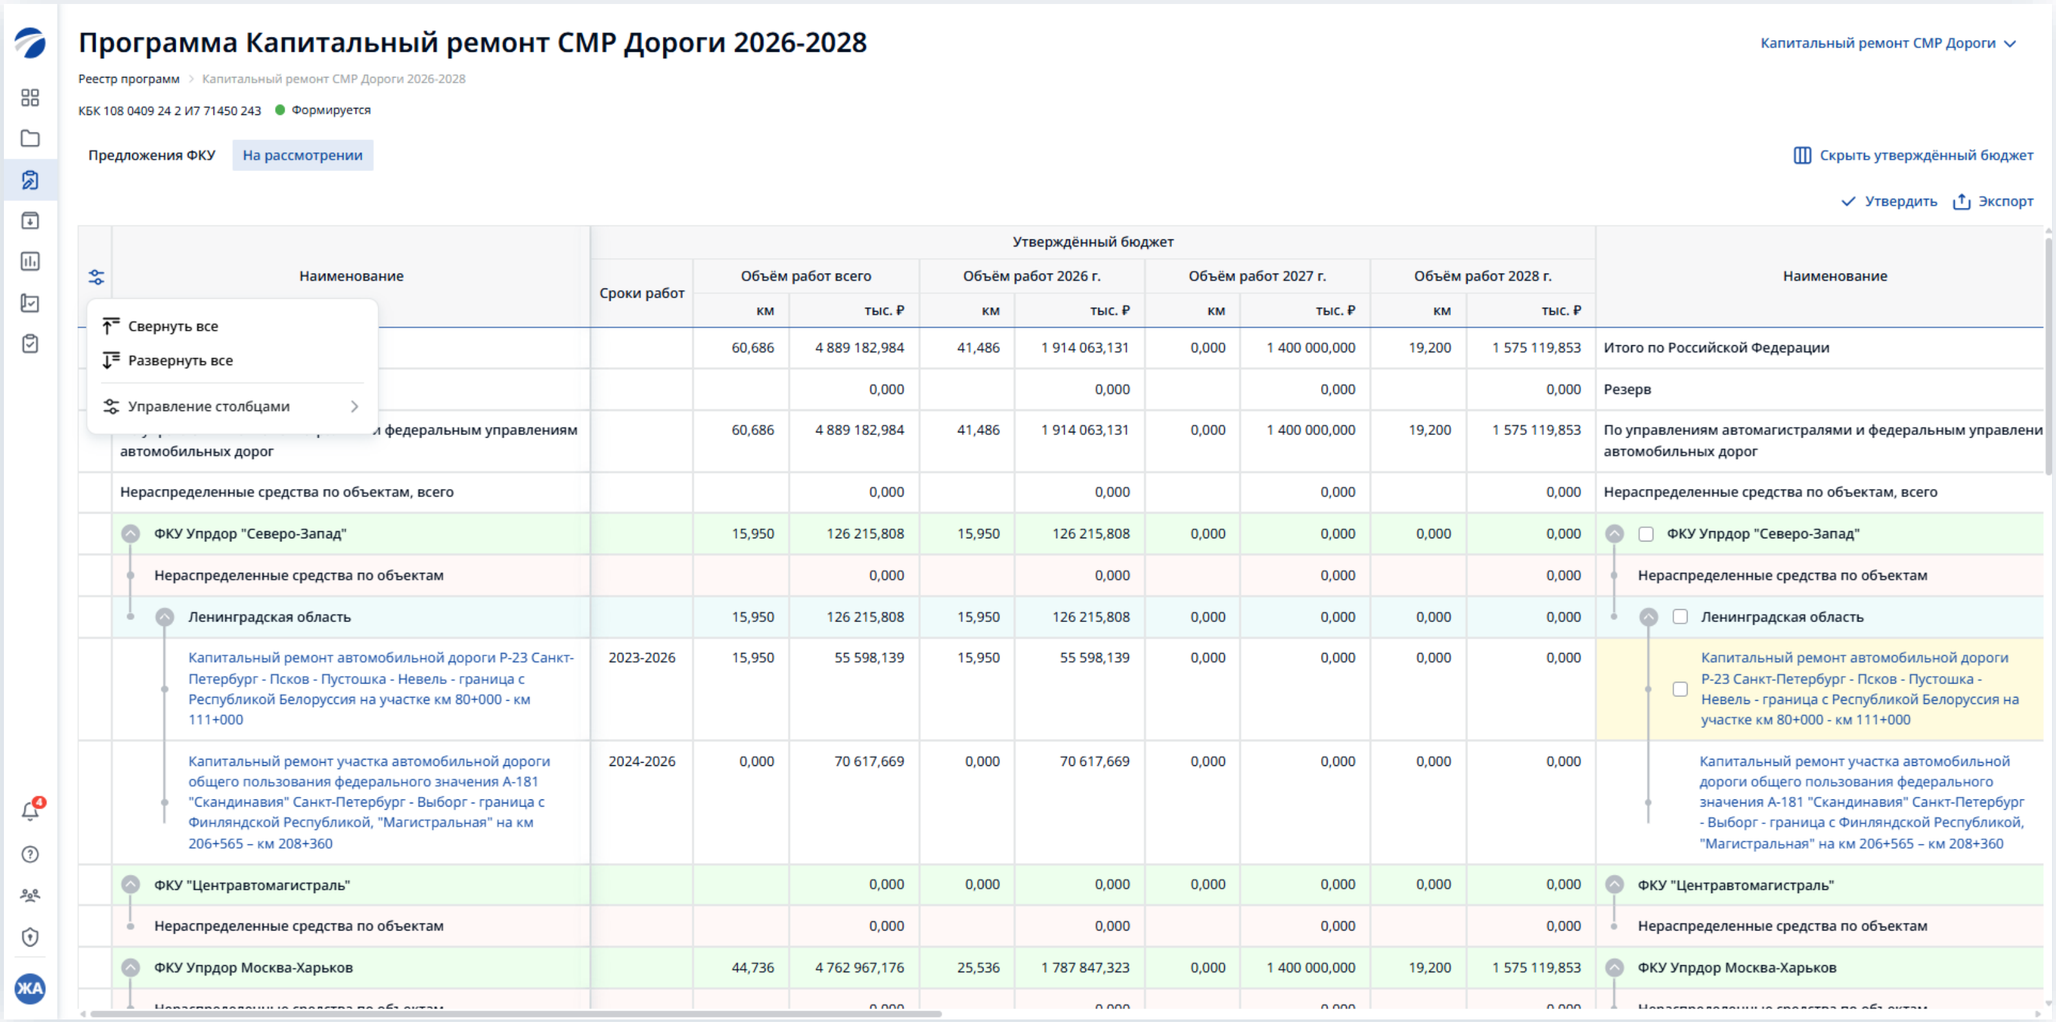

Программа Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

Капитальный ремонт СМР Дороги

Реестр программ › Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

КБК 108 0409 24 2 И7 71450 243 Формируется

Предложения ФКУ | На рассмотрении


Скрыть утверждённый бюджет

Утвердить | Экспорт

Свернуть все
Развернуть все
Управление столбцами

Наименование	Утверждённый бюджет								Наименование
	Сроки работ	Объём работ всего		Объём работ 2026 г.		Объём работ 2027 г.		Объём работ 2028 г.	
		км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	
		60,686	4 889 182,984	41,486	1 914 063,131	0,000	1 400 000,000	19,200	1 575 119,853	Итого по Российской Федерации
			0,000		0,000		0,000		0,000	Резерв
федеральным управлениям автомобильных дорог		60,686	4 889 182,984	41,486	1 914 063,131	0,000	1 400 000,000	19,200	1 575 119,853	По управлениям автомагистралями и федеральным управлени автомобильных дорог
Нераспределенные средства по объектам, всего			0,000		0,000		0,000		0,000	Нераспределенные средства по объектам, всего
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"		15,950	126 215,808	15,950	126 215,808	0,000	0,000	0,000	0,000	ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Нераспределенные средства по объектам			0,000		0,000		0,000		0,000	Нераспределенные средства по объектам
Ленинградская область		15,950	126 215,808	15,950	126 215,808	0,000	0,000	0,000	0,000	Ленинградская область
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000	2023-2026	15,950	55 598,139	15,950	55 598,139	0,000	0,000	0,000	0,000	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 206+565 – км 208+360	2024-2026	0,000	70 617,669	0,000	70 617,669	0,000	0,000	0,000	0,000	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 206+565 – км 208+360
ФКУ "Центравтомагистраль"			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ФКУ "Центравтомагистраль"
Нераспределенные средства по объектам			0,000		0,000		0,000		0,000	Нераспределенные средства по объектам
ФКУ Упрдор Москва-Харьков		44,736	4 762 967,176	25,536	1 787 847,323	0,000	1 400 000,000	19,200	1 575 119,853	ФКУ Упрдор Москва-Харьков

Карточка программы (На рассмотрении)

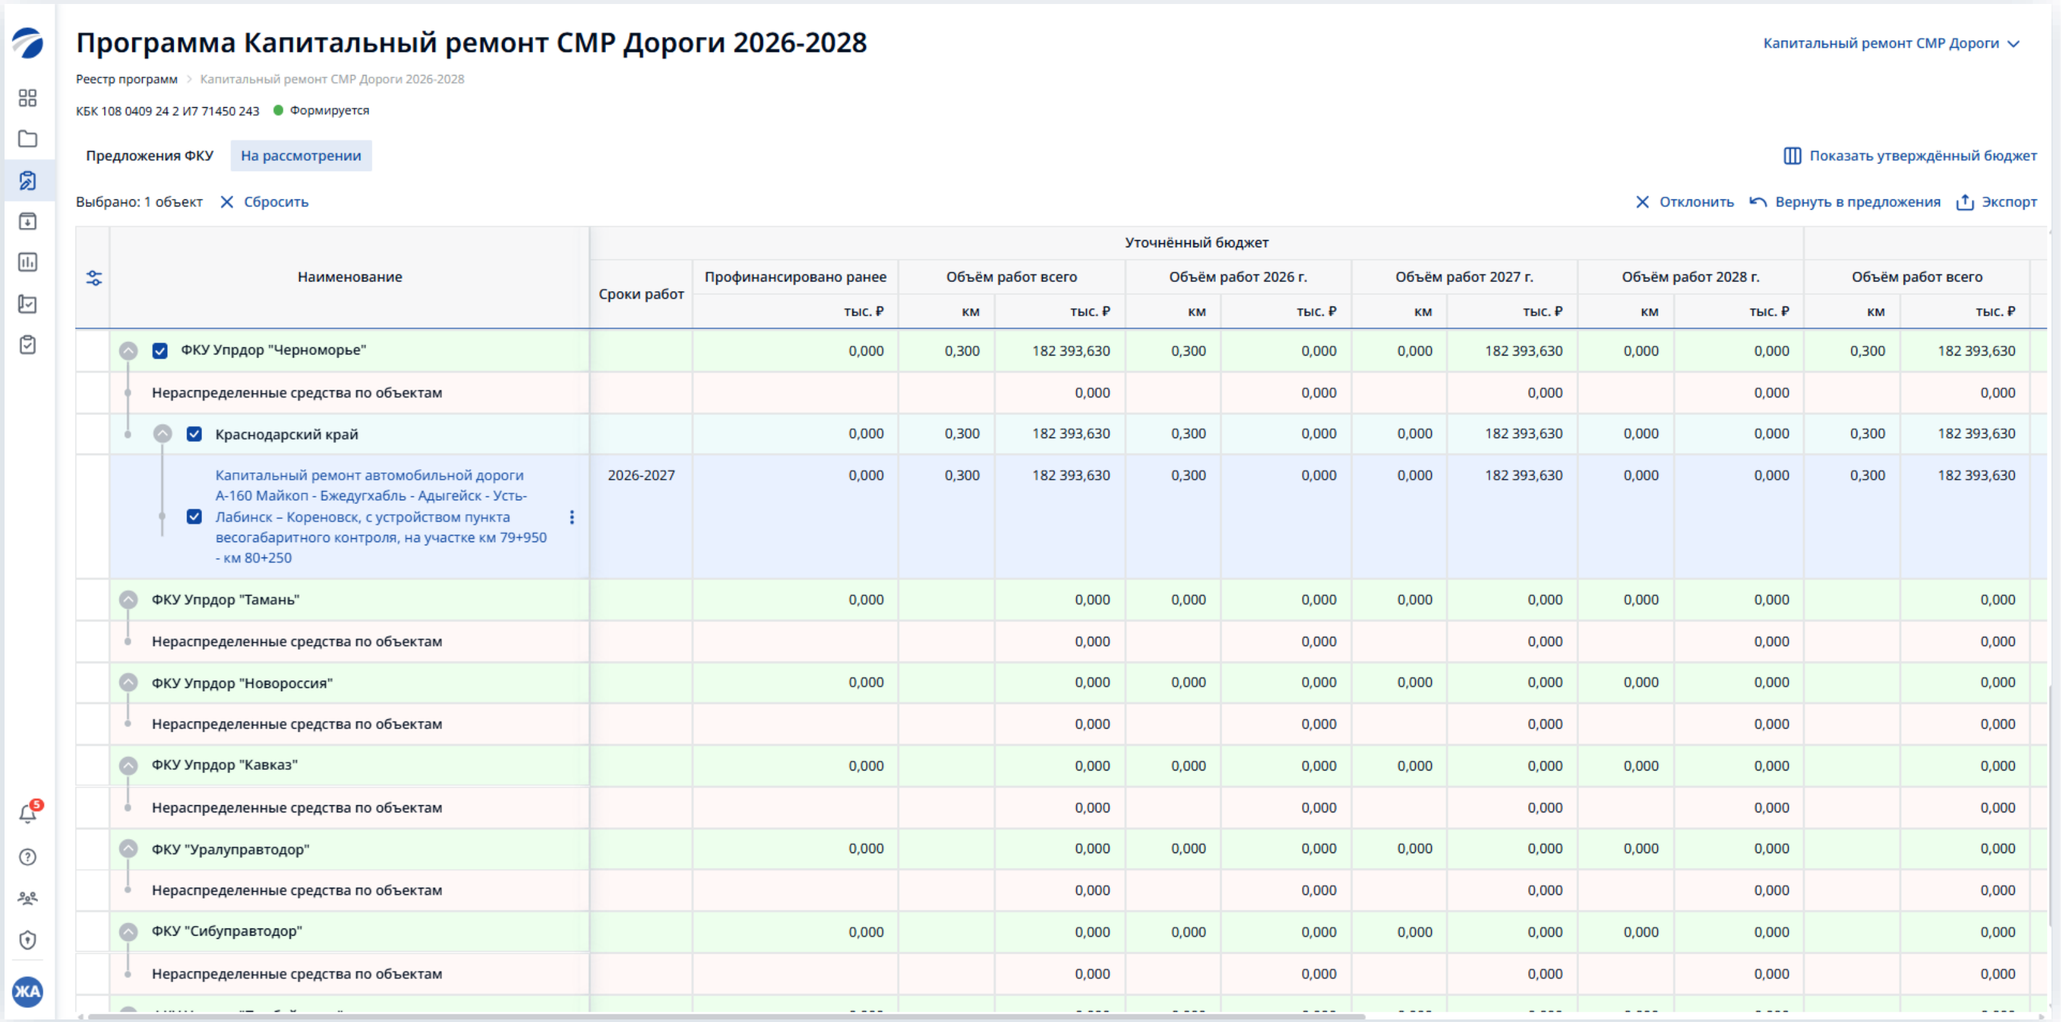

Программа Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

Капитальный ремонт СМР Дороги

Реестр программ > Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

КБК 108 0409 24 2 И7 71450 243 Формируется

Предложения ФКУ | На рассмотрении


Показать утверждённый бюджет

Выбрано: 1 объект Сбросить


Отклонить | Вернуть в предложения | Экспорт

Наименование	Сроки работ	Уточнённый бюджет										
		Профинансировано ранее		Объём работ всего		Объём работ 2026 г.		Объём работ 2027 г.		Объём работ 2028 г.		Объём работ всего
		тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽
ФКУ Упрдор "Черноморье"		0,000	0,300	182 393,630	0,300	0,000	0,000	182 393,630	0,000	0,000	0,300	182 393,630
Нераспределенные средства по объектам				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Краснодарский край		0,000	0,300	182 393,630	0,300	0,000	0,000	182 393,630	0,000	0,000	0,300	182 393,630
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск, с устройством пункта весогабаритного контроля, на участке км 79+950 - км 80+250	2026-2027	0,000	0,300	182 393,630	0,300	0,000	0,000	182 393,630	0,000	0,000	0,300	182 393,630
ФКУ Упрдор "Тамань"		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Нераспределенные средства по объектам				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
ФКУ Упрдор "Новороссия"		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Нераспределенные средства по объектам				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
ФКУ Упрдор "Кавказ"		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Нераспределенные средства по объектам				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
ФКУ "Уралуправтодор"		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Нераспределенные средства по объектам				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
ФКУ "Сибуправтодор"		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Нераспределенные средства по объектам				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000


Карточка программы (На рассмотрении)

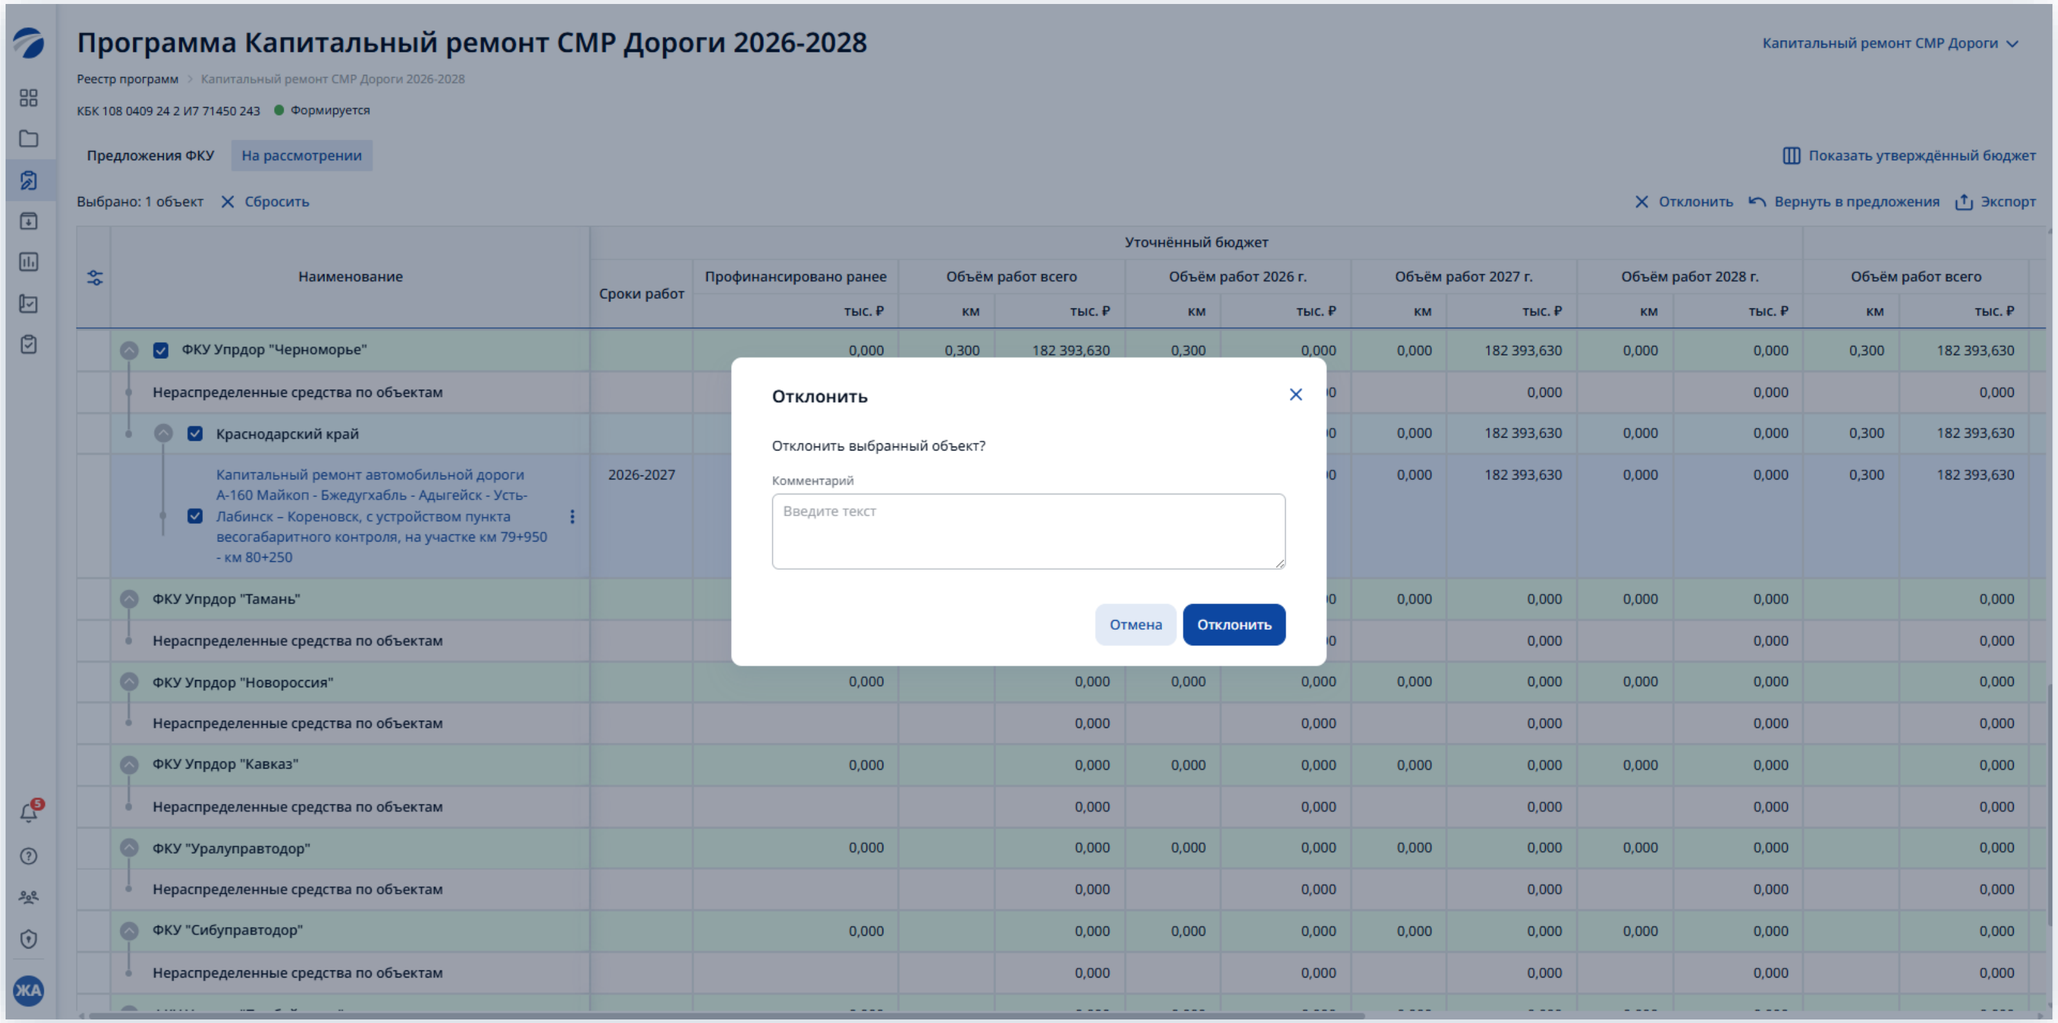


Карточка программы (На рассмотрении)

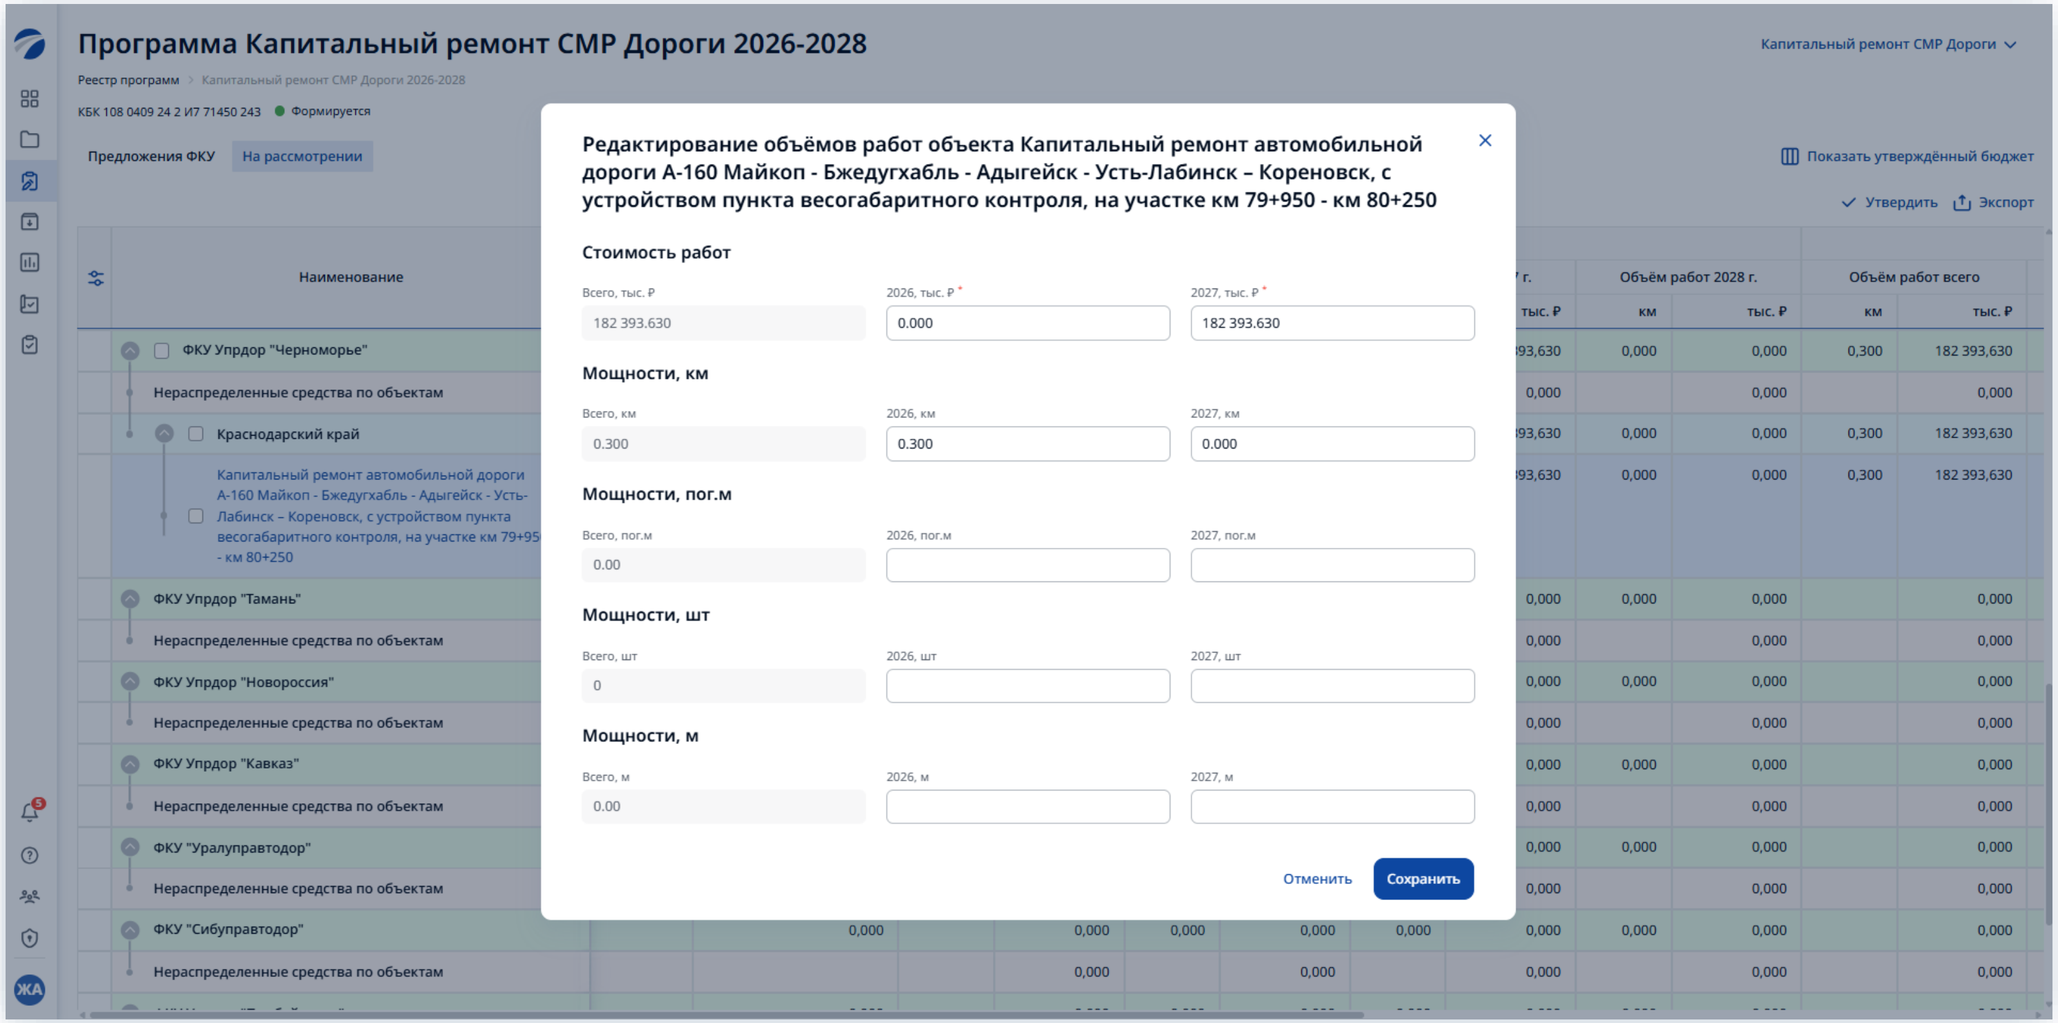


Карточка программы (На рассмотрении)

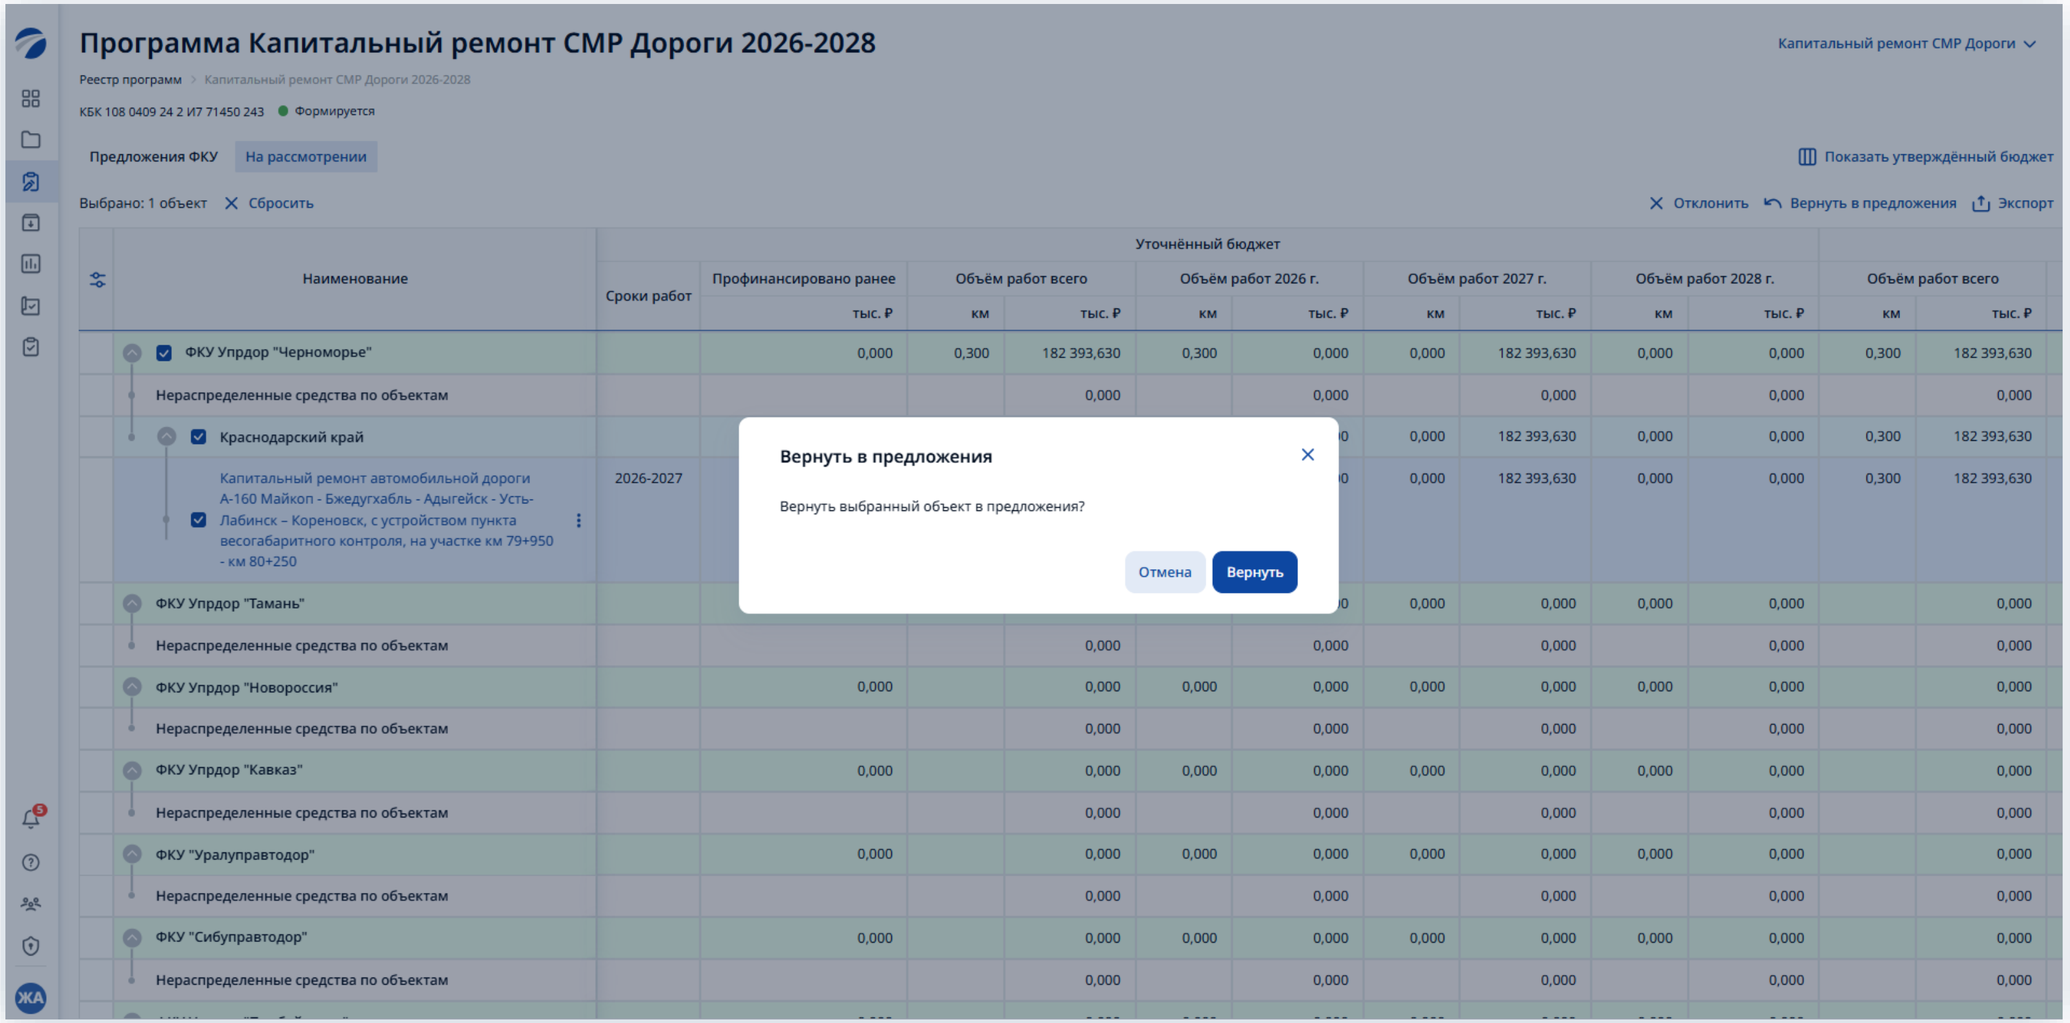

Карточка программы (Утверждение)

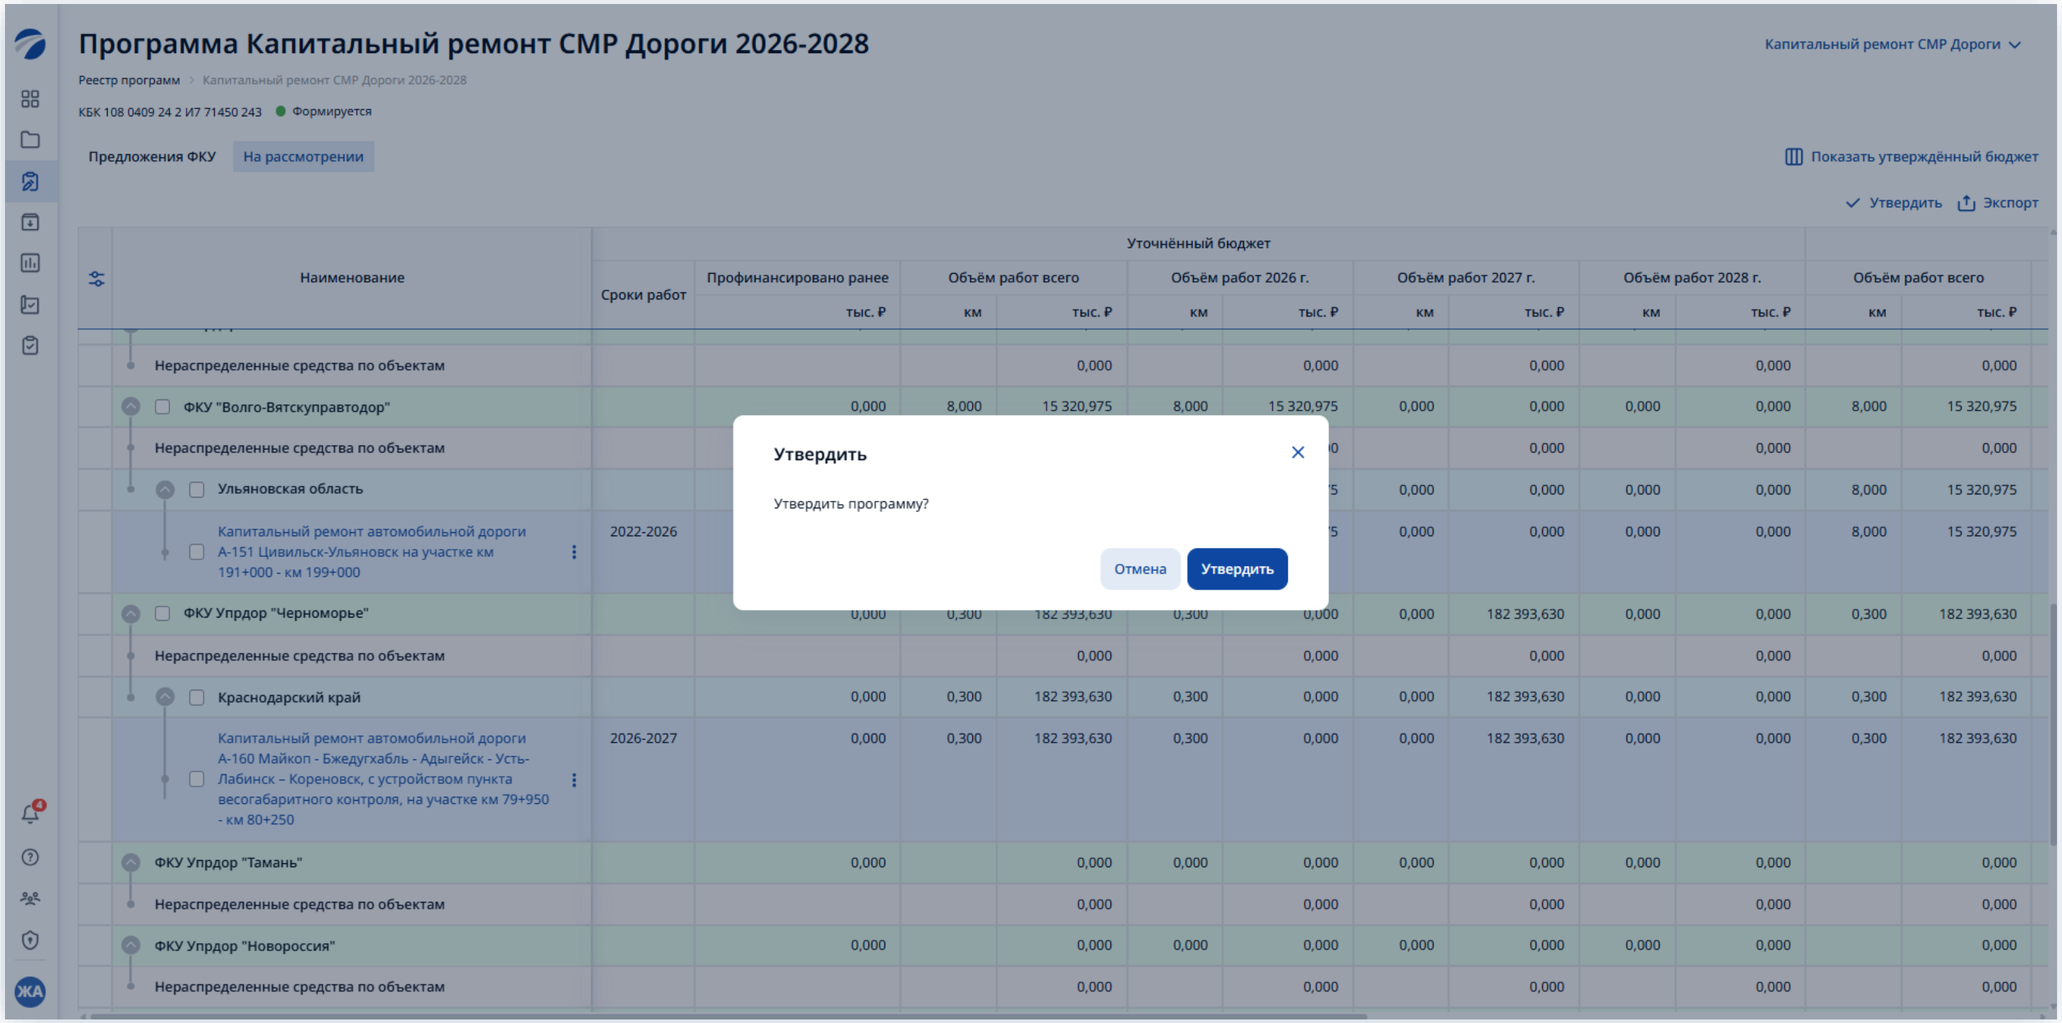

Карточка программы (Утвержденная)

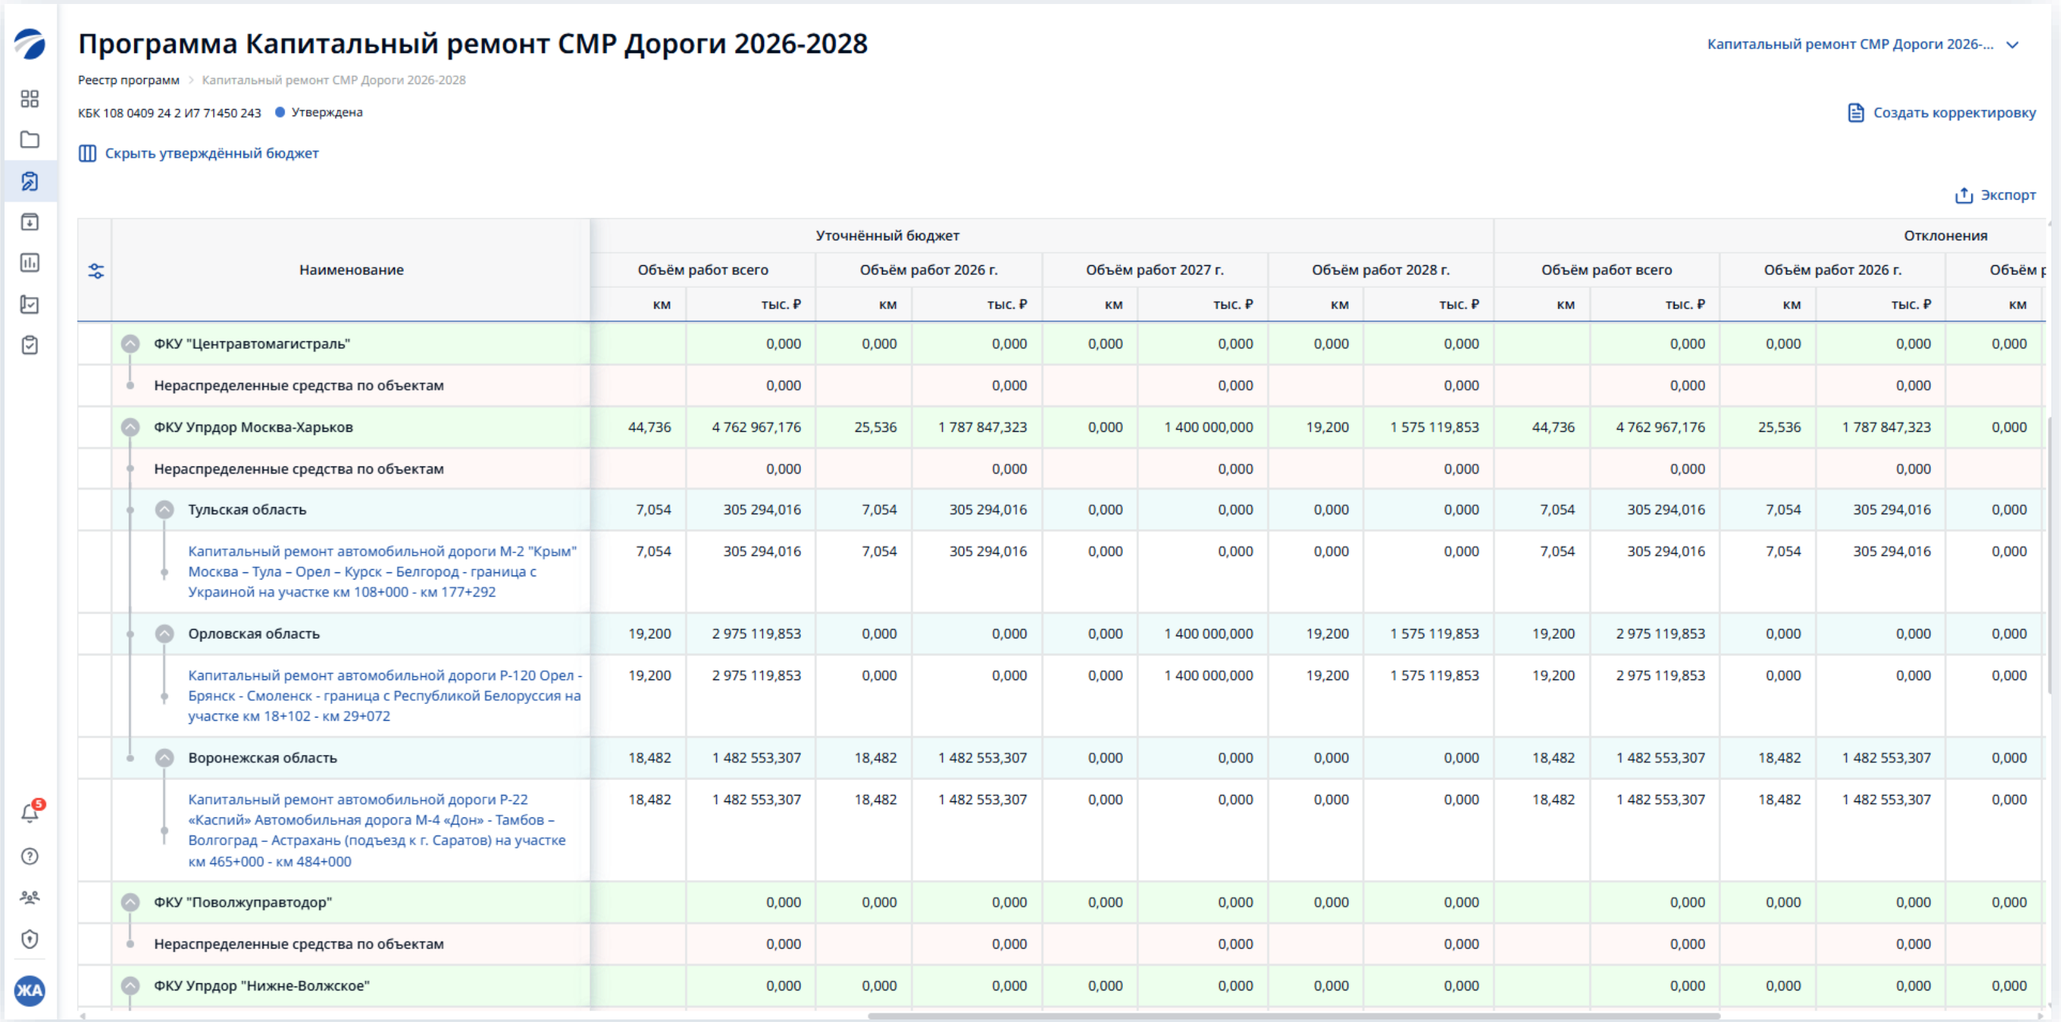

Программа Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-...

Реестр программ > Капитальный ремонт СМР Дороги 2026-2028

КБК 108 0409 24 2 И7 71450 243 Утверждена

Создать корректировку

Скрыть утверждённый бюджет

Экспорт

Наименование	Уточнённый бюджет								Отклонения				
	Объём работ всего		Объём работ 2026 г.		Объём работ 2027 г.		Объём работ 2028 г.		Объём работ всего		Объём работ 2026 г.		Объём р
	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км	тыс. ₽	км
ФКУ "Центравтомагистраль"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Нераспределенные средства по объектам		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
ФКУ Упрдор Москва-Харьков	44,736	4 762 967,176	25,536	1 787 847,323	0,000	1 400 000,000	19,200	1 575 119,853	44,736	4 762 967,176	25,536	1 787 847,323	0,000
Нераспределенные средства по объектам		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Тульская область	7,054	305 294,016	7,054	305 294,016	0,000	0,000	0,000	0,000	7,054	305 294,016	7,054	305 294,016	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной на участке км 108+000 - км 177+292	7,054	305 294,016	7,054	305 294,016	0,000	0,000	0,000	0,000	7,054	305 294,016	7,054	305 294,016	0,000
Орловская область	19,200	2 975 119,853	0,000	0,000	0,000	1 400 000,000	19,200	1 575 119,853	19,200	2 975 119,853	0,000	0,000	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия на участке км 18+102 - км 29+072	19,200	2 975 119,853	0,000	0,000	0,000	1 400 000,000	19,200	1 575 119,853	19,200	2 975 119,853	0,000	0,000	0,000
Воронежская область	18,482	1 482 553,307	18,482	1 482 553,307	0,000	0,000	0,000	0,000	18,482	1 482 553,307	18,482	1 482 553,307	0,000
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 «Каспий» Автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратов) на участке км 465+000 - км 484+000	18,482	1 482 553,307	18,482	1 482 553,307	0,000	0,000	0,000	0,000	18,482	1 482 553,307	18,482	1 482 553,307	0,000
ФКУ "Поволжуправтодор"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Нераспределенные средства по объектам		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000

Прием-передача участков автомобильных дорог в ФГИС СКДФ

Реестр мероприятий прием-передачи дорог

Мероприятия по приему-передаче участков дорог


Поиск по наименованию | Помощь

Субъект | Передающая организация | Принимающая организация | Статус

+ Создать мероприятие

Наименование	Субъект	Дата создания	Передающая организация	Принимающая организация	Статус	Код СКДФ
Передача автомобильных дорог города Архангельск	Архангельская область	02.10.2026	Администрация муниципального образования "город Архангельск"	Государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"	На утверждении	43
Передача участка Р–242 Пермь – Екатеринбург (160+046 - 352+424)	г. Москва	01.10.2026	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	На согласовании	42
Передача автомобильных дорог городу Барнаулу	Алтайский край	29.09.2026	Администрация 12 Лет Октября сельсовета Поспелихинского района Алтайского края	Администрация города Барнаула Алтайского края	На согласовании	41
Мероприятие по приему-передаче дороги Савтодор-сервис	Алтайский край	28.09.2026	Администрация 12 Лет Октября сельсовета Поспелихинского района Алтайского края	"АВТОДОР-СЕРВИС"	Черновик	37
Передача автомобильных дорог регионального значения	Кабардино-Балкарская Республика	27.09.2026	Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства"	Администрация Атюрьевского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия	На согласовании	35
Передача участка Р–242 Пермь – Екатеринбург (187+589 - 341+961)	Свердловская область	25.09.2026	Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Утверждено	33
Передача участков дорог без изменения уровня собственности	Свердловская область	25.09.2026	Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Утверждено	31
Передача участка Р–242 Пермь – Екатеринбург (160+046 - 352+424)	г. Москва	24.09.2026	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	Утверждено	30
Передача участка Р–242 Пермь – Екатеринбург (160+046 - 352+424)	Свердловская область	24.09.2026	Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	Утверждено	29
Мероприятие по приему-передачу участков дорог по приказу №231-2 от государственной компании Северавтодор в Администрации города Барнаула	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	18.09.2026	Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"	Администрация города Барнаула Алтайского края	Черновик	22
Мероприятие по приему-передаче участков дорог по приказу №16	Алтайский край	18.09.2026	Администрация 12 Лет Октября сельсовета	Администрация Айского сельсовета Алтайского	Утверждено	21

Создание мероприятия прием-передачи

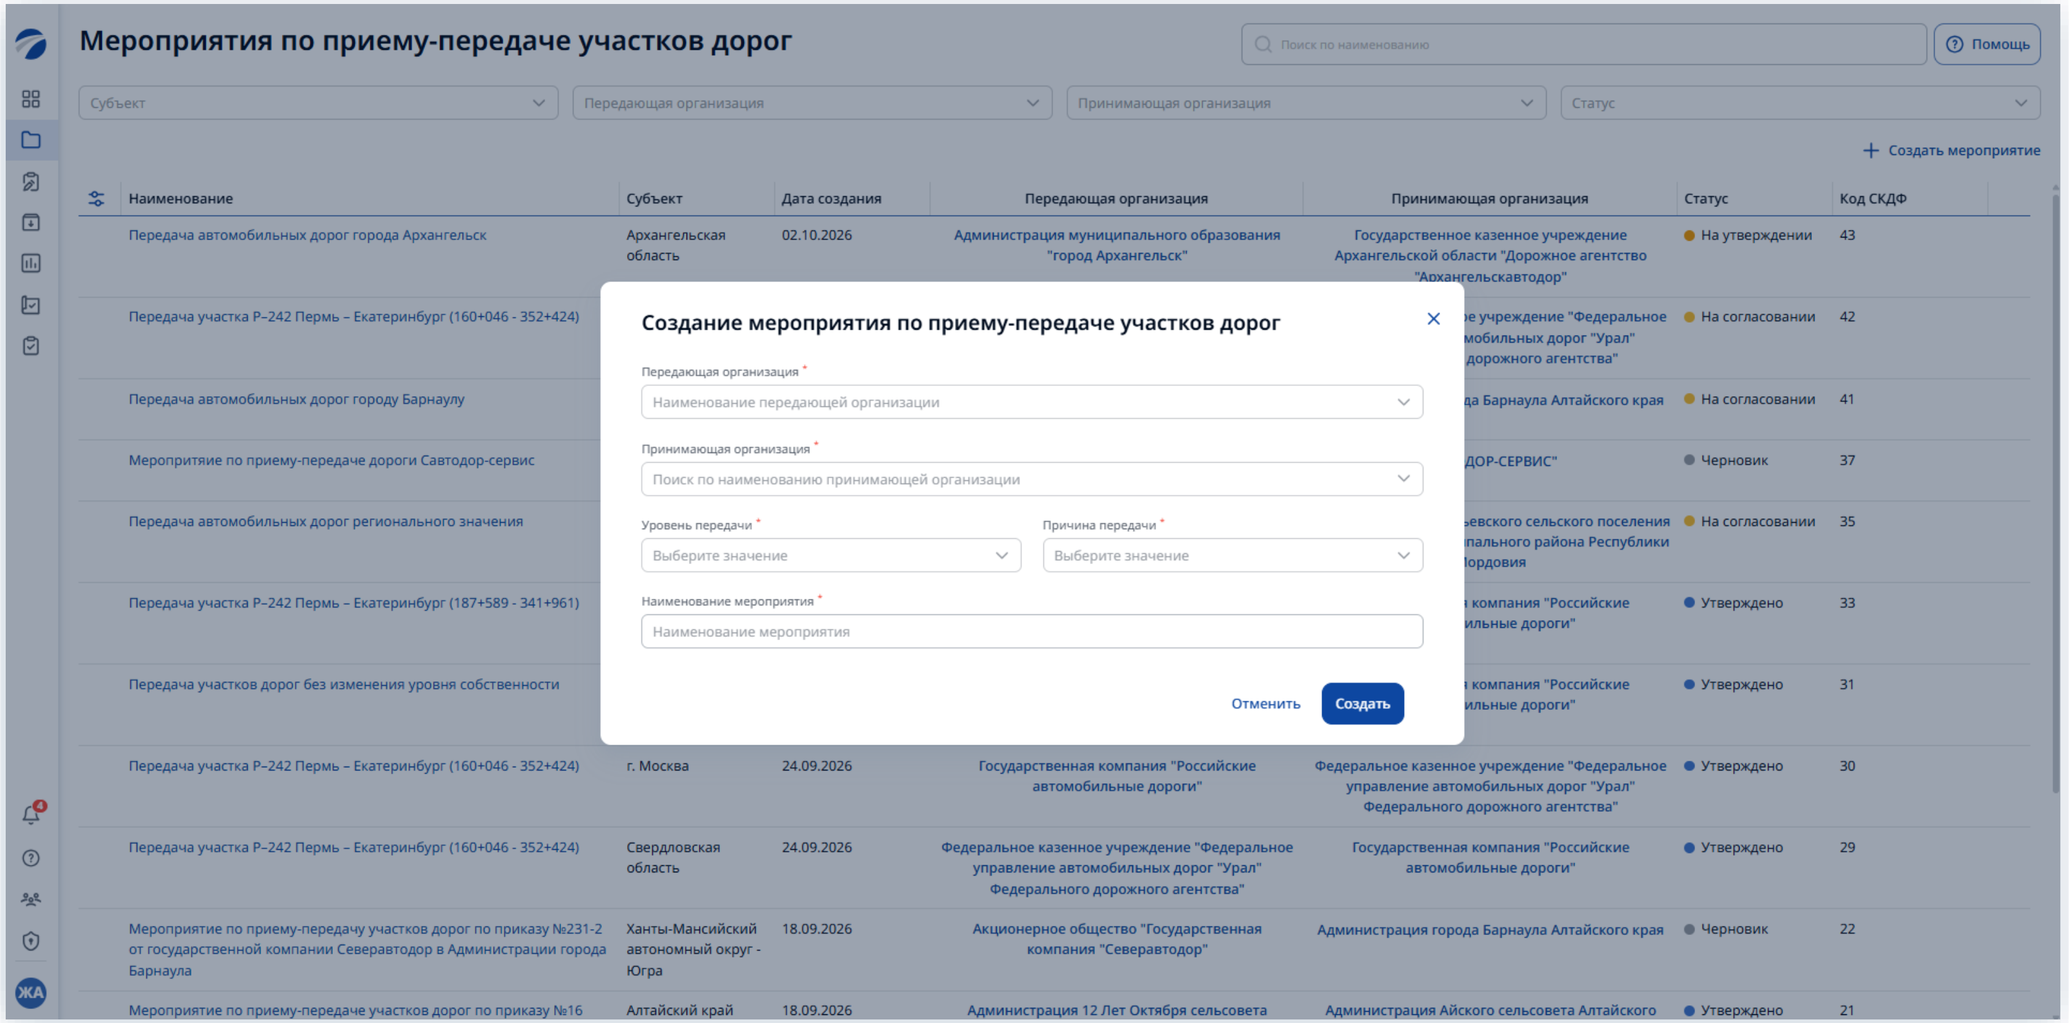

Карточка мероприятия прием-передачи



Передача участка Р–242 Пермь – Екатеринбург (160+046 - 352+424)

Мероприятия по приему-передаче участков дорог › Передача участка Р–242 Пермь – Екатеринбург (160+046 - 352+424)

Черновик | Отправить на согласование | Скачать PDF

Общие данные | Процесс согласования | Приложения

Редактировать

Дата создания
01.10.2026

Передающая организация
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

Принимающая организация
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства"

Уровень передачи
Без изменения уровня собственности

Причина передачи
Безвозмездная передача имущества

Перечень передаваемых участков дорог


Добавить участки дорог

Наименование	Статус	Значение	Идентификационный номер	Протяженность, км	Число полос	Площадь, м²	Нормативное состояние, %	Мостовые сооружения, шт	Тоннели, шт	Трубы, шт	Освещение, шт	Километровые знаки, шт	Остановки, шт	Пешеходные переходы, шт	АЗС, шт	СТО, шт	Автостанции, автовокзалы, шт	Кемпинги шт
М-12 "Восток" строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень на участке Ачит - Екатеринбург (бывший участок Р-242, км 187+589 - км 341+961)	Действует	Автомобильные дороги федерального значения	00 ОП ФЗ М-12	154.37	4	2315550	91.71	23	0	188	1	145	0	6	18	2	0	0


1

Скачать XLSX

Выбор участков дорог для передачи

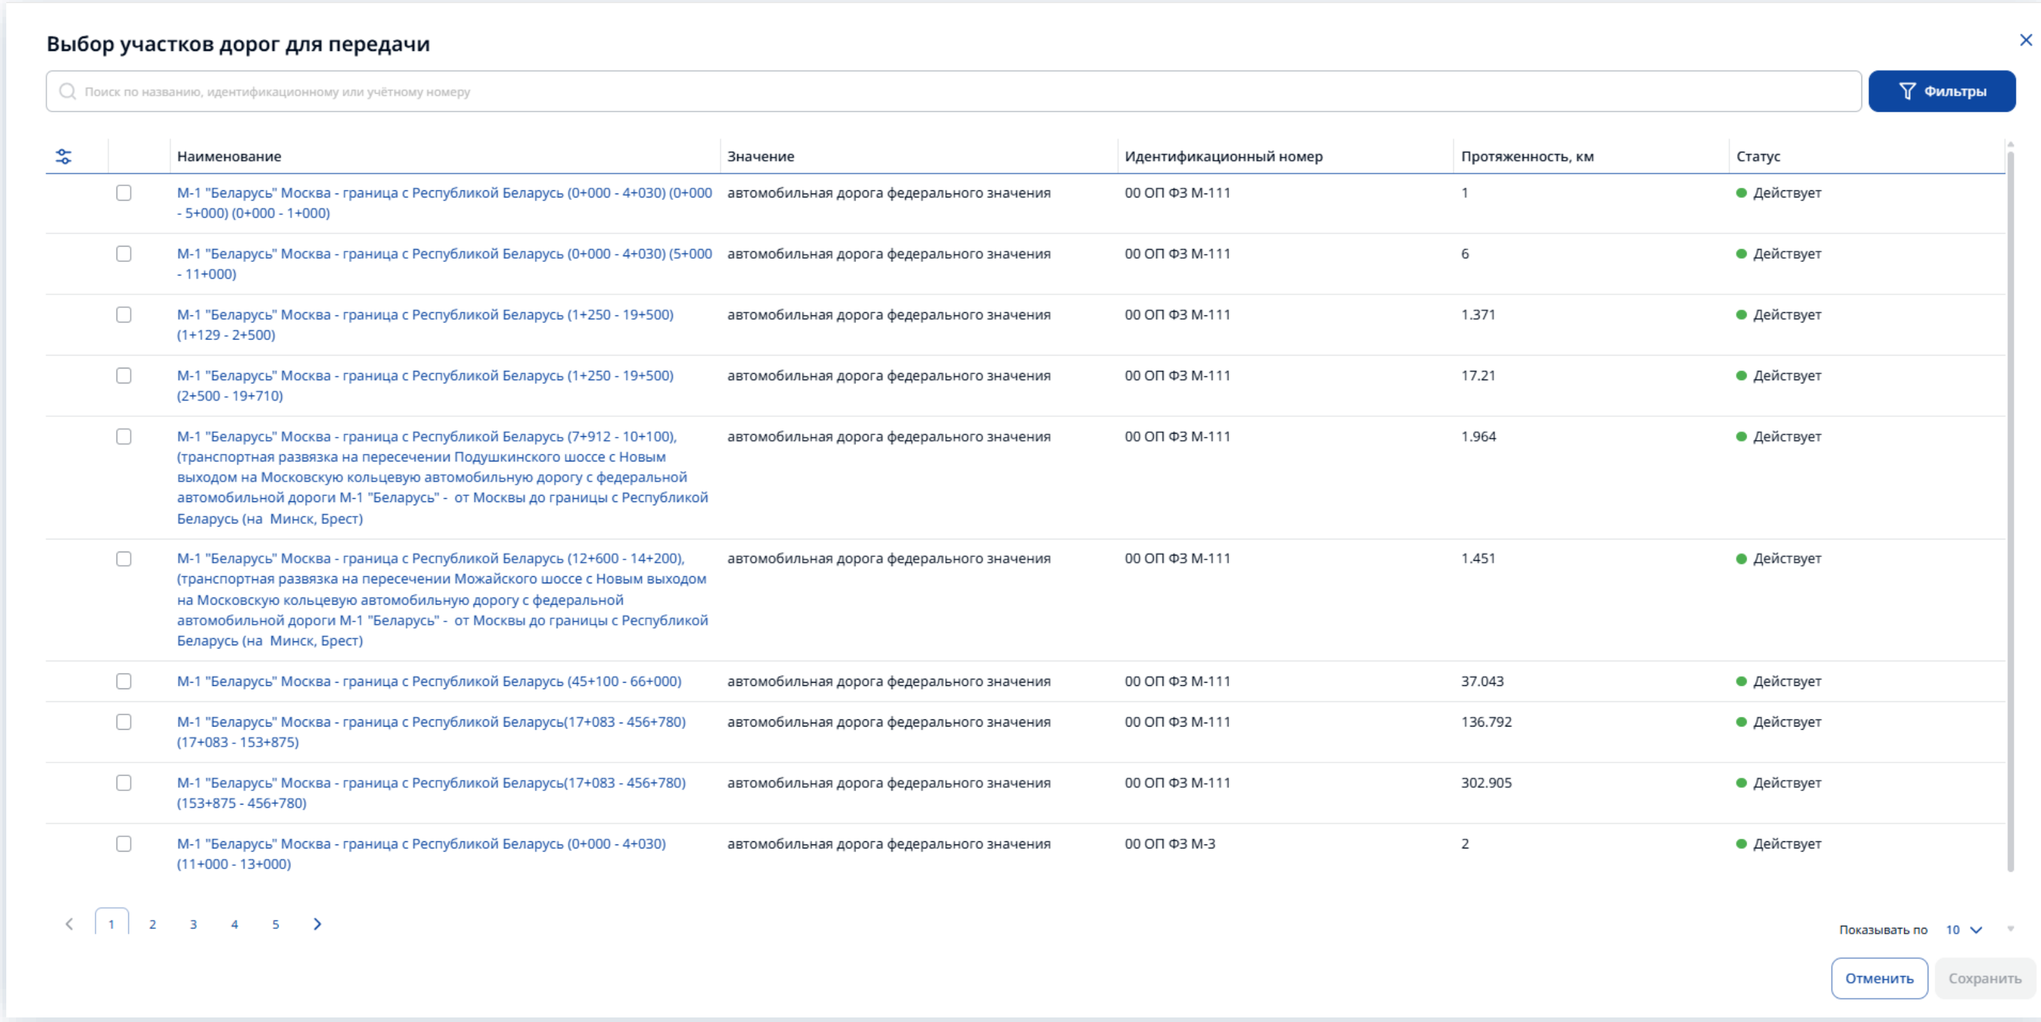

Отображение сведений в паспорте участка

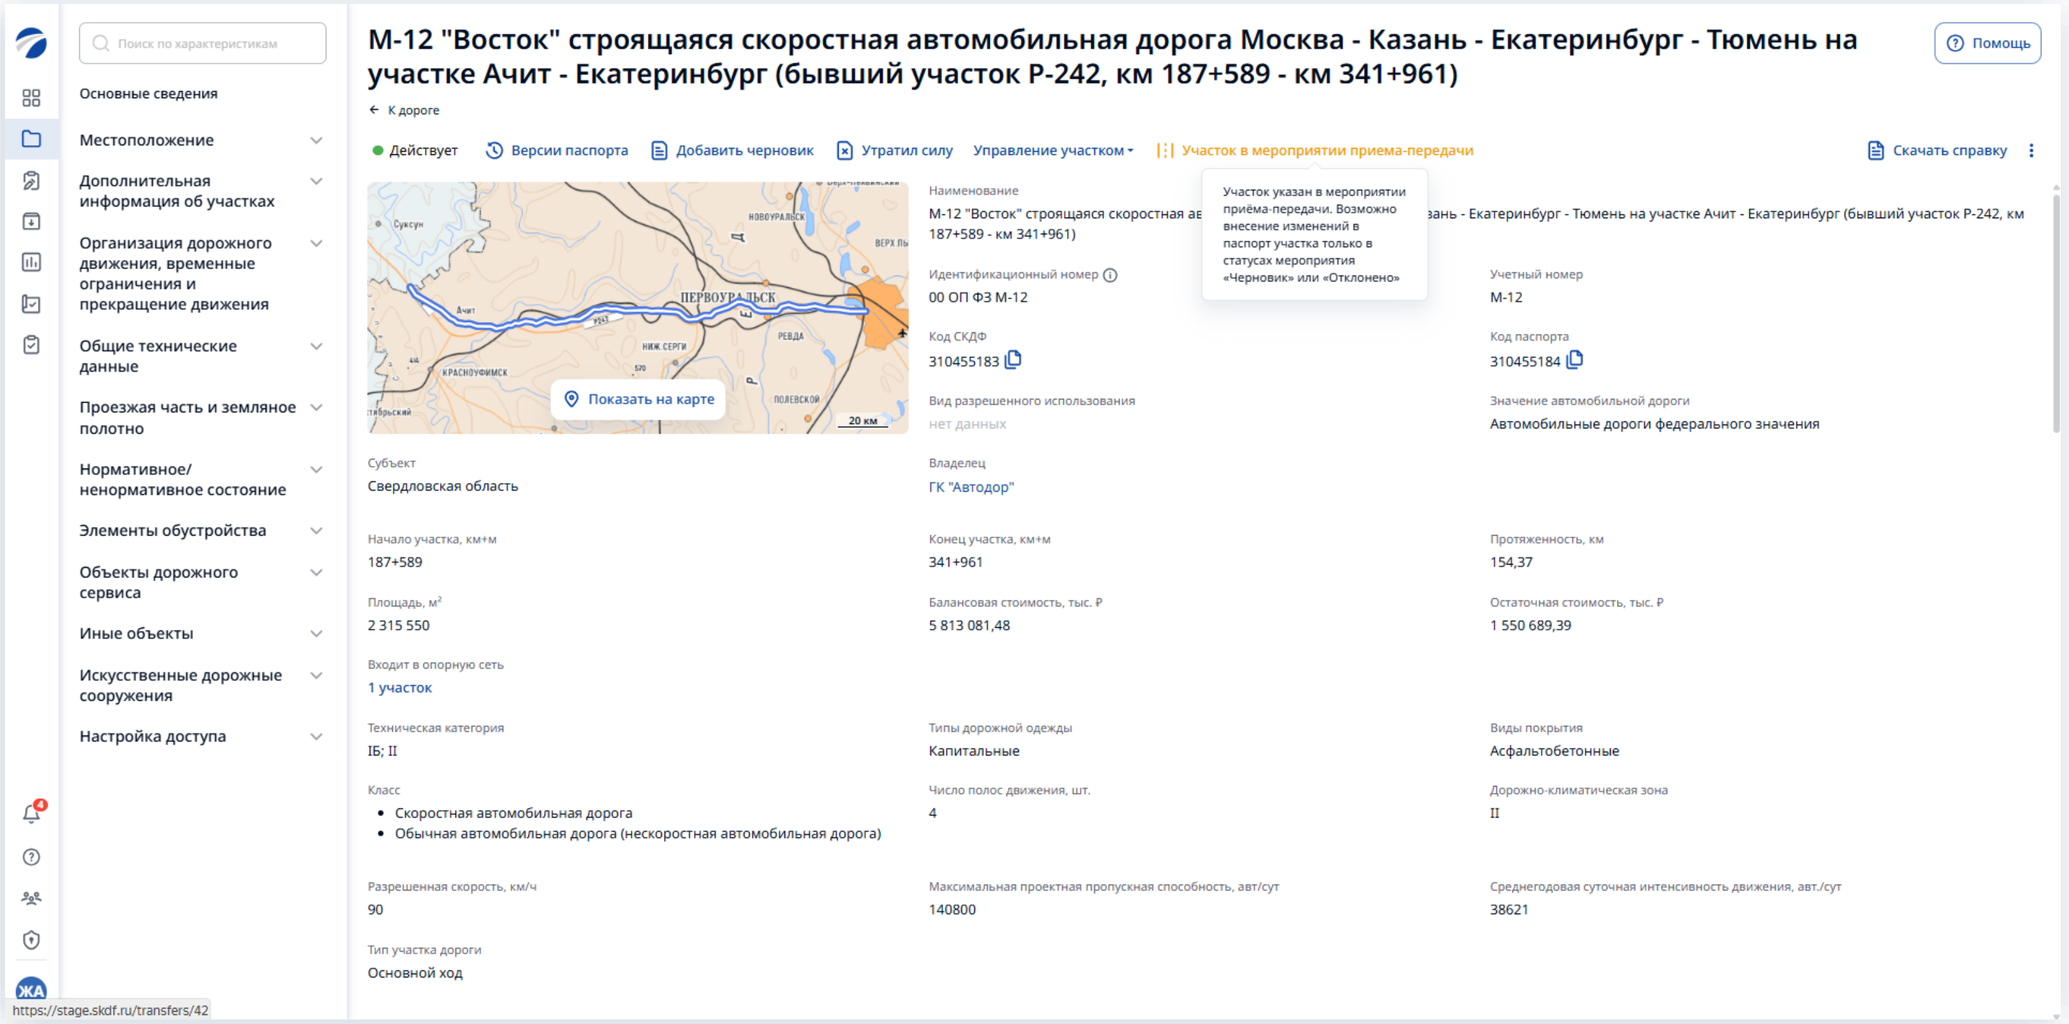


Процесс согласования мероприятия прием-передачи




Приложения мероприятия прием-передачи




Согласование мероприятия преим-передачи

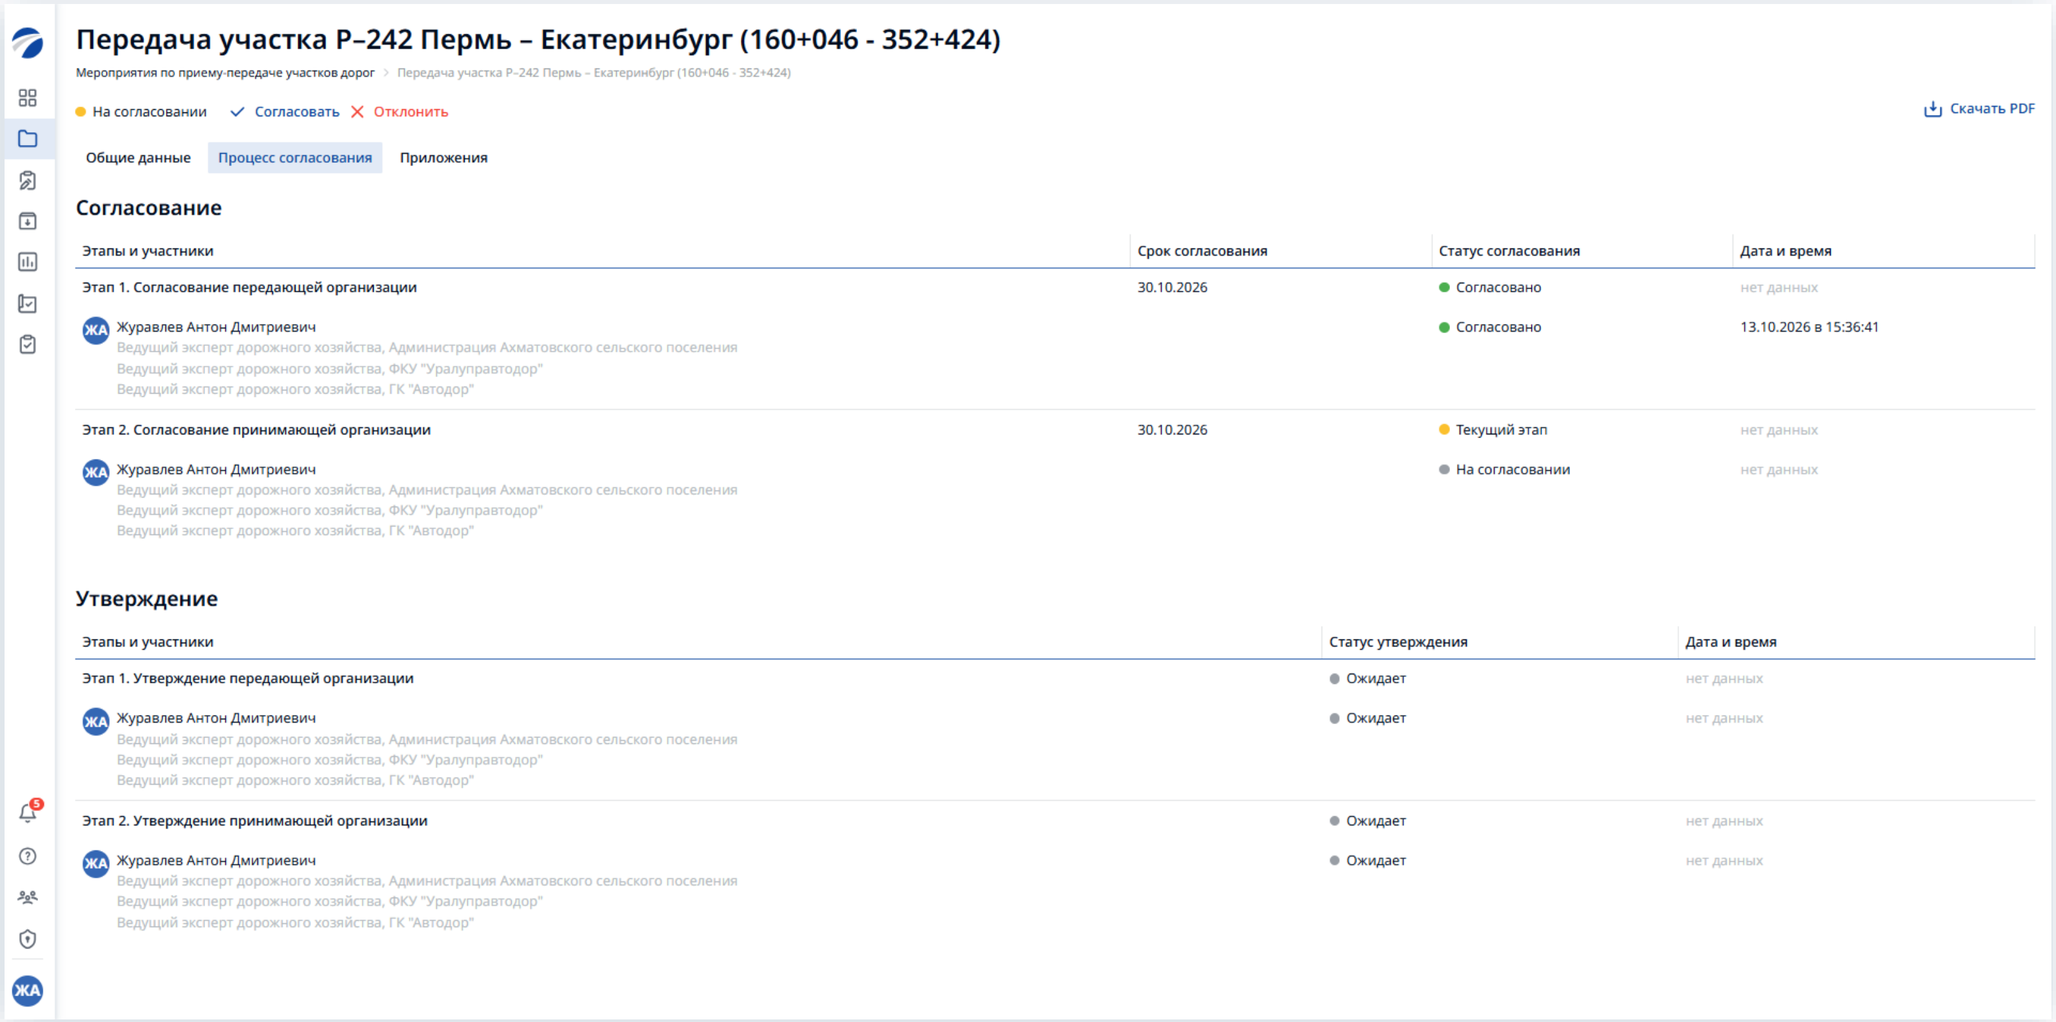


Уведомления в ФГИС СКДФ

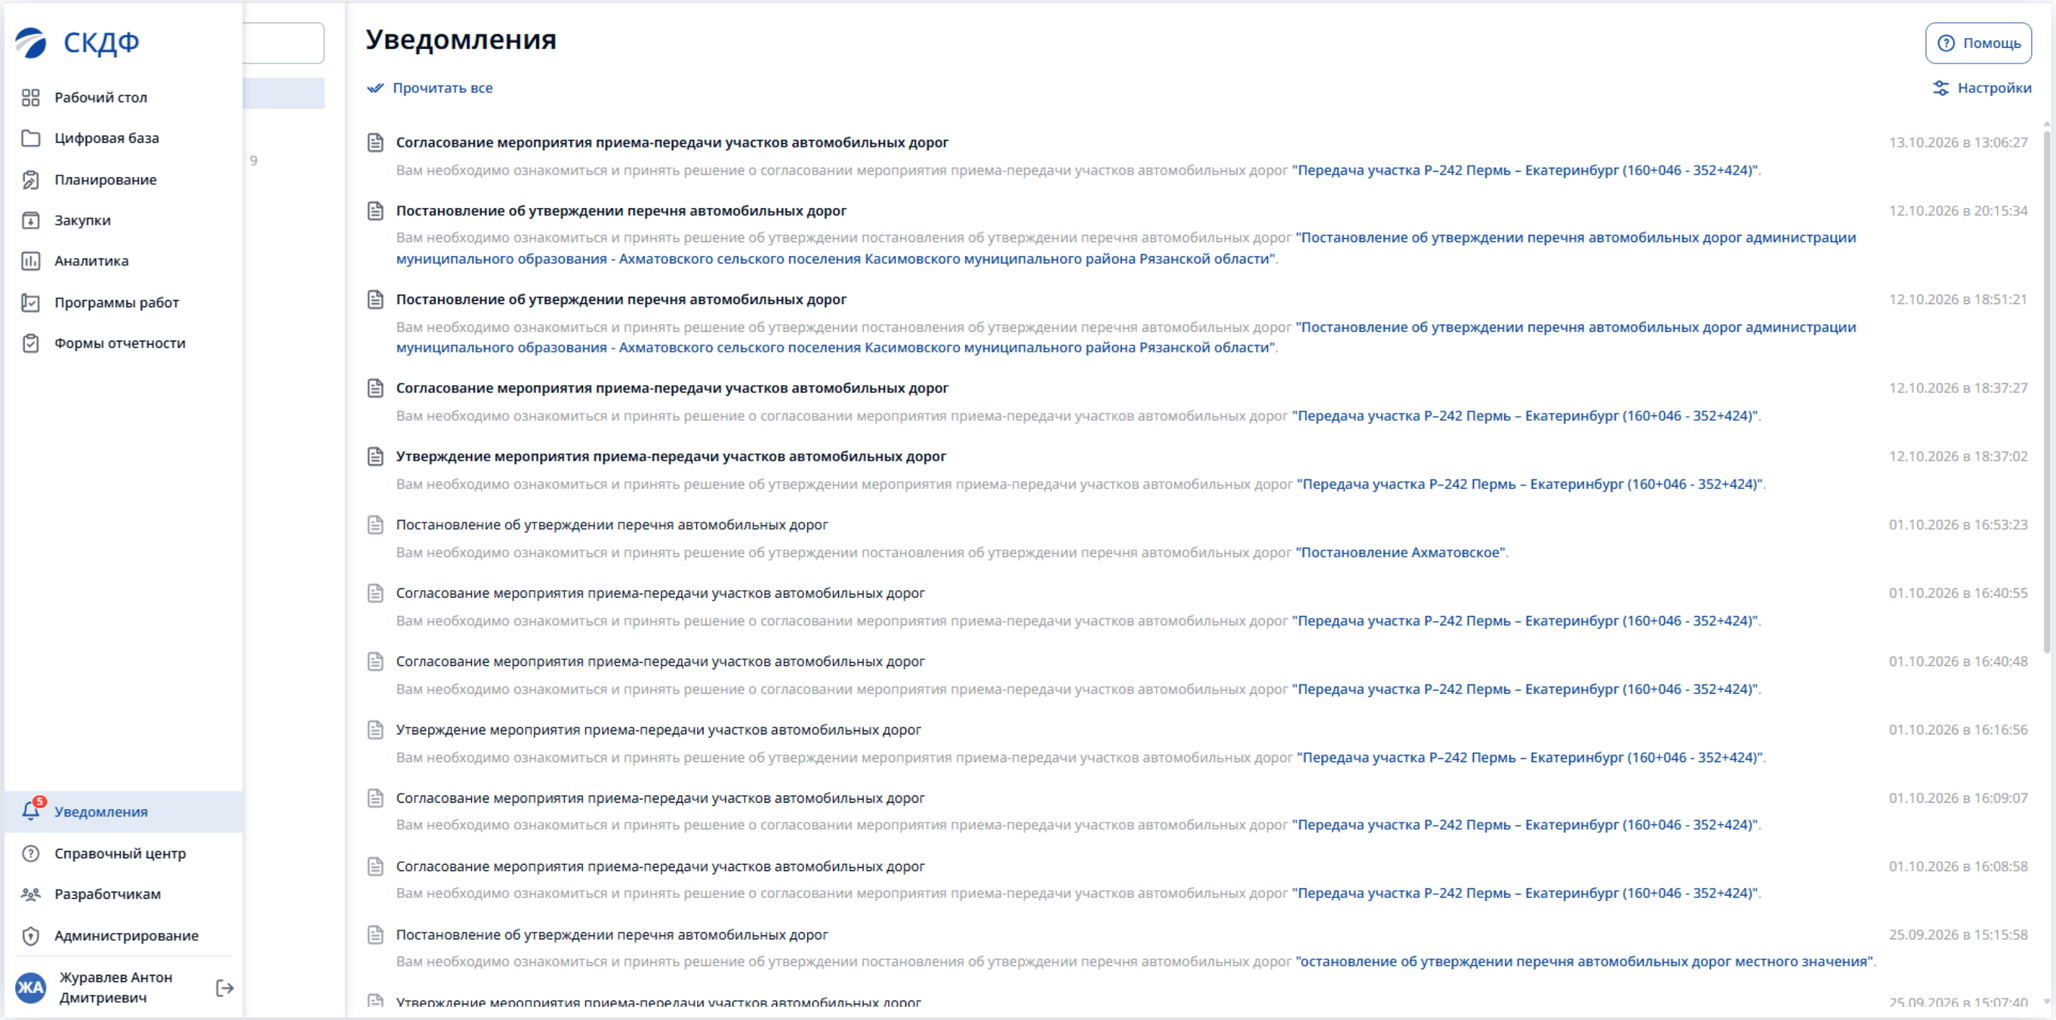


Работа с участками

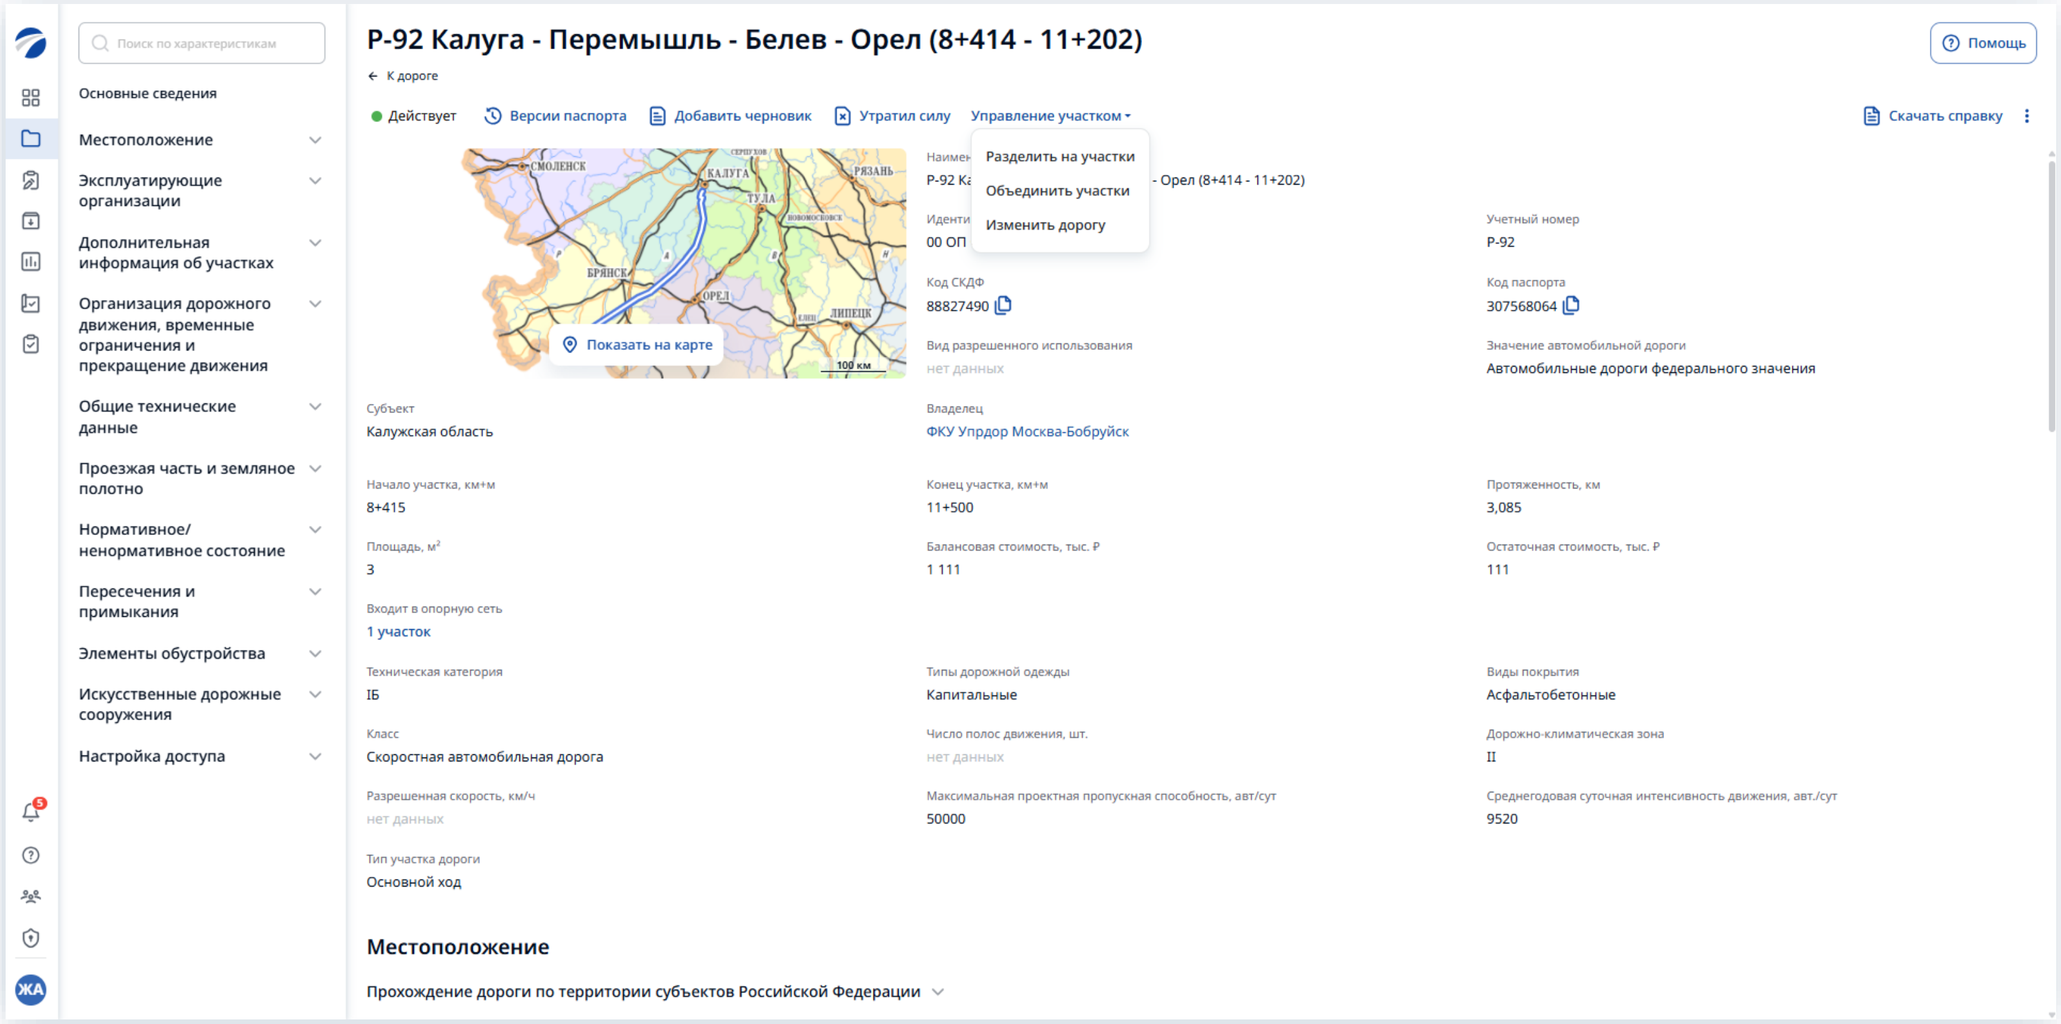


Работа с участками (разделение)

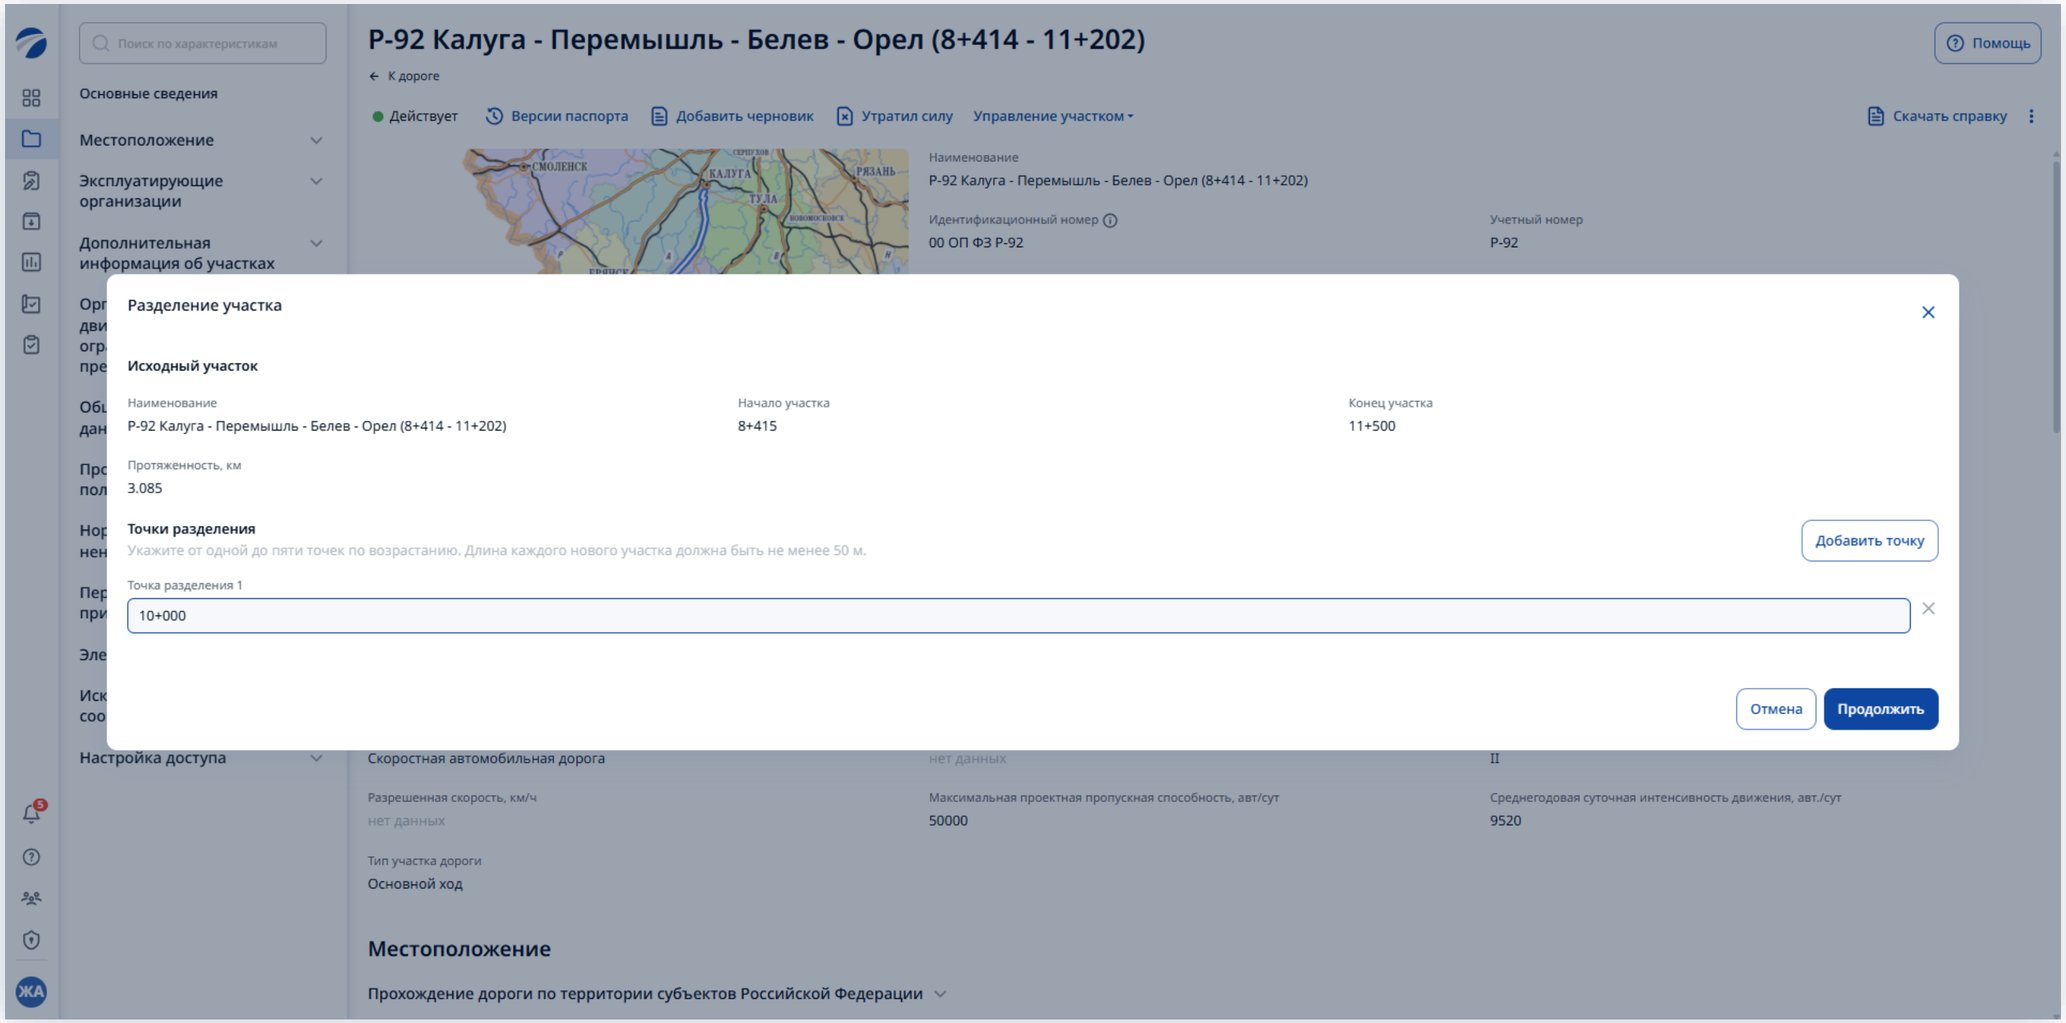


Работа с участками (разделение)

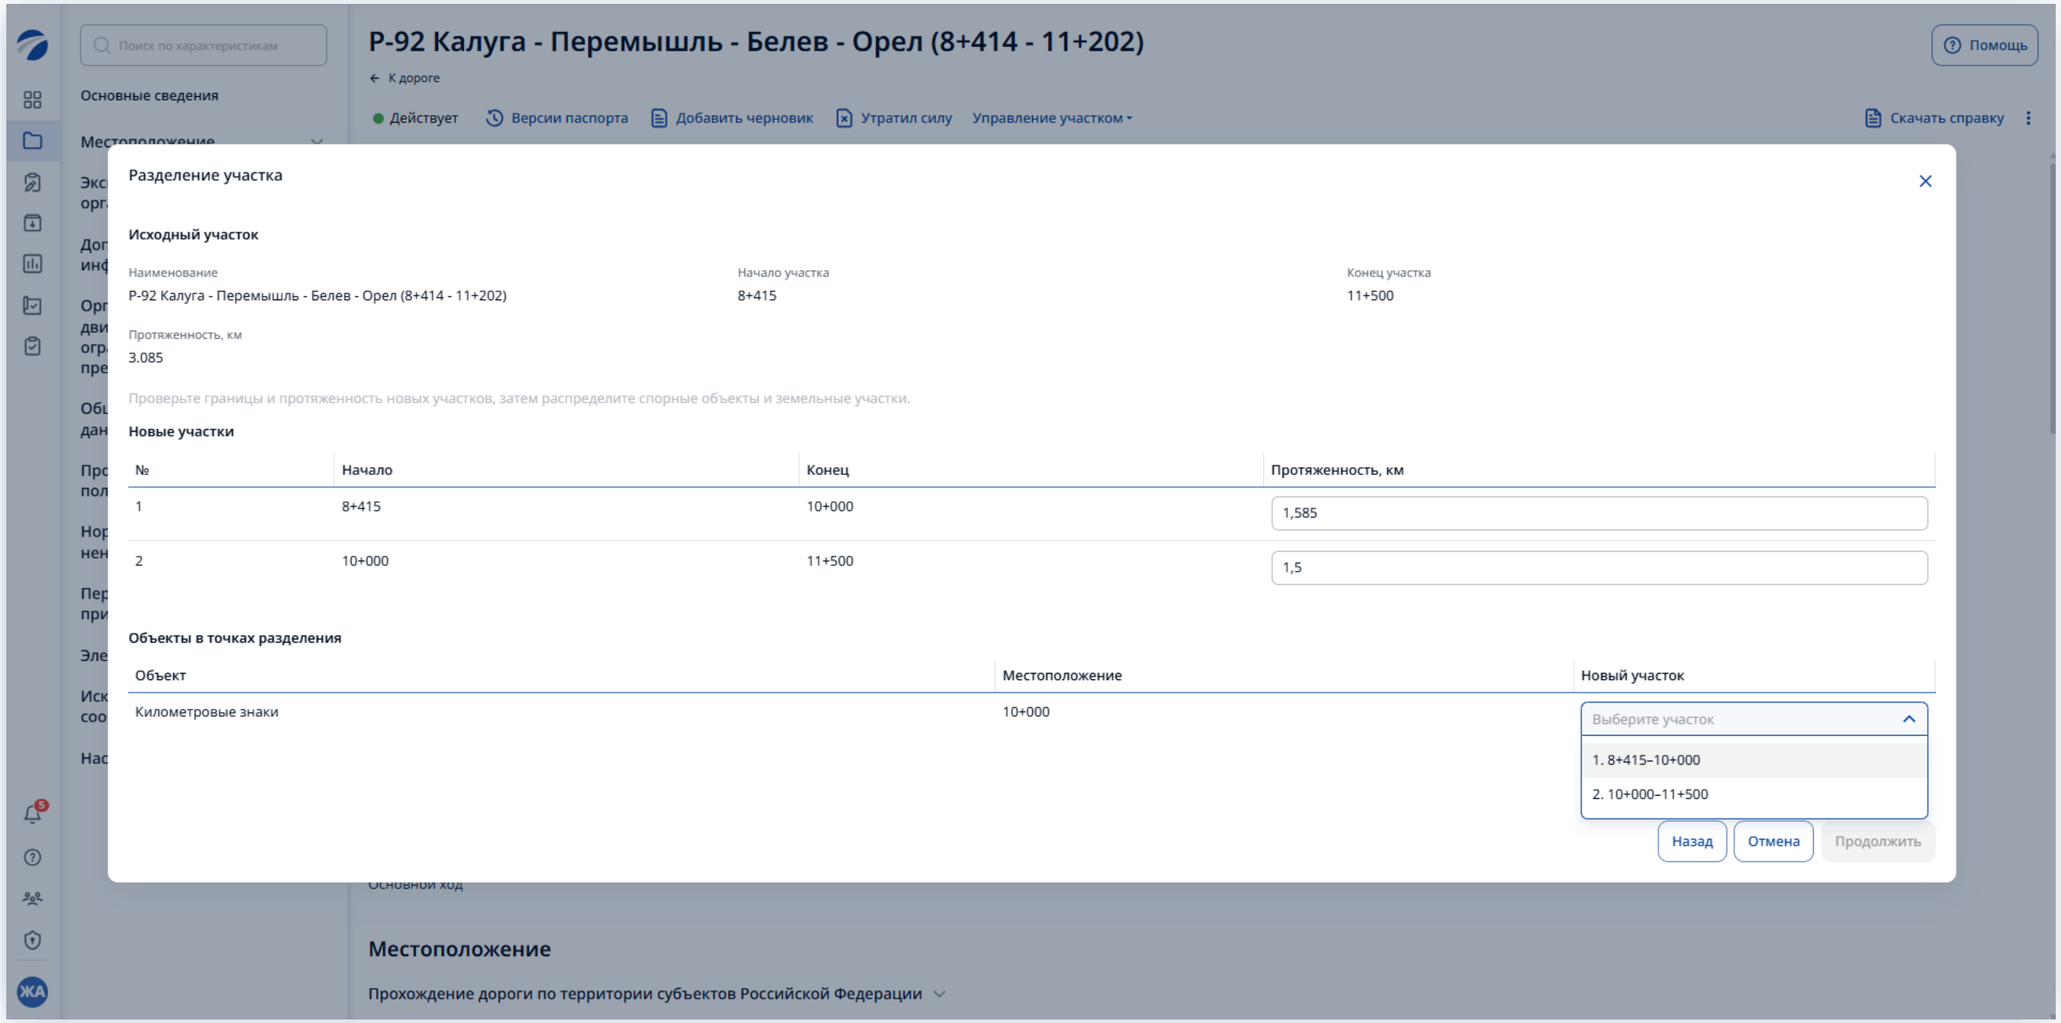


Работа с участками (объединение)

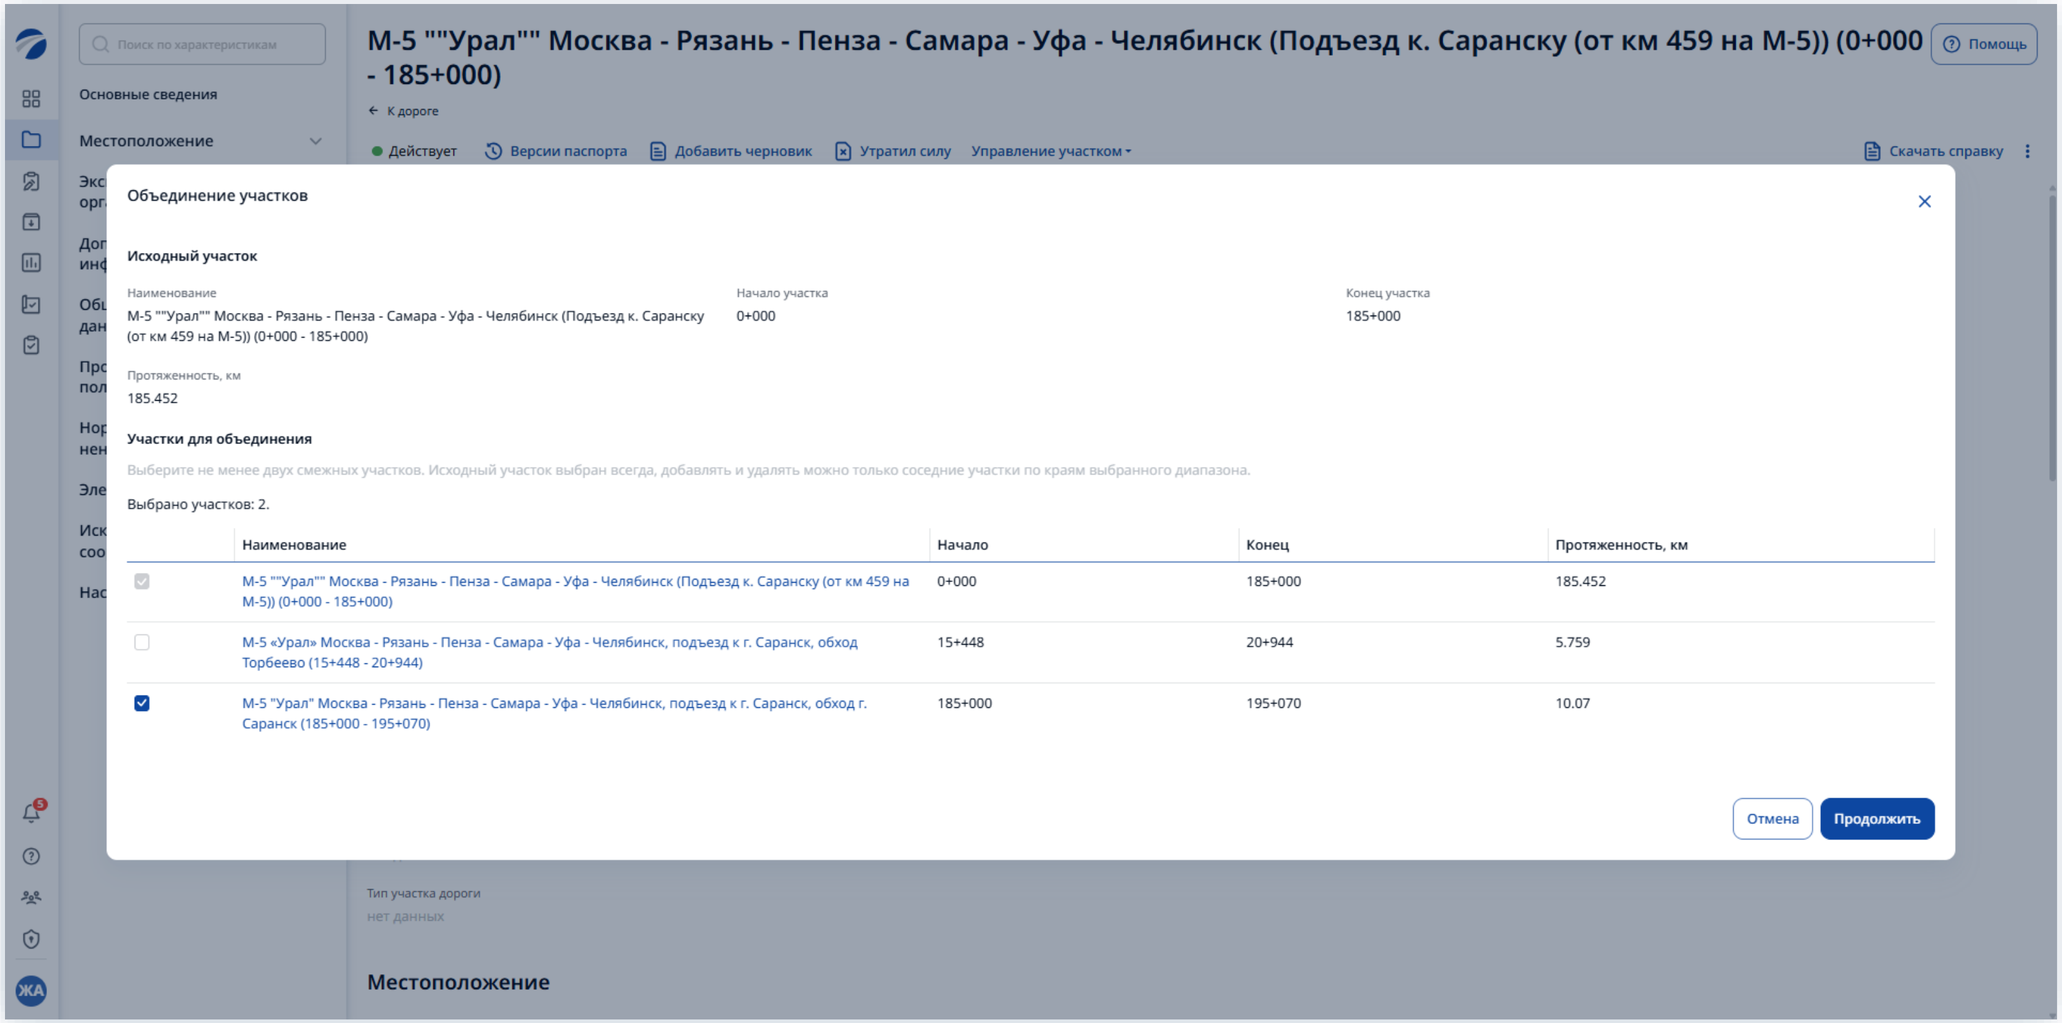


Работа с участками (объединение)

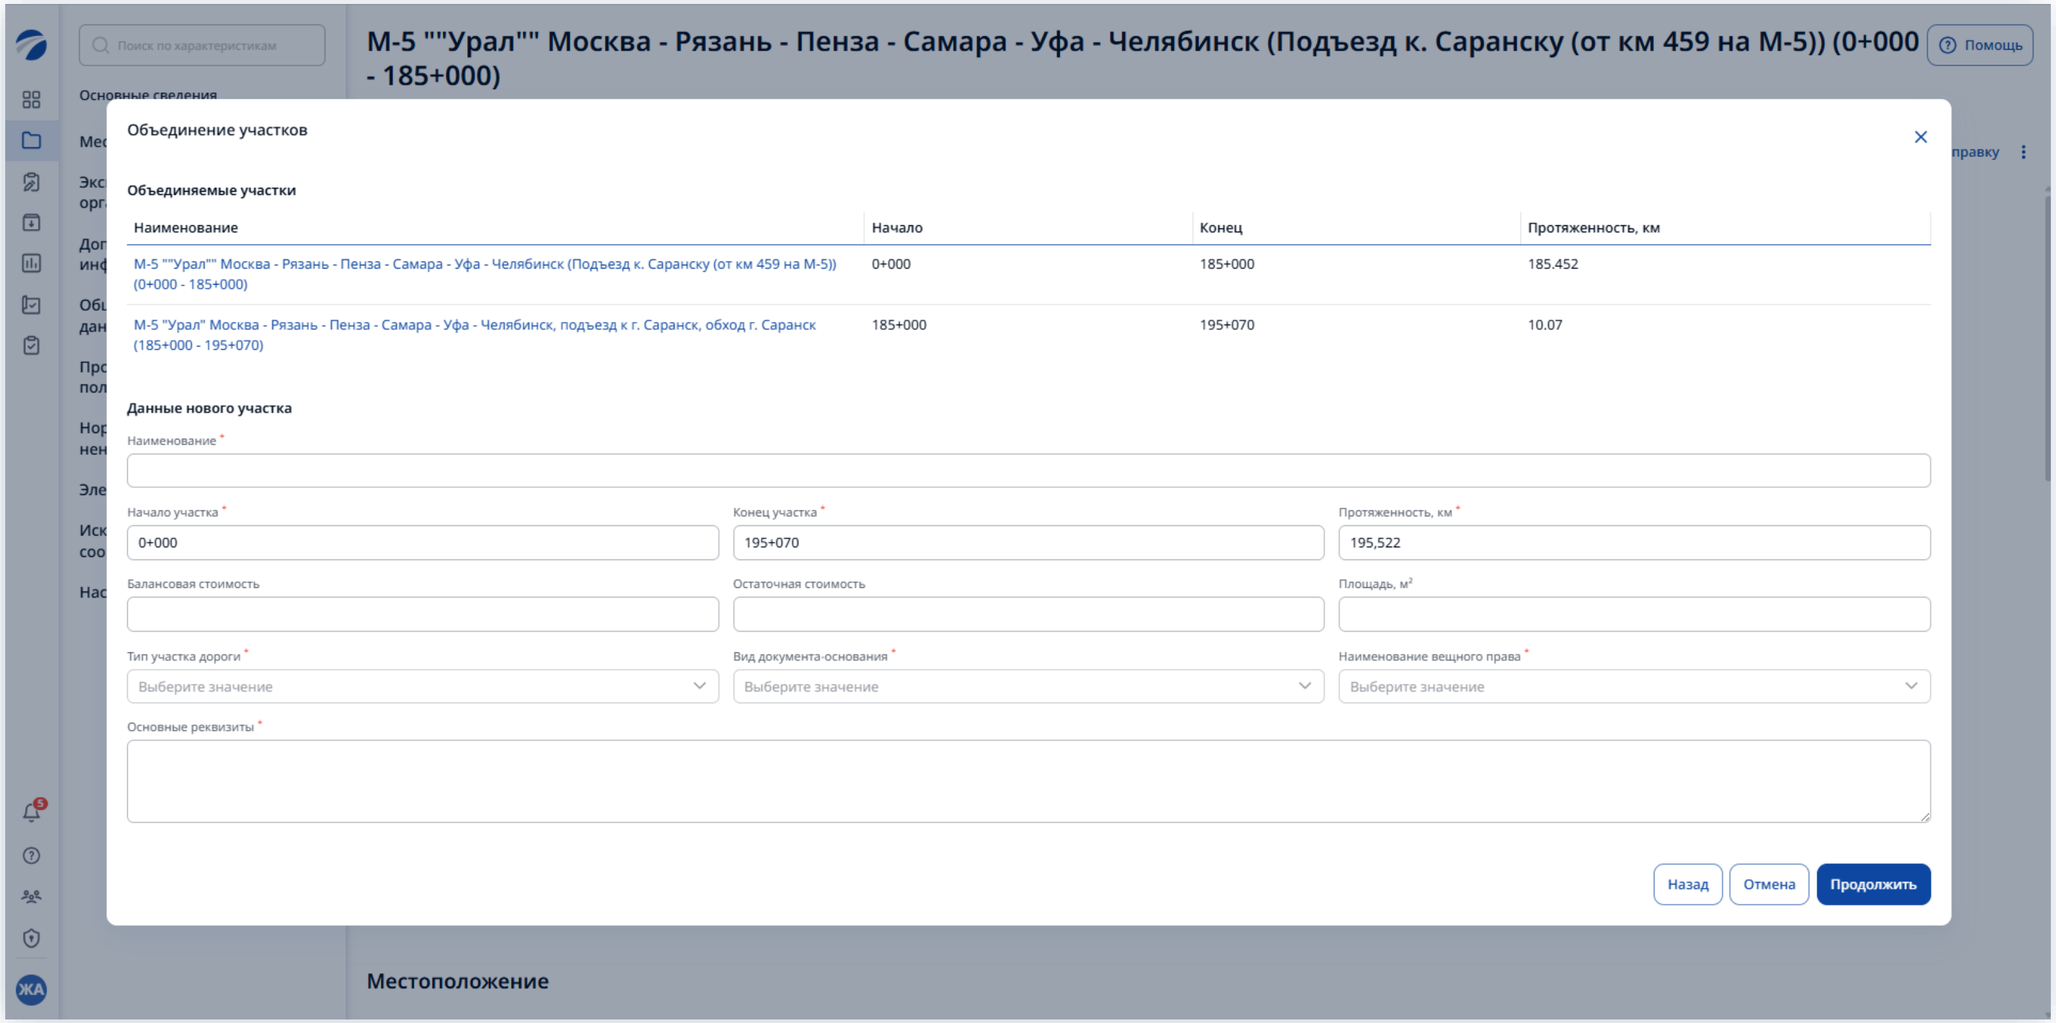


Работа с участками (изменение дороги)

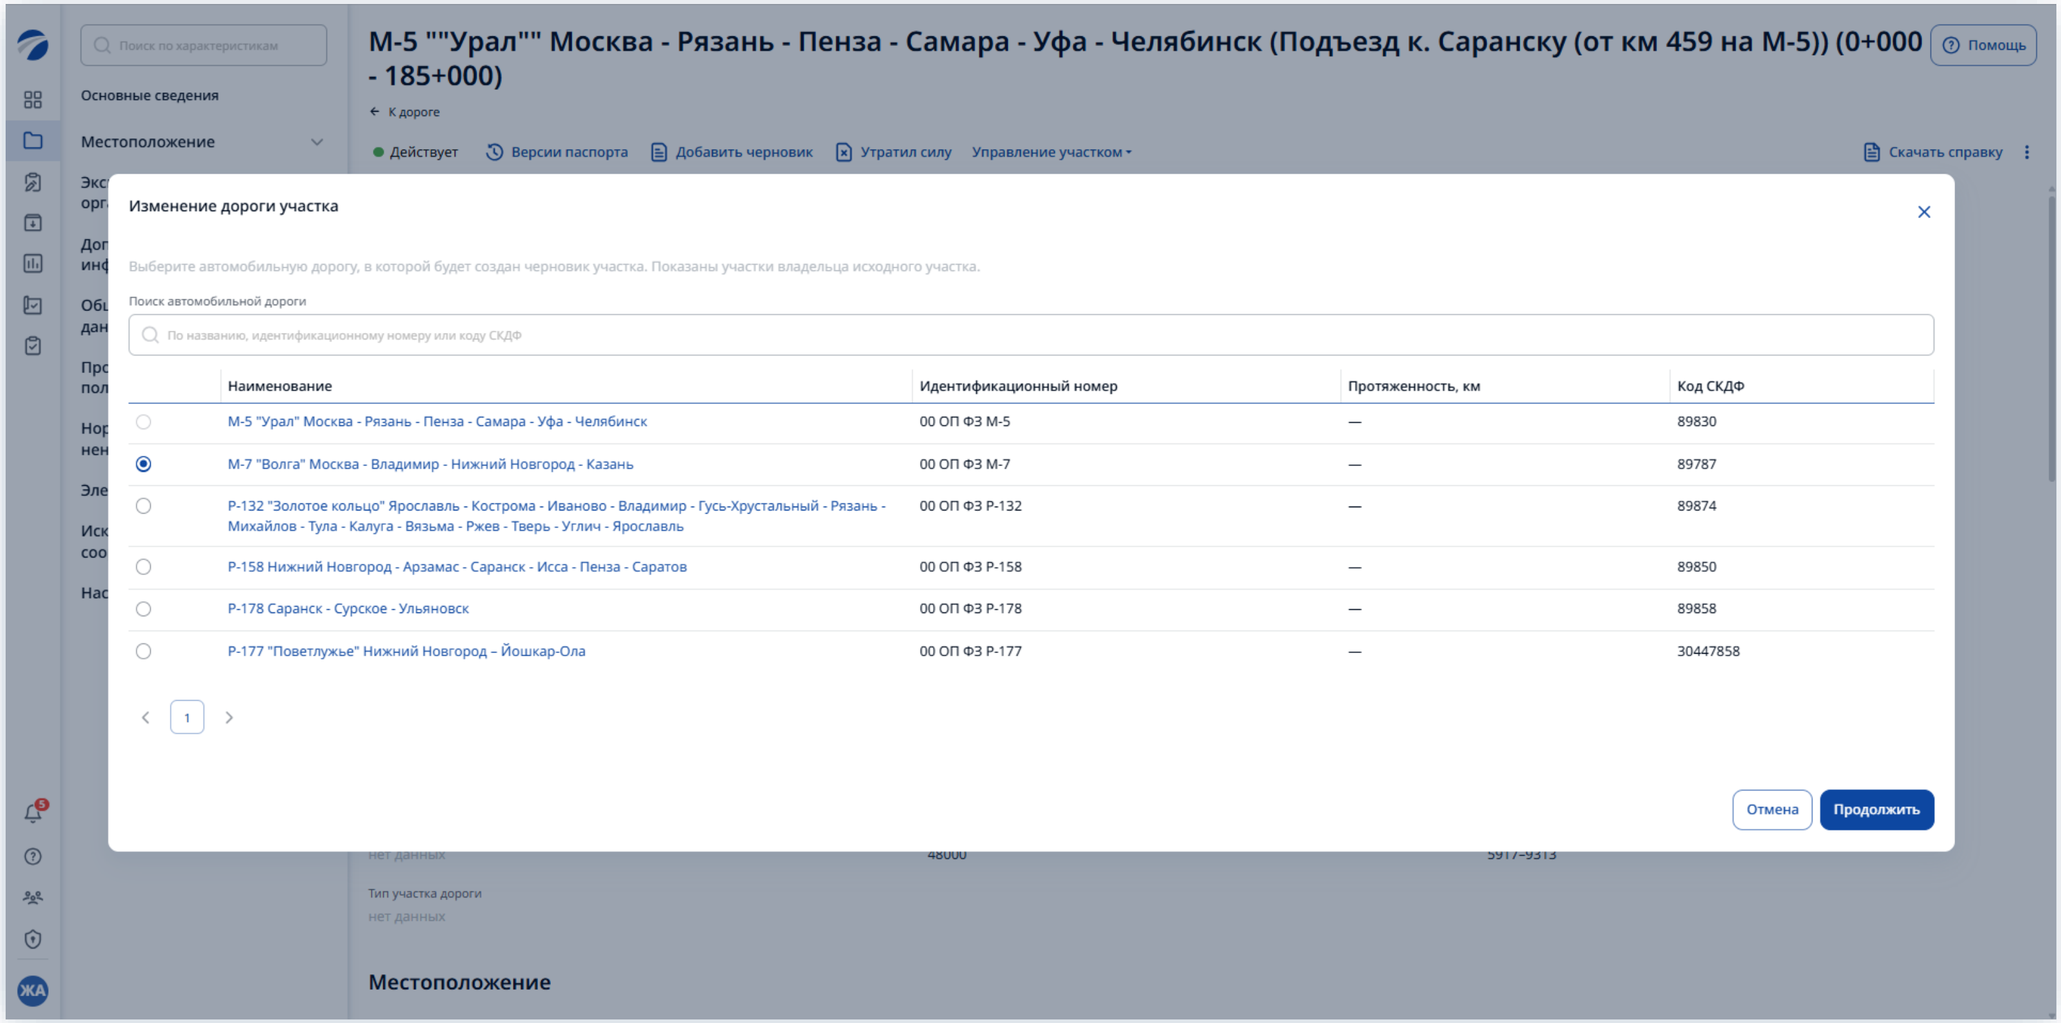


Работа с участками (изменение дороги)

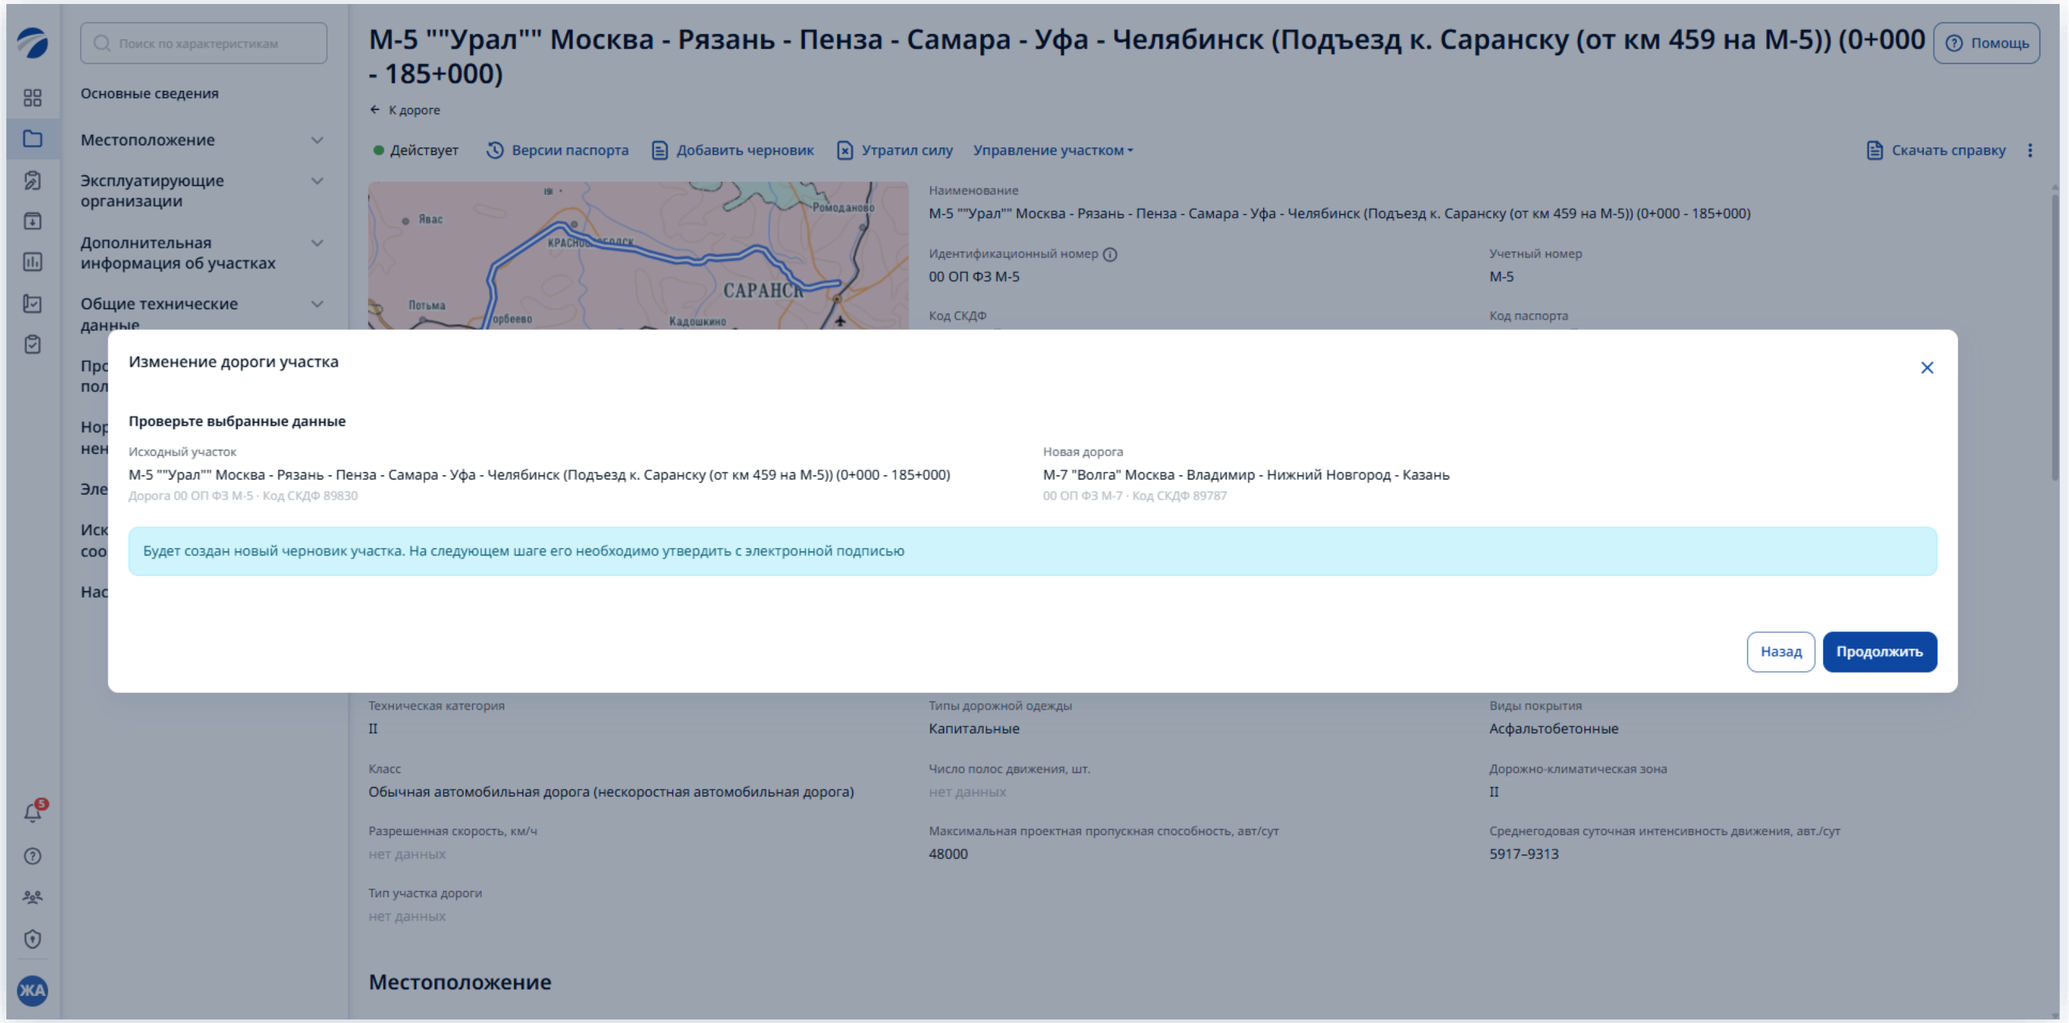

Реестр постановлений об утверждении перечня дорог

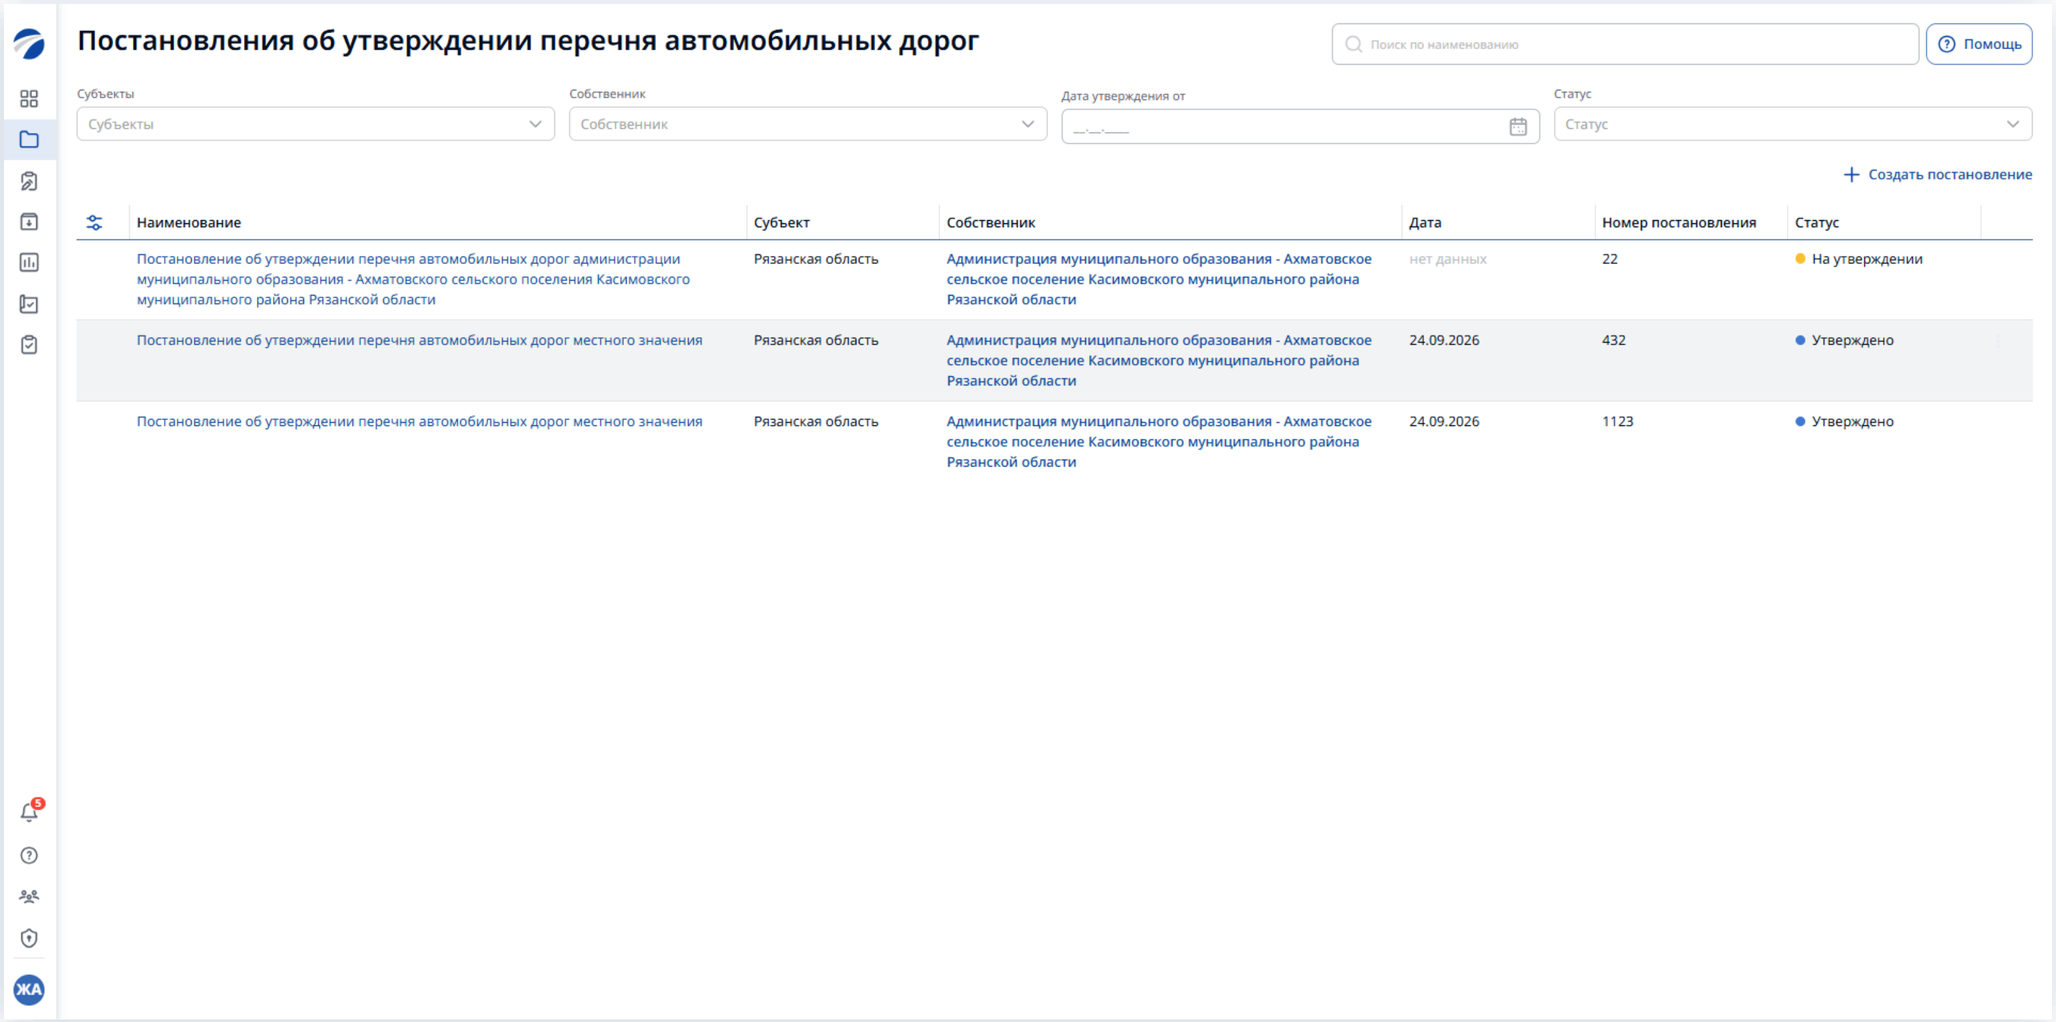

Создание постановления об утверждении перечня дорог

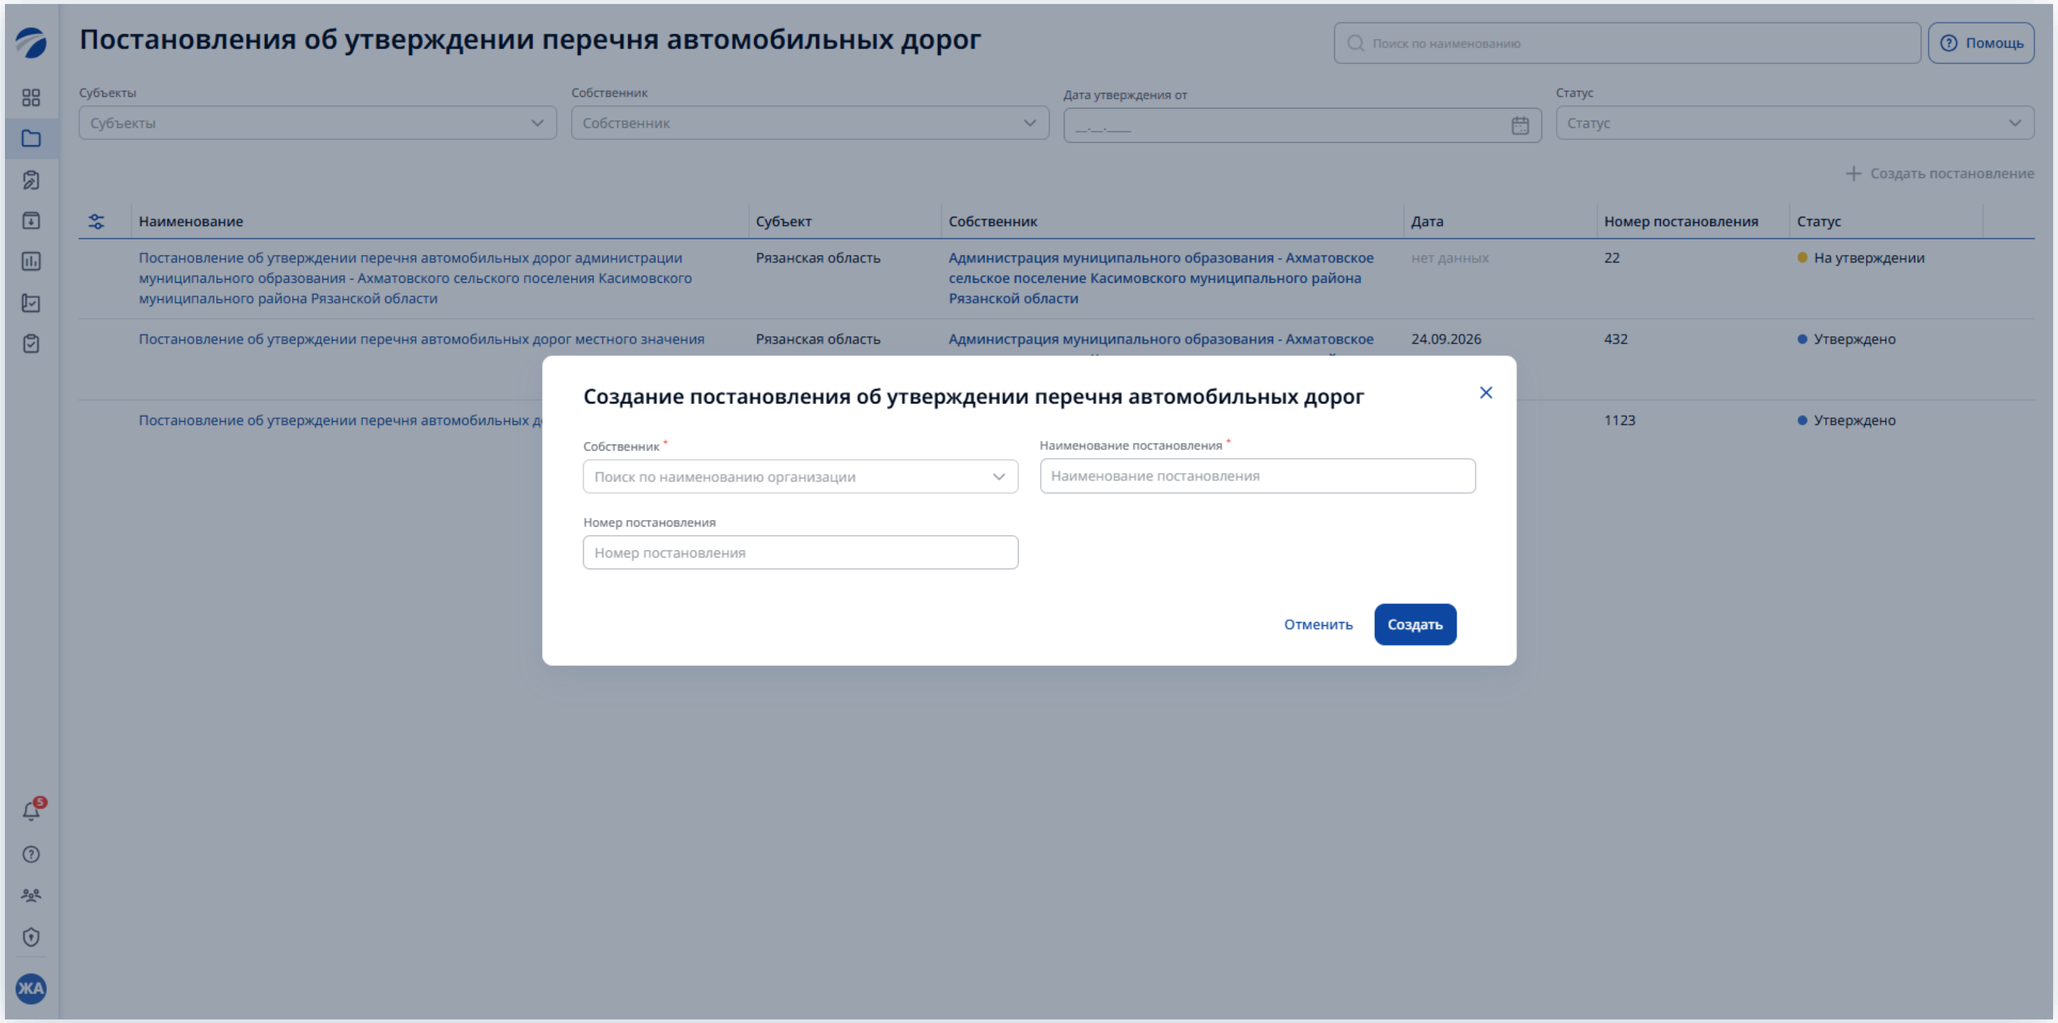

Карточка постановления об утверждении перечня дорог

Постановление об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения

● Утверждено

Скачать файлы для проверки эл. подписи | Скачать PDF

Дата утверждения	Номер постановления	Субъект	Собственник
24.09.2026	432	Рязанская область	Администрация муниципального образования - Ахматовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

ФИО утверждающего	Должность утверждающего
Журавлев Антон Дмитриевич	Ведущий эксперт дорожного хозяйства

Содержимое постановления

Администрация муниципального образования - АХМАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление № 32 от 14.09.2012 г. «Об определении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования — Ахматовское сельское поселение Касимовского муниципального района и утверждении перечня автомобильных дорог местного значения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 32 от 14.09.2012 г.

2. Утвердить перечень автомобильных дорог местного значения в новой редакции согласно приложению.


3. Контроль за исполнением постановления оставить за собой.

Перечень автомобильных дорог

Обновлено 24.09.2026 17:10

Наименование	Идентификационный номер	Протяженность, км	Код СКДФ
д Беркеево	61 208 806 ОП МП-004	0,597	77239841
д Кучуково	61 208 806 ОП МП-006	0,163	77239842
д Мунтово	61 208 806 ОП МП-007	0,851	77239843
д Поляны	61 208 806 ОП МП-008	0,360	77239844
д Поповские Выселки	61 208 806 ОП МП-009	0,581	77239845
д Темгенево	61 208 806 ОП МП-018	0,630	77239846
д Халымово	61 208 806 ОП МП-019	0,688	77239847
д Шегашаново	61 208 806 ОП МП-022	0,380	77239848
пер Уланова Гора	61 208 806 ОП МП-024	0,833	77239849

Подписанное в ФГИС СКДФ постановление об утверждении перечня дорог

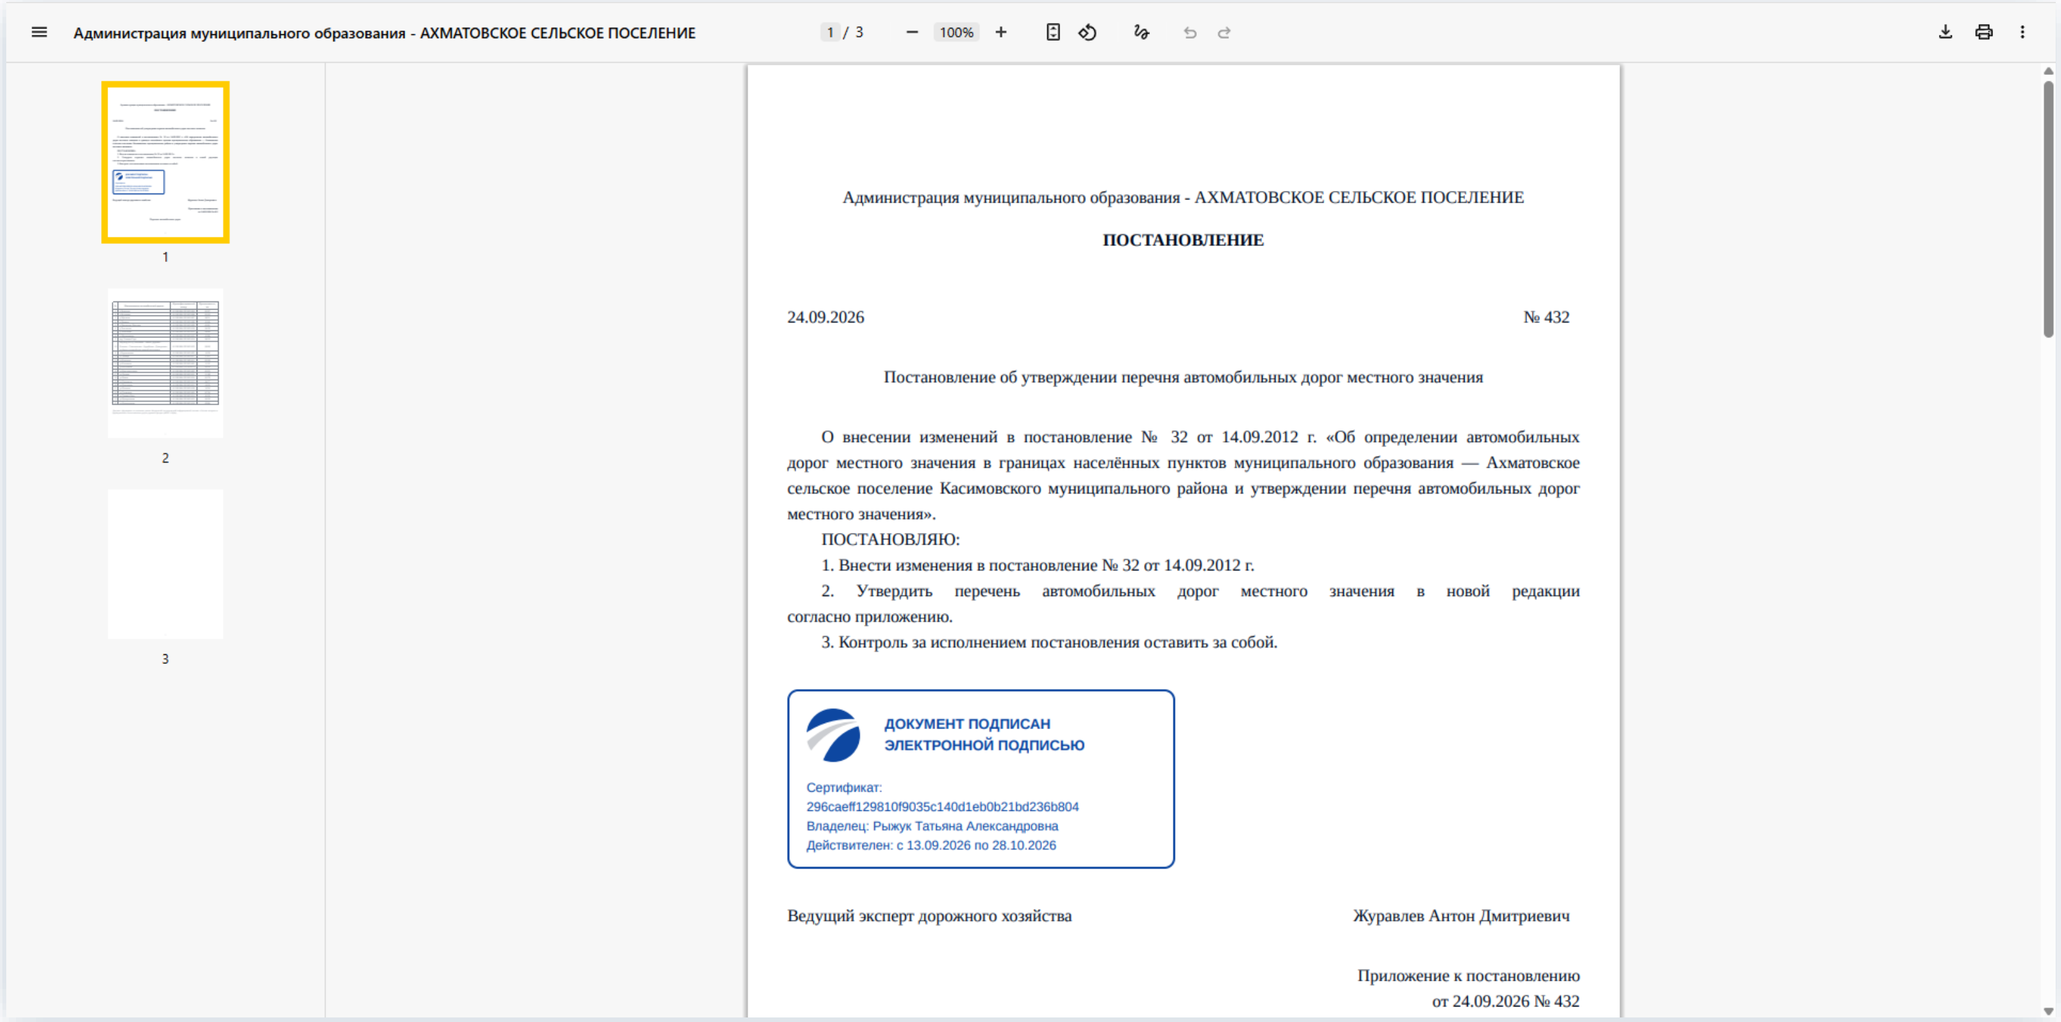

Подписанное в ФГИС СКДФ постановление об утверждении перечня дорог



1



2

3

№	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Протяженность, км
1	д Беркеево	61 208 806 ОП МП-004	0,597
2	д Кучуково	61 208 806 ОП МП-006	0,163
3	д Мунтово	61 208 806 ОП МП-007	0,851
4	д Поляны	61 208 806 ОП МП-008	0,360
5	д Поповские Выселки	61 208 806 ОП МП-009	0,581
6	д Темгенево	61 208 806 ОП МП-018	0,630
7	д Халымово	61 208 806 ОП МП-019	0,688
8	д Шегашаново	61 208 806 ОП МП-022	0,380
9	пер Уланова Гора	61 208 806 ОП МП-024	0,833
10	Подъезд от а/д «Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савосьяново - Ардабьево - Дмитриево» к объекту переработки мясной продукции	61 208 806 ОП МП-025	0,868
11	с Карамышево	61 208 806 ОП МП-005	1,028
12	с Селищи	61 208 806 ОП МП-017	1,511
13	ул Большая	61 208 806 ОП МП-011	0,528
14	ул Калинина	61 208 806 ОП МП-001	1,532
15	ул Колхозная	61-208-806 ОП МП-012	0,959
16	ул Комсомольская	61 208 806 ОП МП-002	0,325
17	ул Лесная	61 208 806 ОП МП-021	1,148
18	ул Новая	61 208 806 ОП МП-016	0,378
19	ул Овражная	61 208 806 ОП МП-013	0,677
20	ул Подгорная	61 208 806 ОП МП-015	1,033
21	ул Полевая	61 208 806 ОП МП-020	1,056
22	ул Татарская	61 208 806 ОП МП-003	0,726
23	ул Тюрина Гора	61 208 806 ОП МП-014	0,329
24	ул Центральная	61 208 806 ОП МП-023	0,939
25	ул Центральная	61 208 806 ОП МП-010	0,906

Документ сформирован на основании данных Федеральной государственной информационной системы «Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов» (ФГИС СКДФ).
